

ID	Aktivitetsdeling	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregår aktivitet	Tidspunkt													
							23.05	juni				juli				august				08.
							30.05	06.06	13.06	20.06	27.06	04.07	11.07	18.07	25.07	01.08	08.			
1		Rigg og drift	200 dager	ma 30.05.16	on 05.04.17															
2		Rensk av fjell pel 1100 til pel 200	52 dager	ma 30.05.16	ti 30.08.16															
3		Borring og sprengning ned til topp grøft pel 1100 (Ved sjøen) til pel 700	36 dager	ma 30.05.16	ma 08.08.16															
4		Graving sprengning grøfte pel 1150 TIL PEL 700	79 dager	ti 09.08.16	fr 25.11.16	3														
5		Montering av S12 og OV12	1 dag	to 13.10.16	to 13.10.16															
6		Montering/ Rørlegging fra sjø og opp til S11 og O11	2 dager	ma 17.10.16	ti 18.10.16															
7		Llegge ut AP Ø250 til kote -30 inkl sveising	2 dager	ti 15.11.16	on 16.11.16															
8		Koble på overløpet fra S16 og S15	1 dag	to 17.11.16	to 17.11.16															
9		Plastring i strandsonen	3 dager	ma 21.11.16	on 23.11.16															
10		Montering av V6	2 dager	ma 17.10.16	ti 18.10.16															
11		Krysing av vei med ø250 til Norscrap	3 dager	on 26.10.16	fr 28.10.16															
12		Montering av S11 og O11	2 dager	ma 31.10.16	ti 01.11.16															
13		Montering av V7	3 dager	on 09.11.16	fr 11.11.16															
14		Krysse vei inn mot EKS 3 inkl tilkobling	4 dager	ma 28.11.16	to 01.12.16															
15		Kryssing av vei ved porten inn mot EKS5	2 dager	ma 12.12.16	ti 13.12.16	14														
16		koble til VA til ledning mot BOH kaien	2 dager	fr 02.12.16	ma 05.12.16	14														
17		Rørlegging, inkl kum montasje mellom O11 og O10 inkl. kummer	26 dager	ma 26.09.16	ma 31.10.16															
18		Montering av P1 og S14 og S15	4 dager	ma 19.09.16	to 22.09.16															
19		Montering av S13 og S14	2 dager	ma 26.09.16	ti 27.09.16	18														
20		Rørlegging mellom O10 og O9 inkl rørlegging	3 dager	ma 07.11.16	on 09.11.16															
21		Rørlegging mellom O9 og O8 inkl montering av V4	6 dager	ma 14.11.16	ma 21.11.16															
22		Kryssing av veien fra O8	2 dager	ti 22.11.16	on 23.11.16															
23		Rørlegging mellom O8 og O7 inkl vei kryssing ved S17	7 dager	on 23.11.16	to 01.12.16															
24		gjennfylling av trase fra sjø til pel 700	28 dager	ma 07.11.16	on 14.12.16															

Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

ID	Aktivitets	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregår aktivitet														
							juni					juli				august				
							23.05	30.05	06.06	13.06	20.06	27.06	04.07	11.07	18.07	25.07	01.08	08.08		
25		Graving/sprengning av grøft fra pel 700 -0	41 dager	to 15.12.16	ti 21.02.17	24														
26		Rørlegging mellom O7 og O6 inkl rørlegger arbeider	6 dager	ma 12.12.16	ma 19.12.16															
27		Gjennfylling av trase opp til O6	2 dager	ma 19.12.16	ti 20.12.16															
28		Kryssing av vei med stikk fra O6	2 dager	ti 20.12.16	on 21.12.16															
29		Montering av V3 og S6	2 dager	ma 02.01.17	ti 03.01.17															
30		Rørlegging mellom O6 og O5/S5 inkl rørlegger arbeider	8 dager	ti 03.01.17	to 12.01.17															
31		Gjennfylling av trase opp til O5/S5	2 dager	fr 13.01.17	ma 16.01.17	30														
32		Rørlegging mellom O5/S5 opp til kumgruppe V2, S4/O4 inkl rørlegging	9 dager	fr 13.01.17	on 25.01.17	30														
33		Montering av V2	1 dag	to 26.01.17	to 26.01.17	32														
34		Veikryssing fra O4	3 dager	to 26.01.17	ma 30.01.17	32														
35		Gjennfylling av trase opp til V2, S4/O4	9 dager	to 26.01.17	ti 07.02.17	32														
36		Rørlegging mellom V2, O4/S4 til O3/S3 inkl rørlegger arbeider	4 dager	ti 31.01.17	fr 03.02.17	34														
37		Gjennfylling av trase fra mellom V2 Og O3/s3	5 dager	ma 06.02.17	fr 10.02.17	36														
38		Veikryssing fra O3	2 dager	ma 06.02.17	ti 07.02.17	36														
39		Rørlegging mellom O3/S3 til V1, O2/S2 inkl rørlegger arbeider	9 dager	on 08.02.17	ma 20.02.17	38														
40		Montering av V1	2 dager	ti 21.02.17	on 22.02.17	39														
41		Veikryssing fra O2	2 dager	to 23.02.17	fr 24.02.17	40														
42		Gjennfylling av trase fra O3 til V1	5 dager	ti 21.02.17	ma 27.02.17	39														
43		Rørlegging mellom O3/S3 til V1, O2/S2 inkl rørlegger arbeider	3 dager	ma 27.02.17	on 01.03.17	41														
44		Gjennfylling av trase fra V1 til O1	3 dager	to 02.03.17	ma 06.03.17	43														
45		Rørlegging fra O1 opp til EKS1 og 2	4 dager	to 02.03.17	ti 07.03.17	43														


Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

ID	Aktivitets	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregår aktivitet																
							juni							juli							august	
							23.05	30.05	06.06	13.06	20.06	27.06	04.07	11.07	18.07	25.07	01.08	08.				
46		Tilkobling til EKS1 og 2	6 dager	on 08.03.17	on 15.03.17	45																
47		Slutt test av rør inkl kloring utspyling	7 dager	ti 14.03.17	on 22.03.17	46																
48		Sluttarbeider langs trase	80 dager	ma 05.12.16	on 05.04.17																	
49		Nedrigg	3 dager	to 06.04.17	ma 10.04.17	48																
50		FDV	10 dager	to 06.04.17	on 19.04.17	48																


Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag fremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

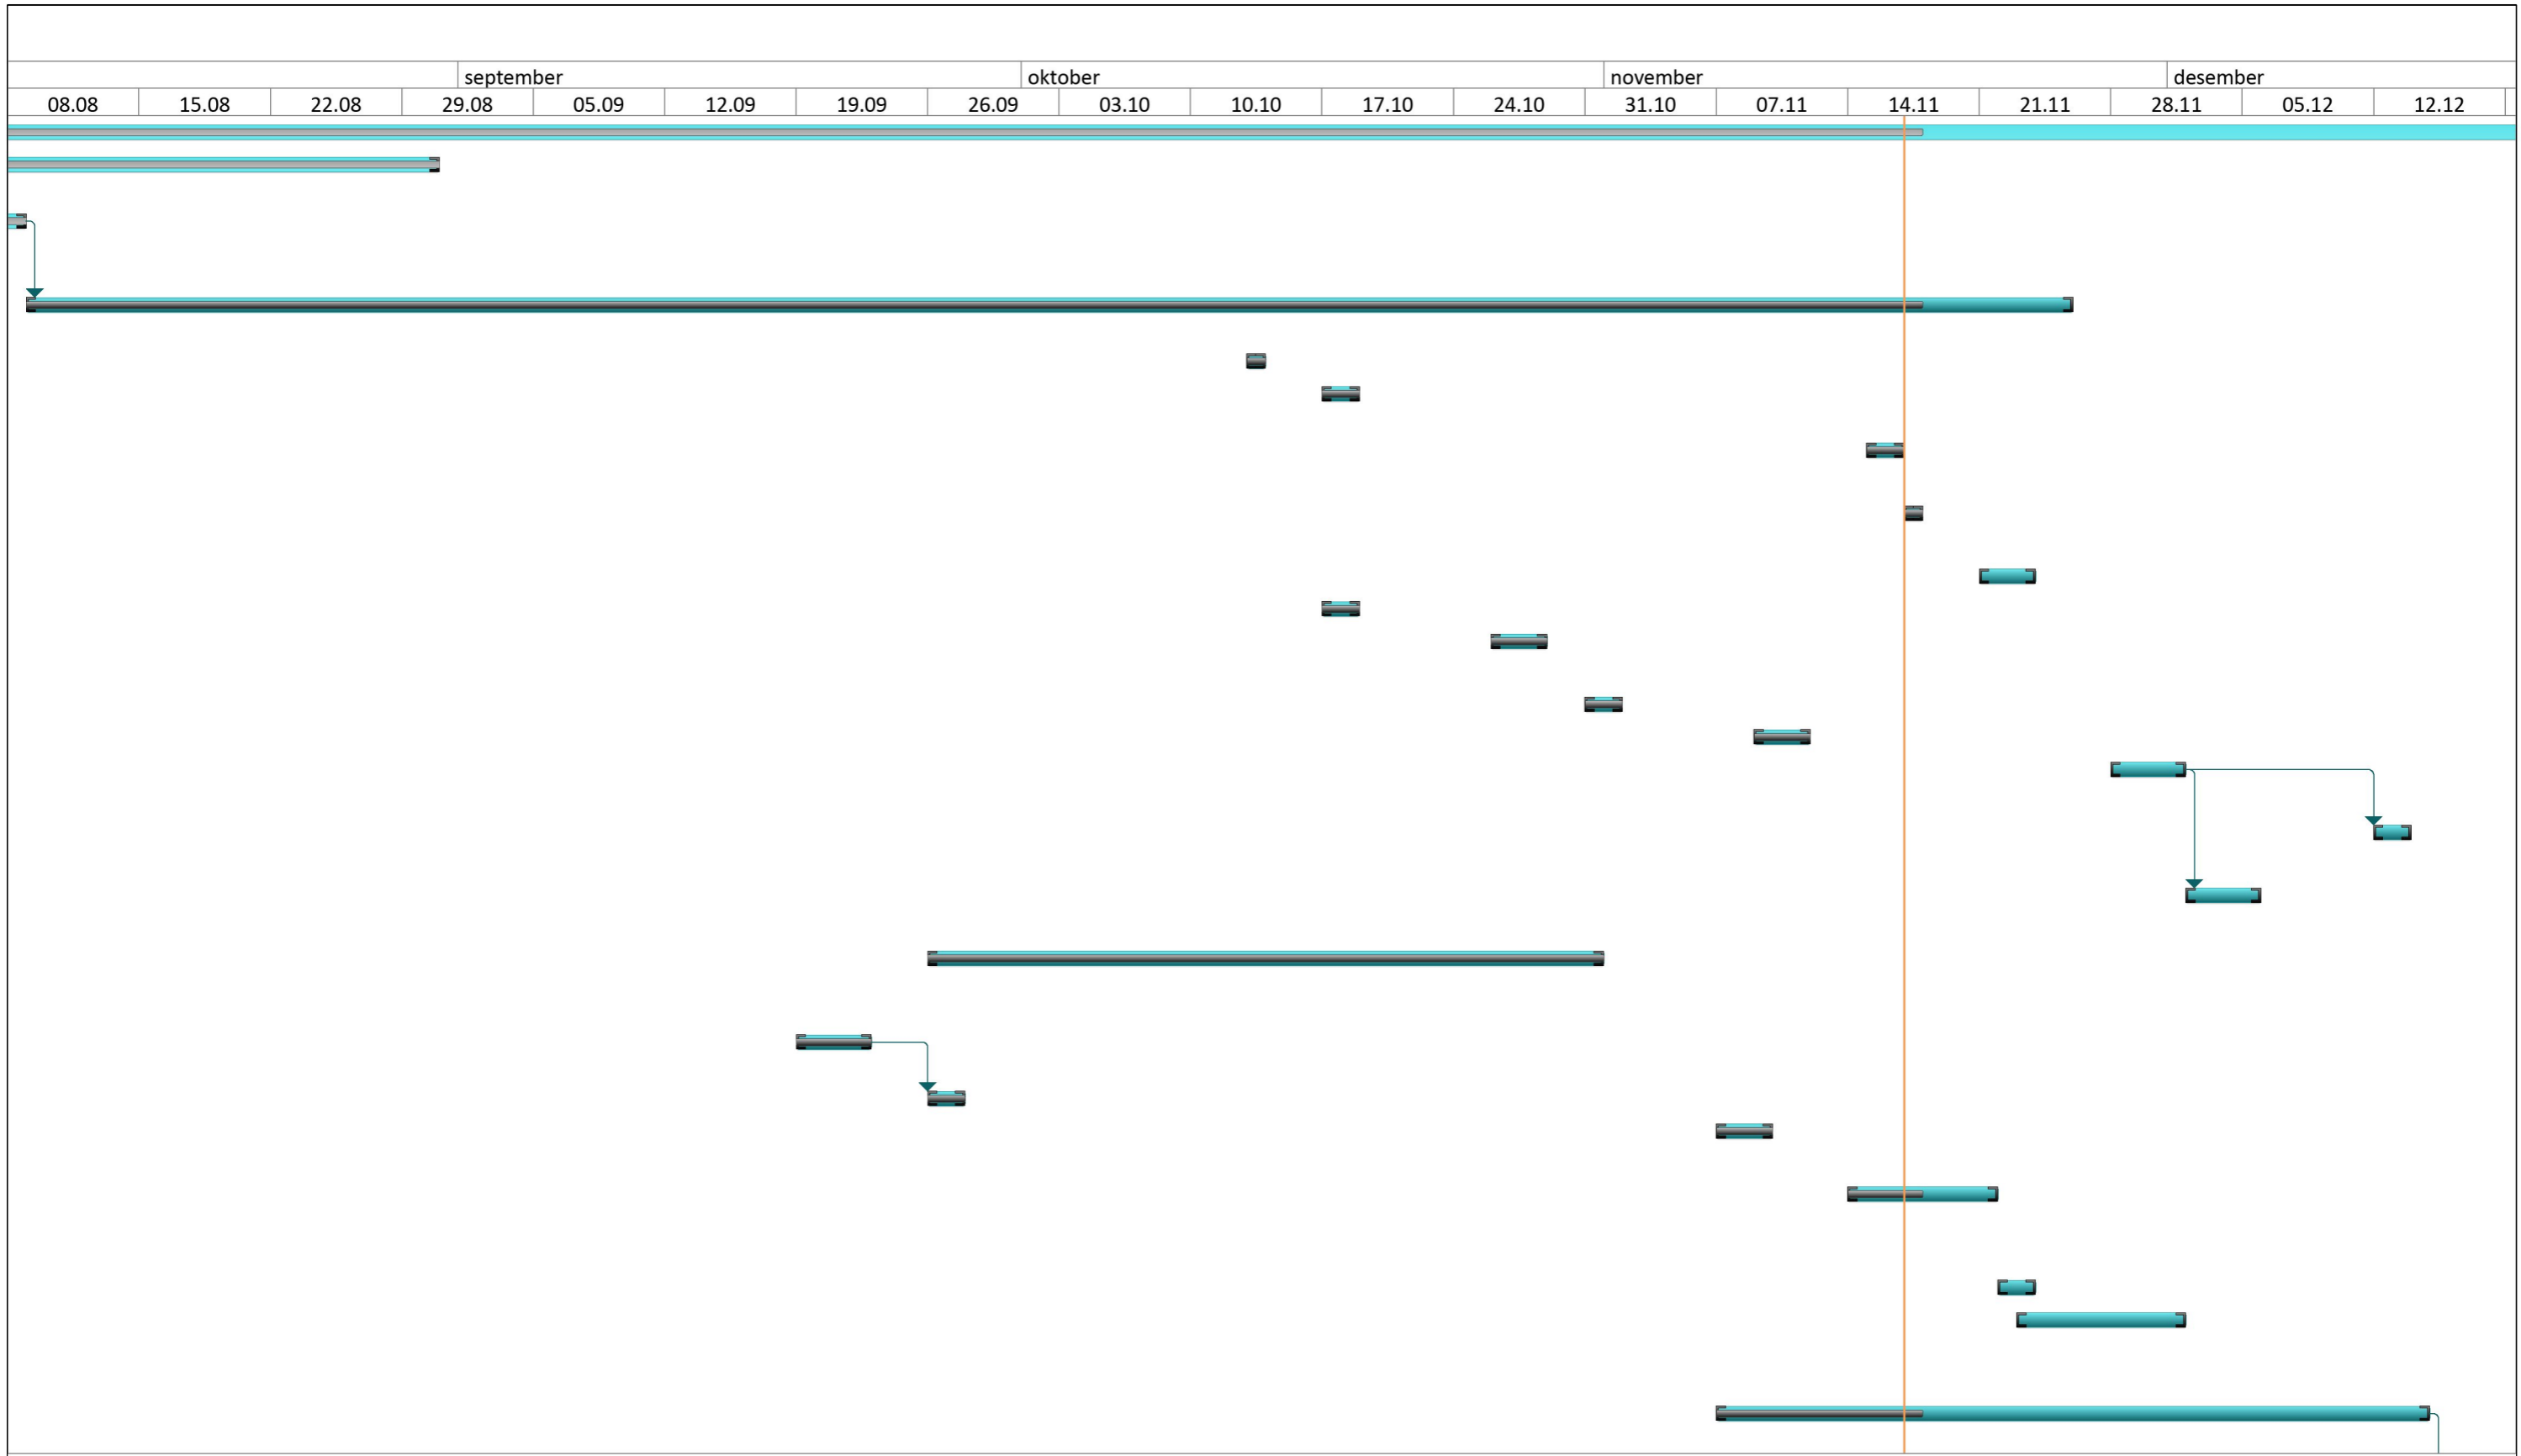





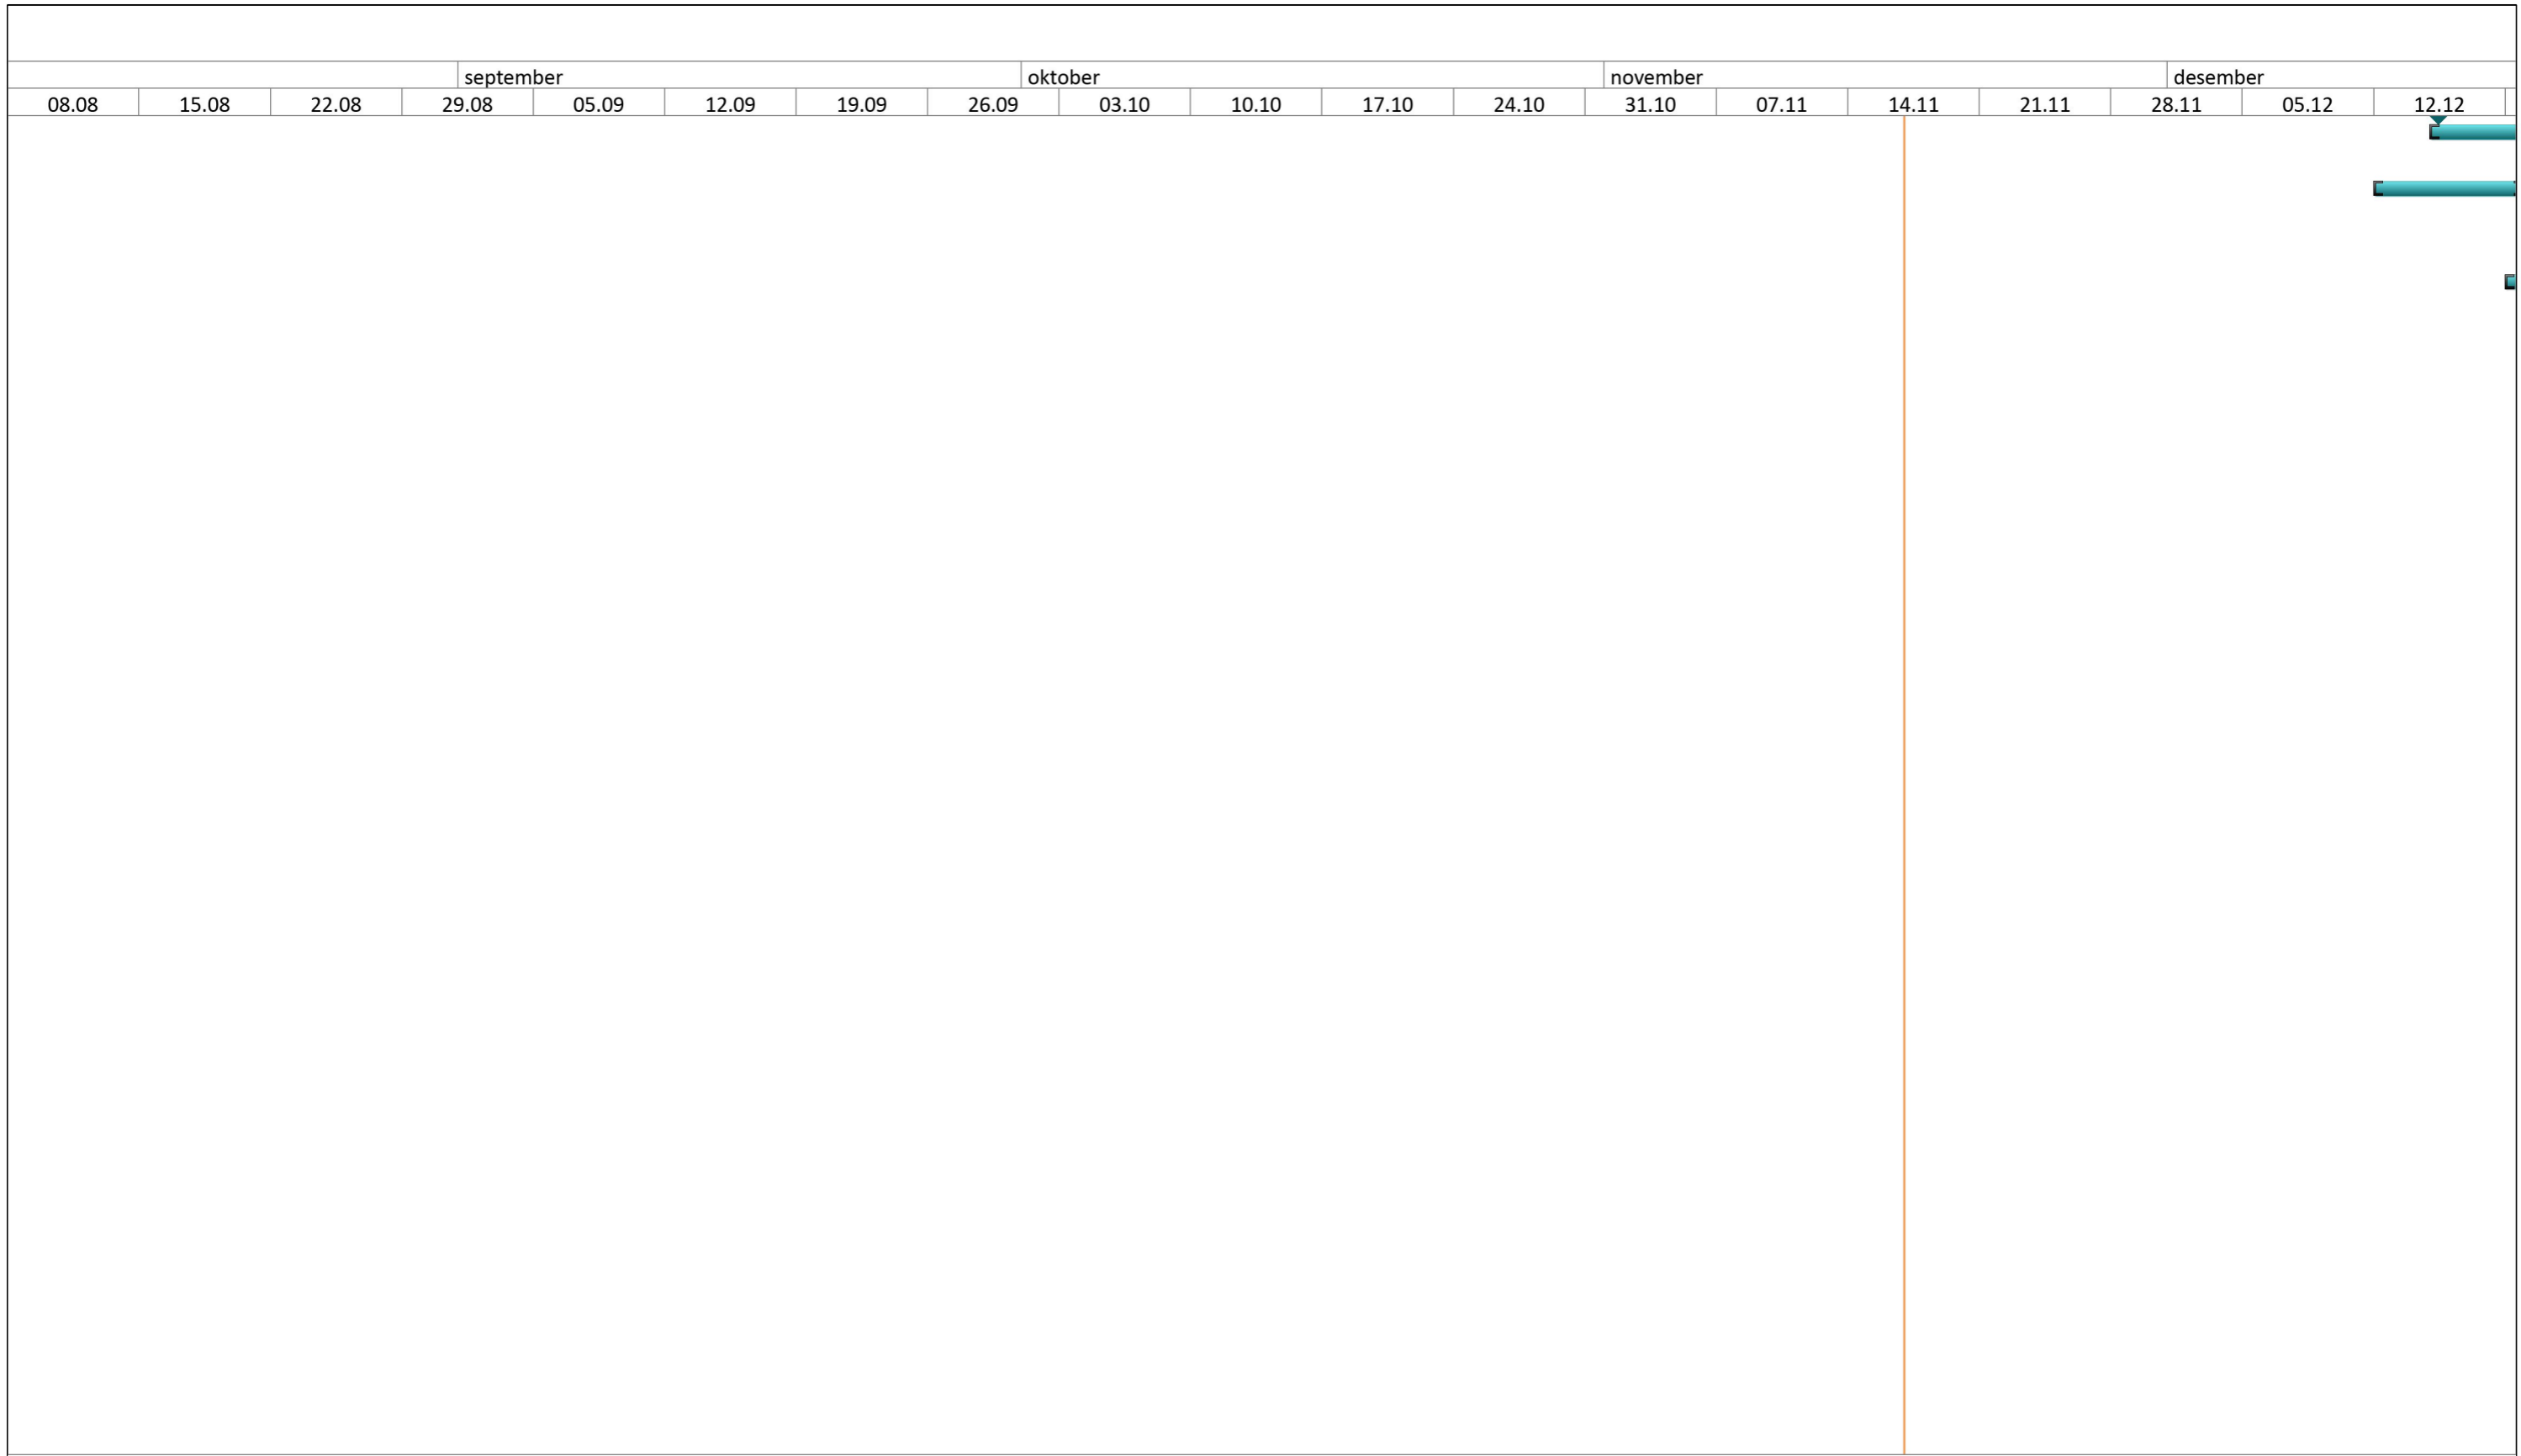














Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
 Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag fremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			




Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
 Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

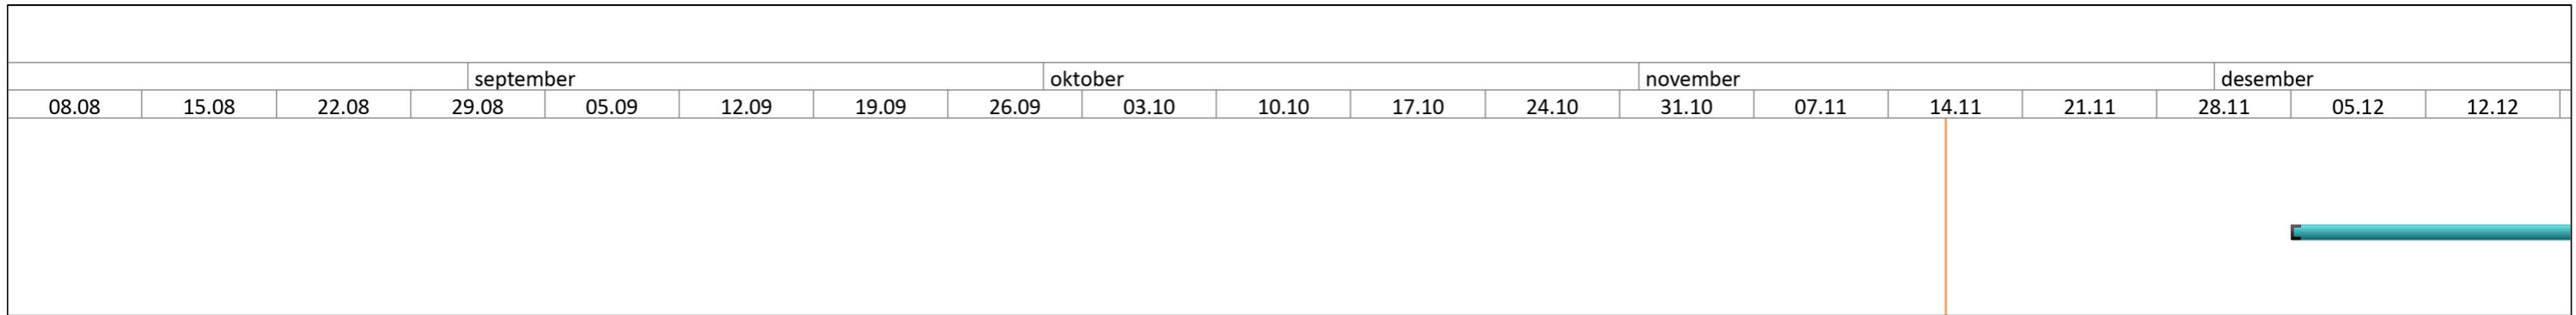





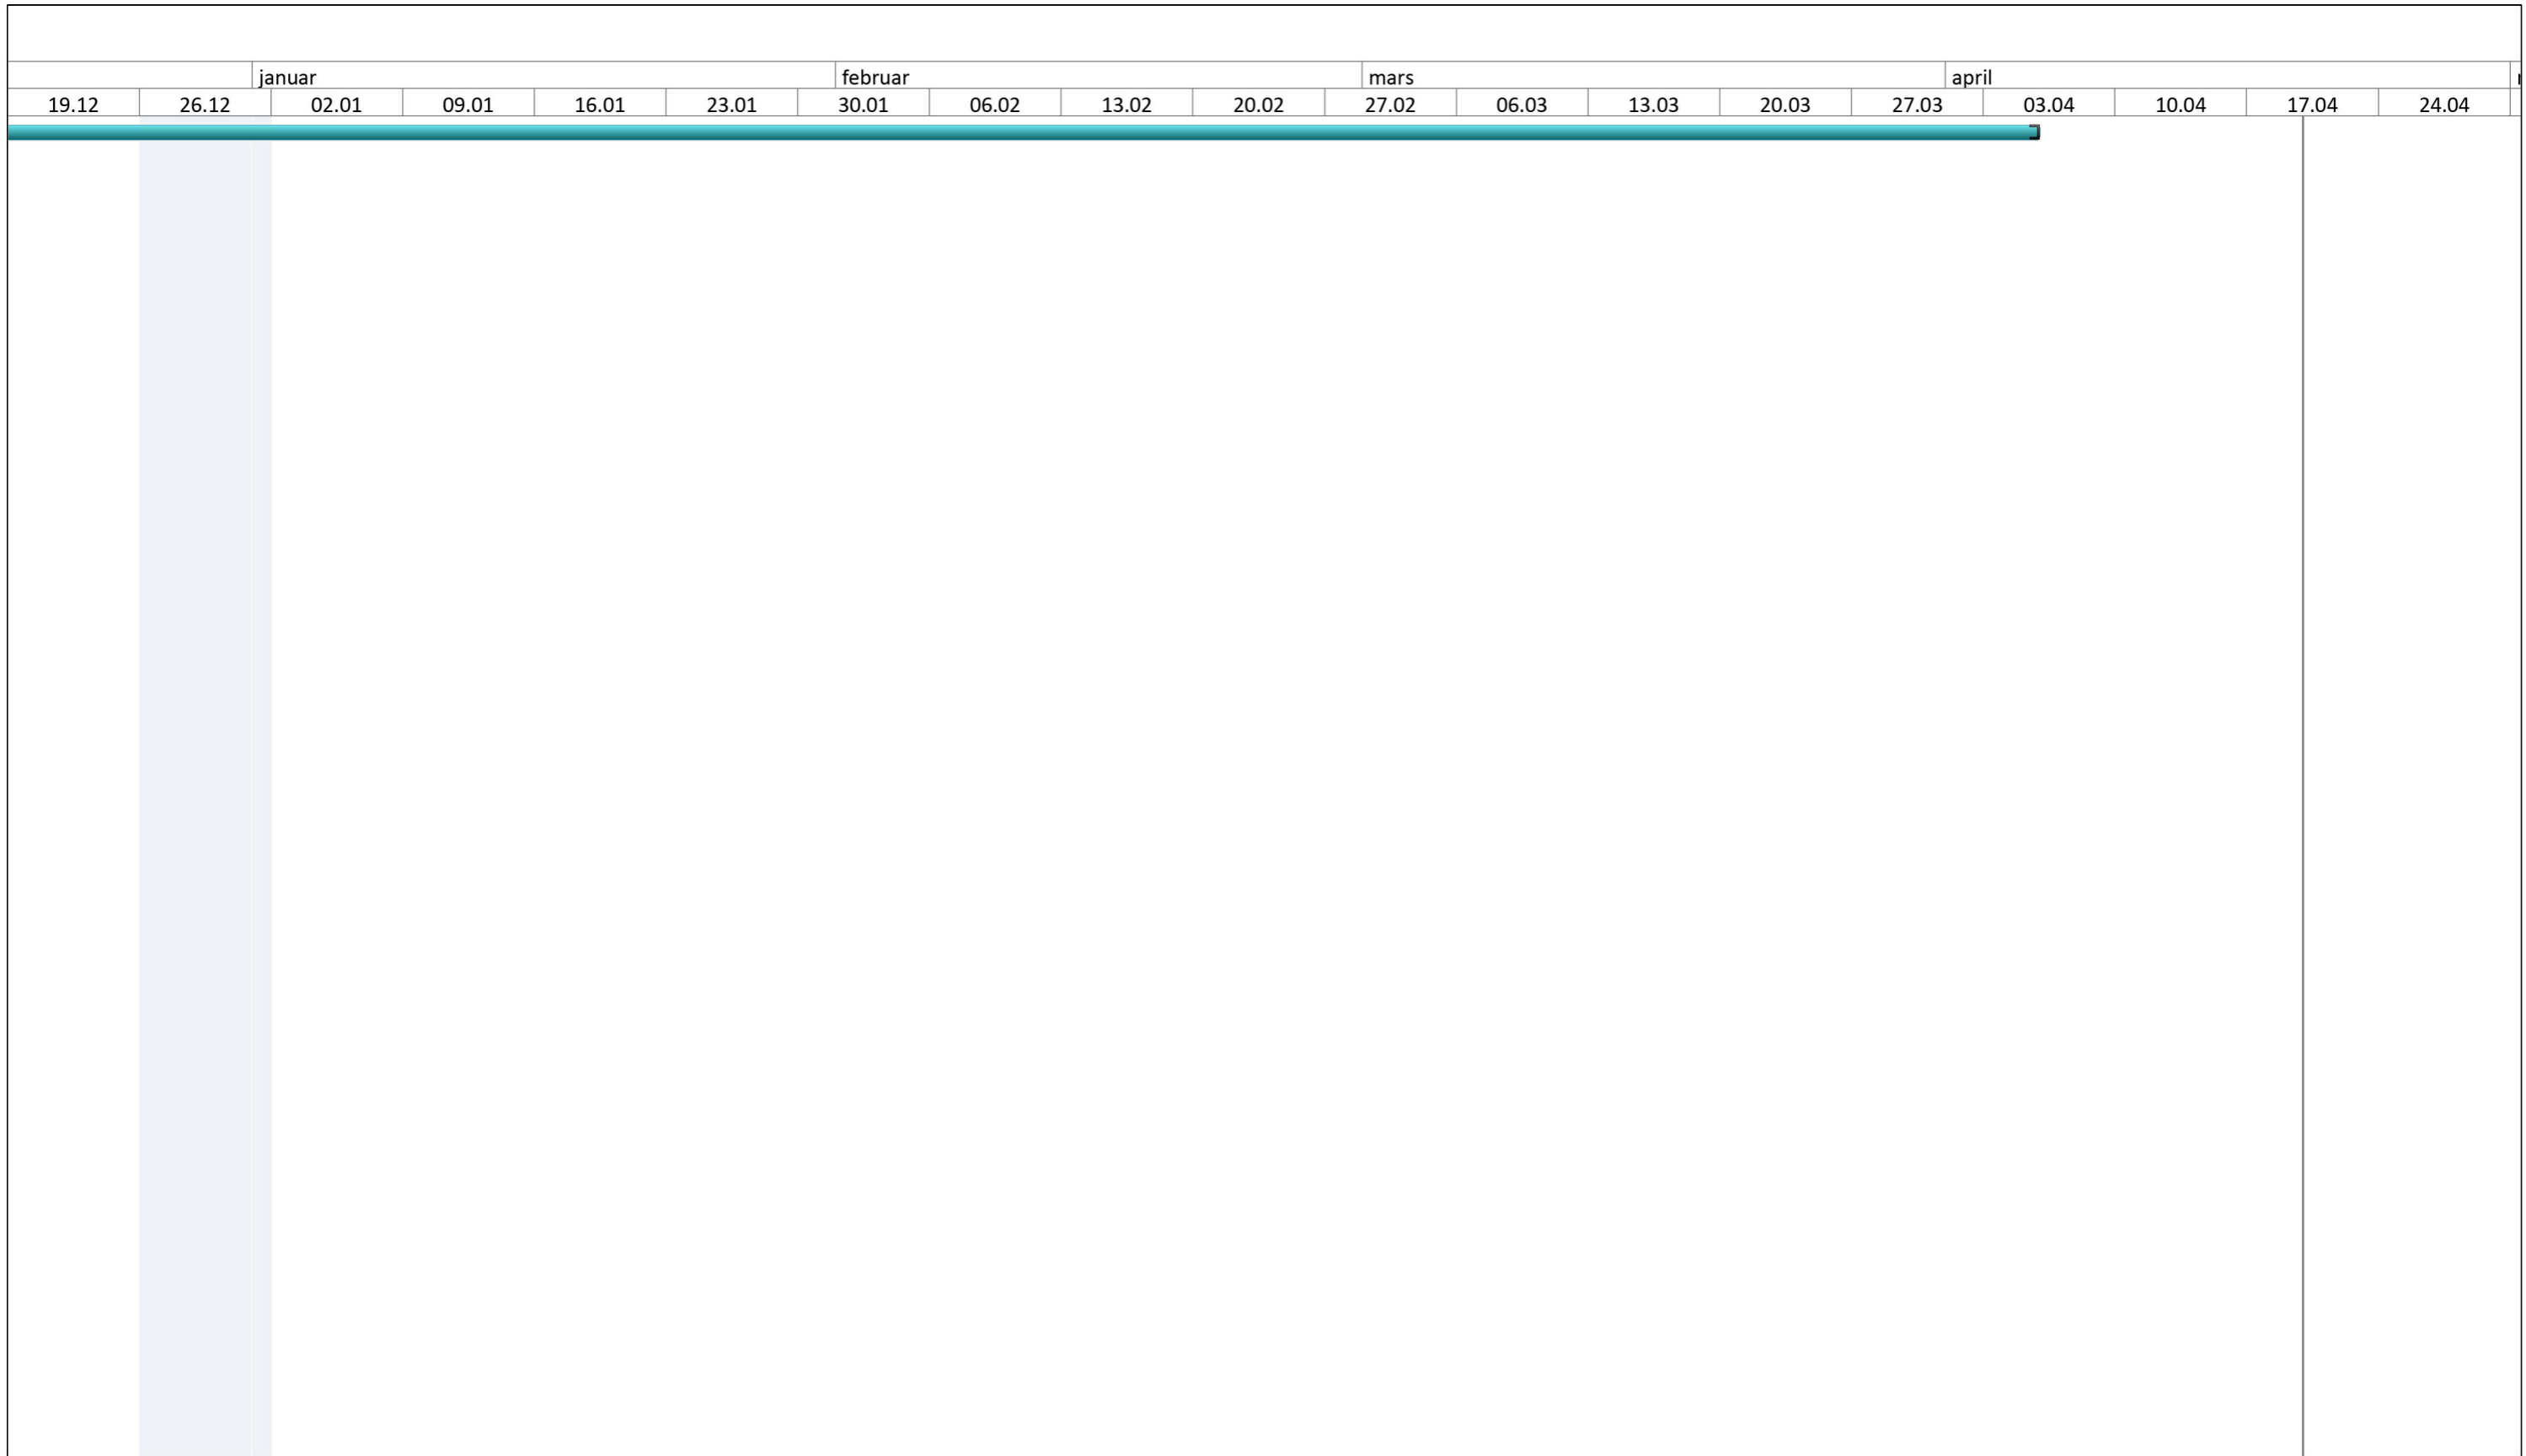














Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			



Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
 Dato: to 17.11.16


Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

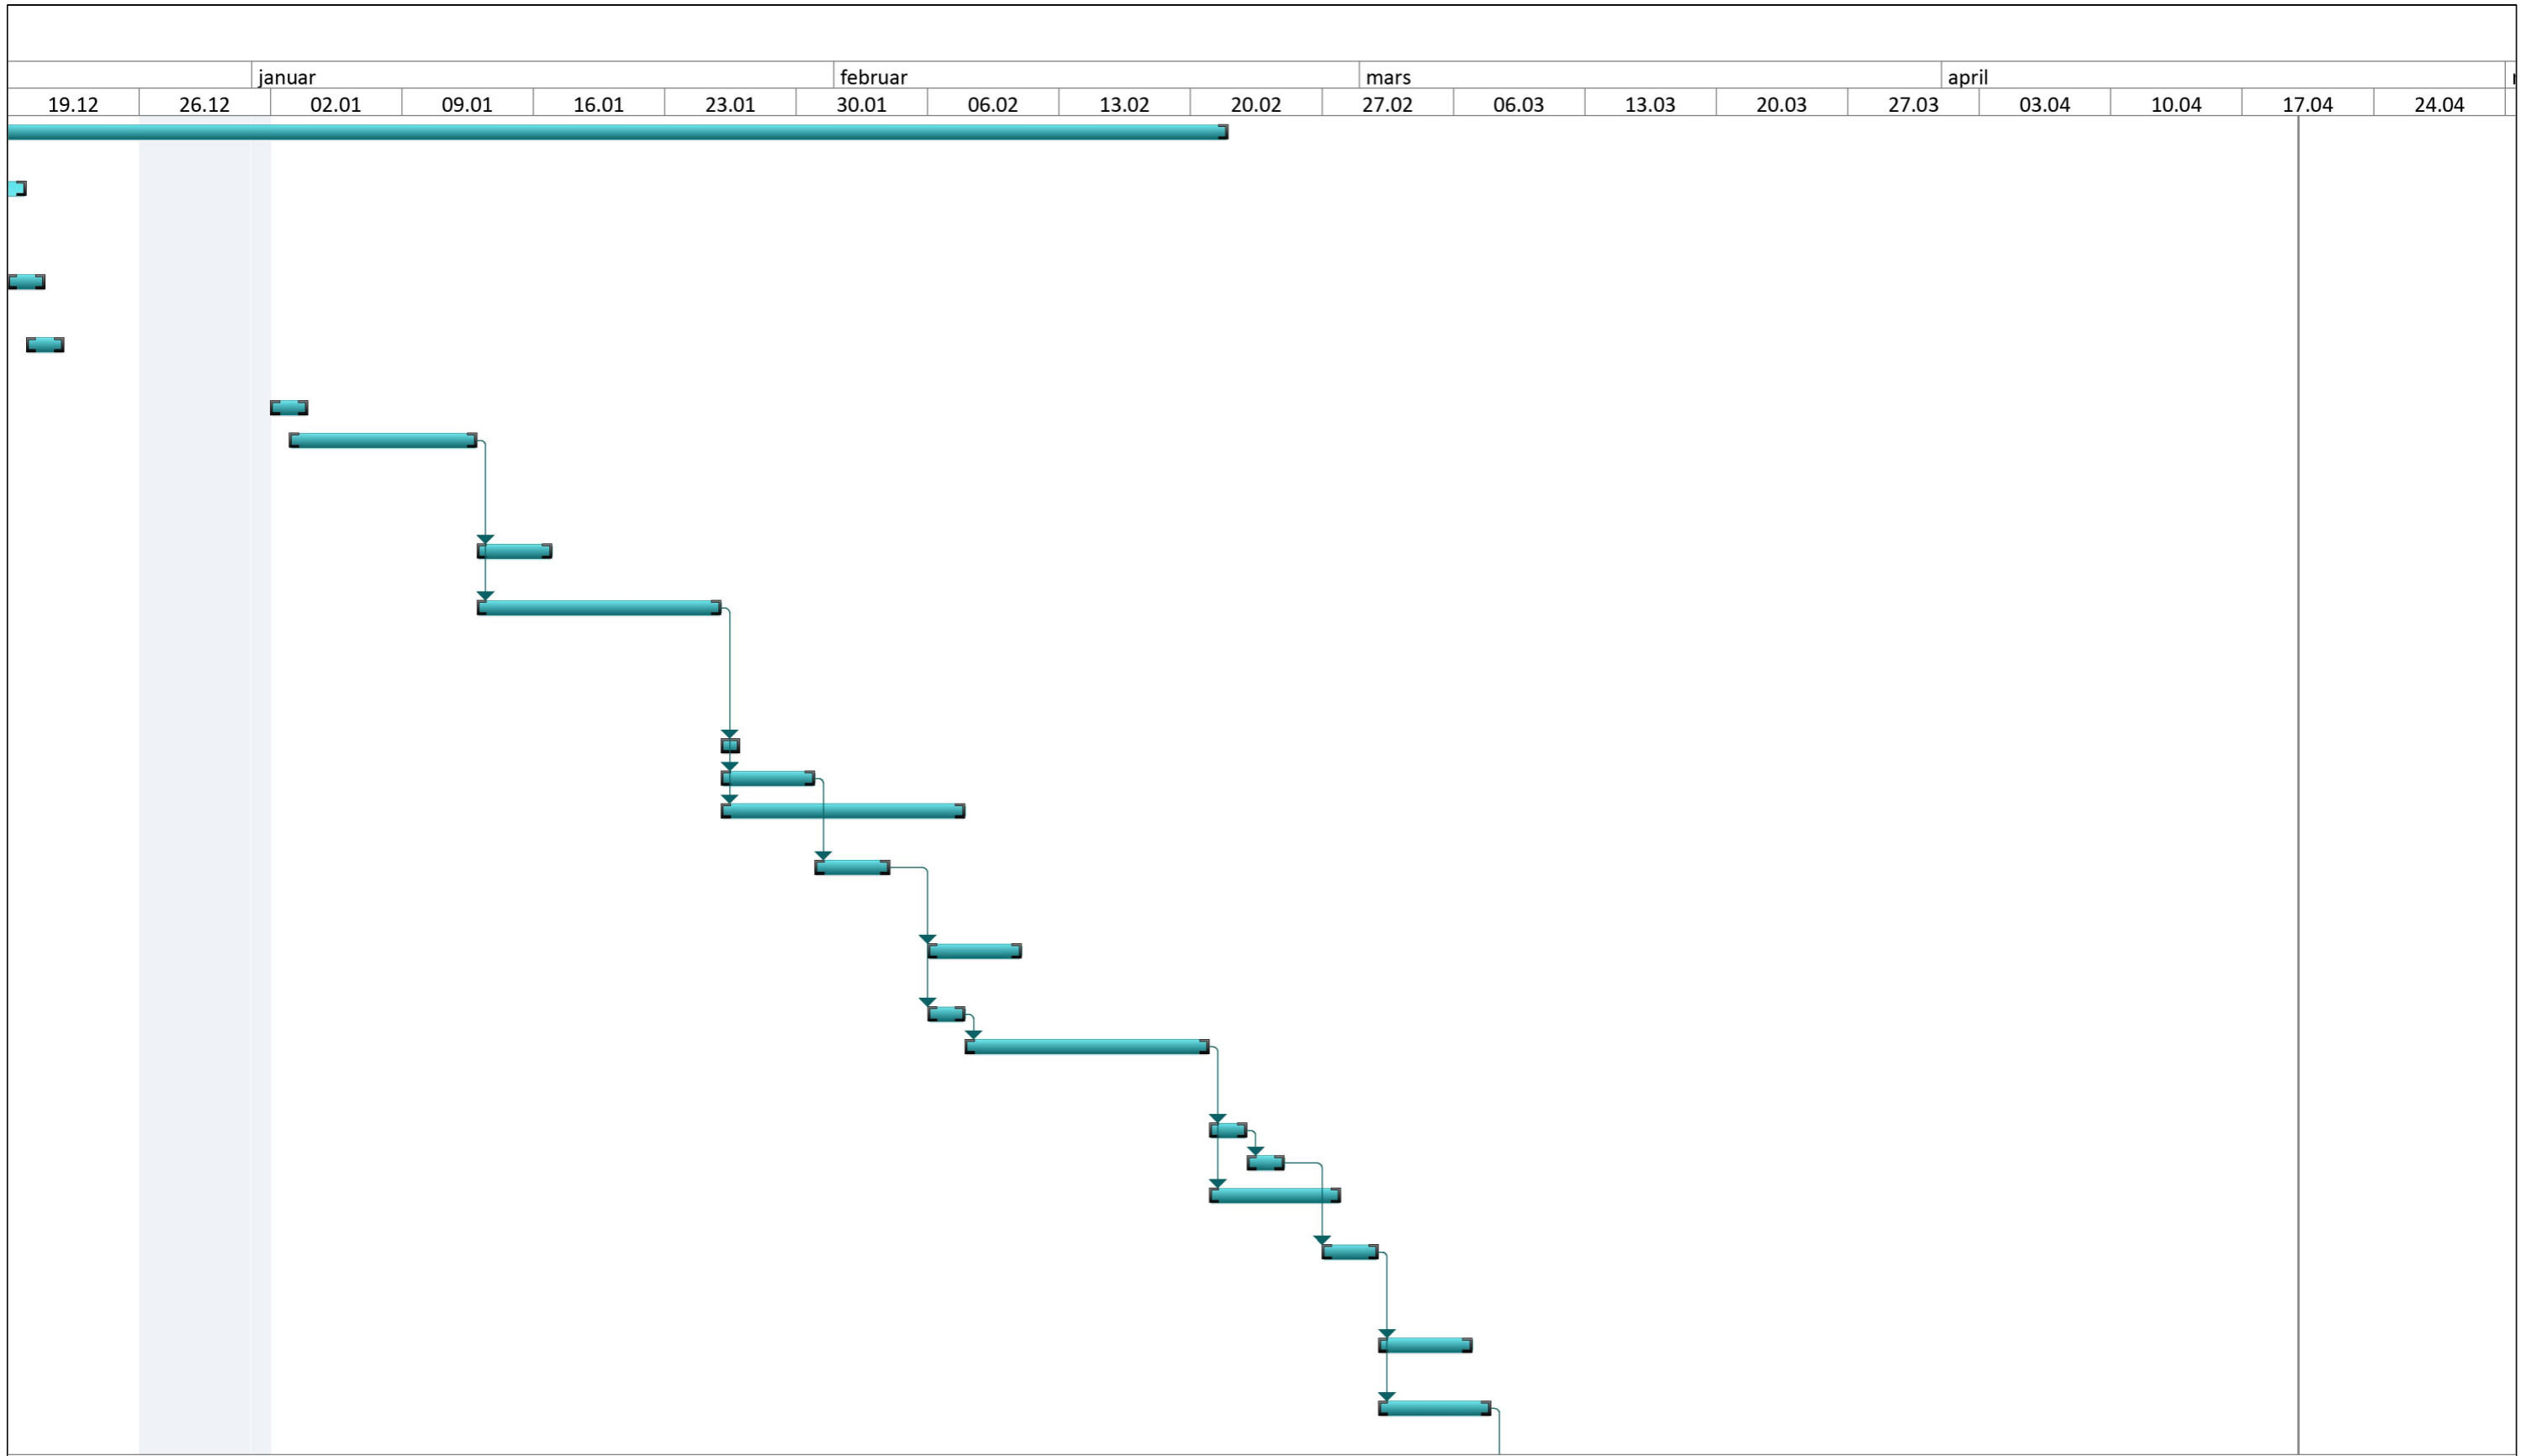

Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
 Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			



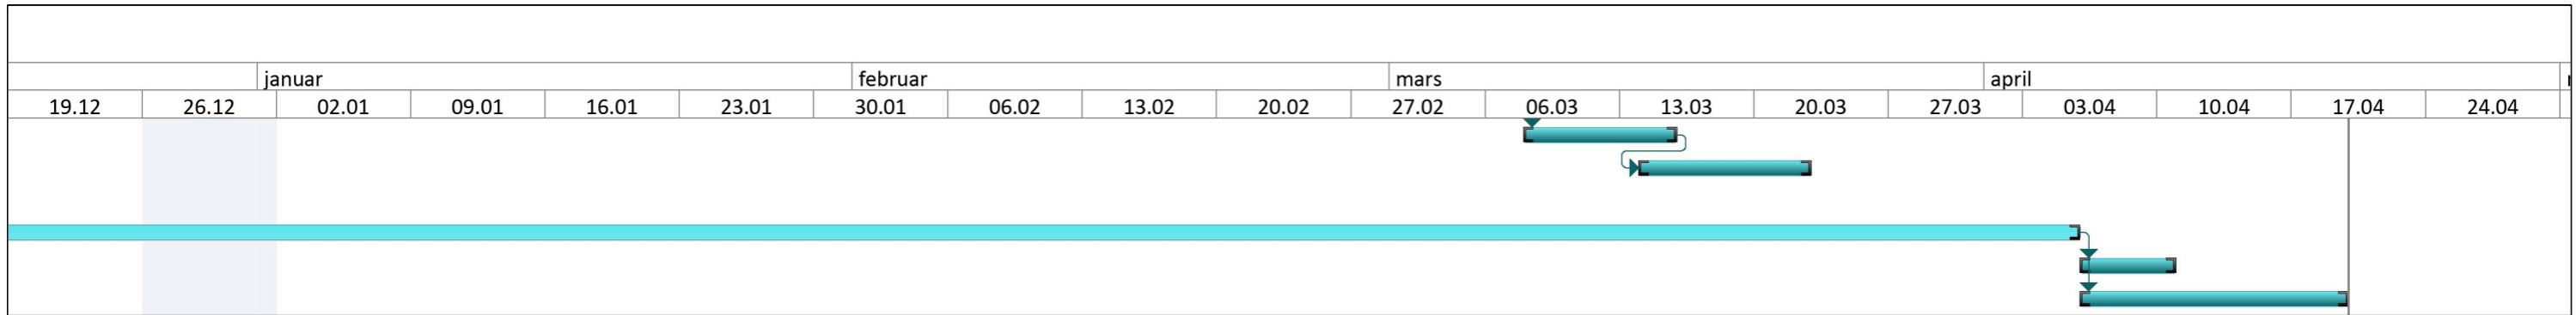

Prosjekt: Fremdriftsplan VA anleg  
 Dato: to 17.11.16

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag			
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			
