



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Plan nr.: | N8293-2018 | Mime-nr.: | 18 / 220486 | Vedtak nr.: | N8293-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 402 | fra Hp/km: | 02 / 1,620 | til Hp/km: | 02 / 1,900 |
| Strekning: | Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei | | | | |

| Arbeidet utføres i perioden | | | Daglig arbeids- / virketid | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Fra dato: | 16 oktober 2018 | Til dato: | 31 desember 2018 | Fra kl.: | 07:30 | Til kl.: | 18:00 |

Annet: Arbeid man - fre.

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| Region: | Vest | Region (2): | | | |
| Avdeling: | Hordaland | Avd. (2): | | | |
| | | Avd. (3): | | | |
| Seksjon: | Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland | Telefon: | 95 845 124 | Faks: | |
| Adresse: | | | | | |
| | e-post: | nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no | | | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/> | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | | Manuell dirigering..... | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **16.10.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **Lindås kommune v/ Arne Helgesen - tlf. 9594 5434.**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **VE Anlegg AS** e-post: **0**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Bengt Jangefelt** e-post: **bengt.jangefelt@veanlegg.no**
- Ansvarshavende: **Bengt Jangefelt** Tlf./e-post: **46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no**
 Stedsansvarlig(e): **Ruben Nilsen** Tlf./e-post: **901 40 085/m-entreprenor@hotmail.com**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Utvise særlig hensyn til myke trafikanter. Skole og barnehage i omr. Info til disse v/ entreprenør / evt Byggherre.

Etablere omkjøringsveg i fase 1 ihh skisse.

Etablere alt GS-veg når fortau er blokkert. Skal avskjermes fra trafikk/anl omr. Godt dekke og belysning.

Merkes, varsles og sikres ihh HB N301 / 101.

Tilrettelegge for driftsentr som utfører vintervedlikehold. Evt må VE-anlegg stå for dette i anl omr.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

16.10.2018

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Plan nr.: | N8293-2018 | Mime-nr.: | 18 / 220486 | Vedtak nr.: | N8293-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 402 | fra Hp/km: | 02 / 1,620 | til Hp/km: | 02 / 1,900 |
| Strekning: | Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei | | | | |
| Utførende av arb. varsling*: | Bengt Jangefelt | | | | |
| Adresse: | Glaskaret 1B | | | | |
| Ansvarshavende: | Bengt Jangefelt | Tlf./e-post: | 46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg | | |
| Stedsansvarlig(e): | Ruben Nilsen | Tlf./e-post: | 901 40 085/rn-entreprenor@hotmail.c | | |
| Arbeidet utføres | fra dato: | 16 oktober | 2018 | Til dato: | 31 desember 2018 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

| | Skilt nr.: | Ant.: |
|--|--------------|----------|
| | 110 | et behov |
| | 106.1_a | et behov |
| | 560 | et behov |
| | 560 | 2 |
| | 906.OV_a | et behov |
| | Godkj sikr | et behov |
| | Byggjerde | et behov |
| | 1098 BI lykt | et behov |
| | 810 H/V90 | et behov |

Merknader:

Tungsikring benyttes variogard type T3.


Tungsikring flyttes over til motsatt side ved fase 2.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.
Bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.
Myke trafikanter skal, når fortau er blokkert, sikres tilfredsstillende framkomst. Godt komprimert / evt fast dekke, fysisk avskjerming fra anleggsomr., belysning.
Det skal benyttes godkjent sikring ved behov.
Husk godkjent stolpehøyde GS-veg.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:

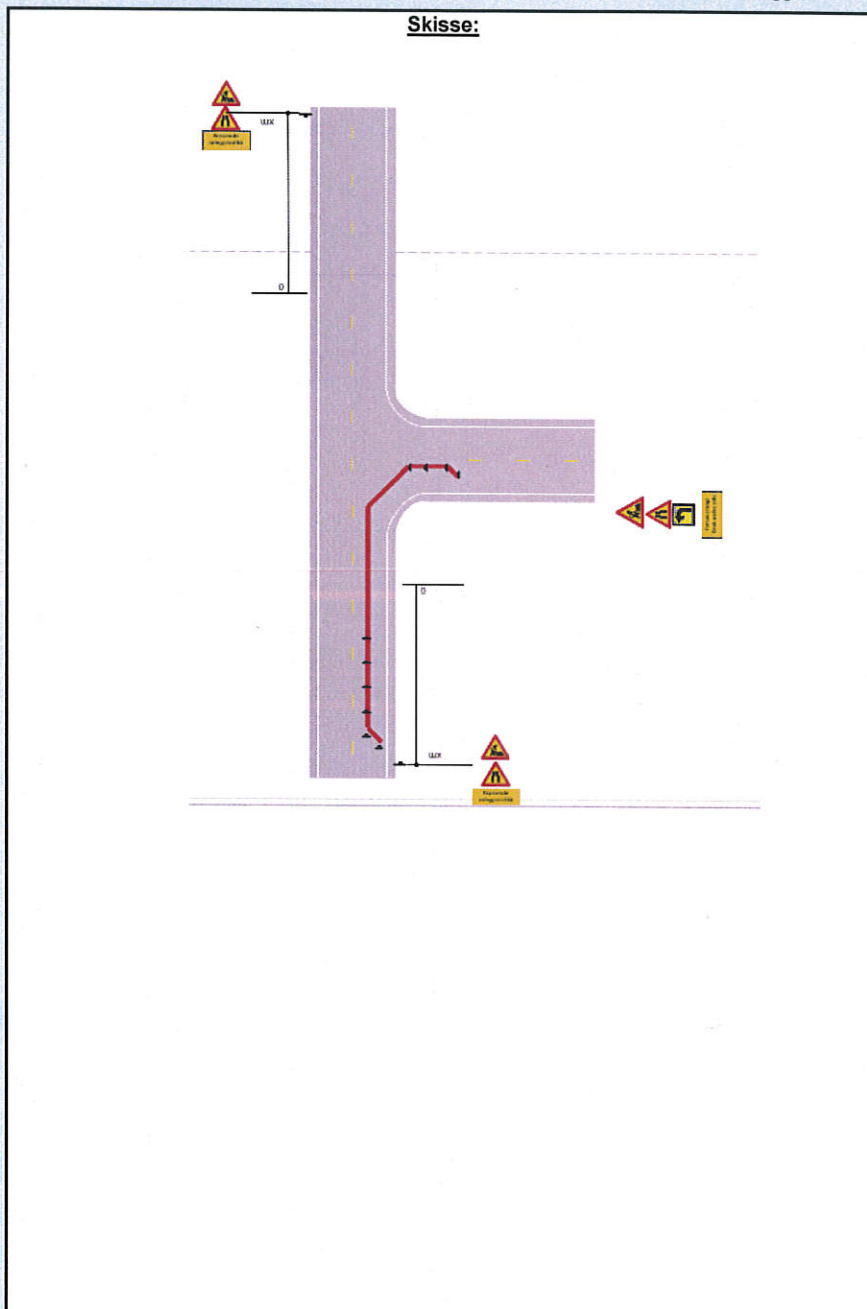

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

16.10.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| Plan nr.: | N8293-2018 | Mime-nr.: | 18 / 220486 | Vedtak nr.: | N8293-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 402 | fra Hp/km: | 02 / 1,620 | til Hp/km: | 02 / 1,900 |
| Strekning: | Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei | | | | |
| Ansvarshavende: | Bengt Jangefelt | | Tlf./e-post: 46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Utførende arb.v.*: | Bengt Jangefelt | Adresse: | Glaskaret 1B |
| Arbeidet utføres i perioden | | | Arbeidets varighet |
| Fra dato: | 16 oktober 2018 | Til dato: | 31 desember 2018 |
| | | | 60 dager |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Skade på myke trafikkanter i anleggsområde ved påkjørsel av personbil
Påkjørsel av myk trafikant av anleggsmaskin
Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy
Lokalt høy fart gjennom kryss, tross 40 sone

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

- | | Konsekvens: | Sannsynlighet: | Risiko |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| | Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens: | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? | = K x S |
| | Stor: 3 | Stor: 3 | |
| | Middels: 2 | Middels: 2 | |
| | Liten: 1 | Liten: 1 | |
| 1: Fare for skade på myke trafikkanter i anleggsområde ved påkjørsel av personbil | 3 | 2 | 6 |
| 2: Fare for at anleggsmaskin kjører på myk trafikant | 2 | 1 | 2 |
| 3: Fare for sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy | 3 | 1 | 3 |
| 4: Fare for klemskader | 1 | 2 | 2 |
| 5: | 2 | 1 | 2 |
| 6: | | | 0 |
| 7: | | | 0 |
| 8: | | | 0 |
| 9: | | | 0 |
| 10: | | | 0 |
| 11: | | | 0 |

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Passering for myke trafikkanter legges over til motsatt side av arbeidsområde. Avskjerming mot anl omr.
- 2: Tung sikring settes opp mellom arbeidsområde og kjørebane
- 3: Tydlig skilting
- 4: Ingen utstikkende komponenter. Oppmerksomhet ift arbeidere / maskiner / vegfarende.
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Bengt Jangefelt** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Plan nr.: | N8293-2018 | Mime-nr: | 18 / 220486 | Vedtak nr.: | N8293-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 402 | fra Hp/km: | 02 / 1,620 | til Hp/km: | 02 / 1,900 |
| Strekning: | Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Ansvarshavende*: | Bengt Jangefelt | | | Tlf./e-post: | 46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no |
| Utførende entreprenør: | VE Anlegg AS | | | Adresse: | Glaskaret 1B |
| | | | | (Ev.e-post) | |
| Utførende arb. varsling*: | Bengt Jangefelt | | | Adresse: | Glaskaret 1B |
| Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | 919 572 485 | | | (Ev. e-post:) | bengt.jangefelt@veanlegg.no |
| Stedsansvarlig(e): | Ruben Nilsen | | | Tlf./e-post: | 901 40 085/rn- entreprenor@hotmail.com |
| Arbeid som skal utføres*: | Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | (Arbeidets varighet) | |
| Fra dato: | 16 oktober | 2018 | Til dato: | 31 desember | 2018 |
| | | | | | 60 dager |



I forbindelsen med arbeid for Lindås kommune - vegavdelingen skal VE anlegg utvide vei og etablere fortau på FV402 og inn mot sideveg Lurevegen (Pv1154 hp1 25), Sjøvoldskrysset.

Utførelsen vil skje i 3 faser.

Fase 1 (blå sky)
Fase 2 (rød sky)

Under fase 1 vil det bli opparbeidet omkjøringsvei på eiendom 172/79.

I området befinner det seg kjøretilgang til barnehage, gå tilgang til skole.

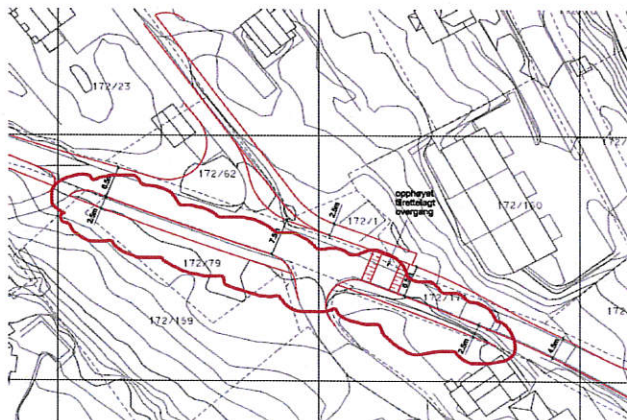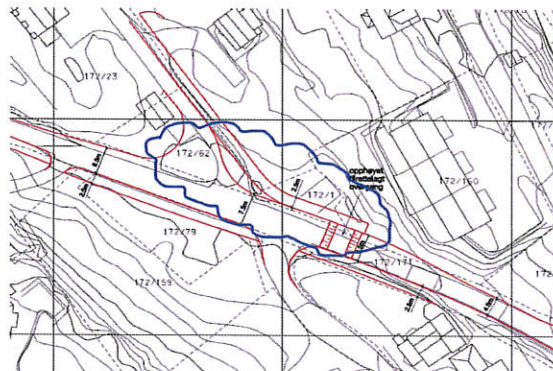



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| Plan nr.: | N8293-2018 | Mime-nr.: | 18 / 220486 | Vedtaks nr.: | N8293-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 402 | fra Hp/km: | 02 / 1,620 | til Hp/km: | 02 / 1,900 |
| Strekning: | Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei | | | | |
| Ansvarshavende: | Bengt Jangefelt | | | Tlf./e-post: | 46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no |
| Utførende av arbeidsvarsling: | Bengt Jangefelt | | | Adresse: | Glaskaret 1B |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | | |
| Fra dato: | 16 oktober | 2018 | Til dato: | 31 desember | 2018 |

Det er skole og barnehage i området. Entreprenør / evt Byggherre må gi info til skole og barnehage om arbeidet.

Utvis særlig forsiktighet ifm mange barn passerer arbeidsområdet. Info om dette til alle som deltar i arbeidet.

Ved spesielle operasjoner der det er nødvendig å stanse trafikk i noen minutter (rygging/lossing/maskinforflytning mm) skal det benyttes trafikkvakter.

Kontaktperson Statens vegvesen : *Arnlot Jordal - tlf. 97675235.*



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| Plan nr.: | N8293-2018 | Mime-nr: | 18 / 220486 | Vedtak nr.: | N8293-2018 |
| Veg nr.: | Fv. 402 | fra Hp/km: | 02 / 1,620 | til Hp/km: | 02 / 1,900 |
| Strekning: | Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Utførende: | Bengt Jangefelt | | | | |
| Ansvarshavende: | Bengt Jangefelt | | | | |
| Stedsansvarlig: | Ruben Nilsen | | | | |
| Kontroll utført dato: | | | | Kontroll utført av: | |

| Forhold: | OK | Merknad: | Frist: |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet | | | |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig | | | |
| Midlertidig signalregulering er fjernet | | | |
| Permanent signalregulering er igangsatt | | | |
| Midlertidig vegoppmerking er fjernet | | | |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende | | | |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjernet | | | |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene | | | |
| Brakkerigg er fjernet | | | |
| Arbeidsområdet er ryddet | | | |
| Vegdekket er i tilfredsstillende stand | | | |
| Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket | | | |
| Forholdene for de gående er tilfredsstillende | | | |
| Forholdene for de syklende er tilfredsstillende | | | |
| Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende | | | |
| Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet | | | |
| Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert | | | |

Merknader:

