



## Statens vegvesen

### Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

|                                                                     |                                    |            |                                                                                                                |                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Plan nr.:                                                           | N9305-2019                         | Mime-nr.:  | 19 / 233                                                                                                       | Vedtak nr.:                | N9305-2019        |
| Veg nr.:                                                            | FV 565                             | fra Hp/km: | 02 / 0,001                                                                                                     | til Hp/km:                 | 02 / 0,350        |
| Strekning:                                                          | Alverstraumen bru - Lindås kommune |            |                                                                                                                | Sted:                      | Alverstraumen bru |
| Arbeid som skal utføres:                                            | Broinspeksjoner                    |            |                                                                                                                |                            |                   |
| Arbeidet utføres i perioden                                         |                                    |            |                                                                                                                | Daglig arbeids- / virketid |                   |
| Fra dato:                                                           | 17 oktober 2019                    | Til dato:  | 18 oktober 2019                                                                                                | Fra kl.:                   | 22:00             |
|                                                                     |                                    |            |                                                                                                                | Til kl.:                   | 05:30             |
| Annet: Utrykningskjøretøy under utrykning må ringe VTS før ankomst. |                                    |            |                                                                                                                |                            |                   |
| Region: Vest                                                        |                                    |            | Region (2):                                                                                                    |                            |                   |
| Avdeling: Hordaland                                                 |                                    | Avd. (2):  |                                                                                                                | Avd. (3):                  |                   |
| Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland                    |                                    |            | Telefon: 95 845 124                                                                                            |                            | Faks:             |
| Adresse:                                                            |                                    |            | e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a> |                            |                   |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

|                               |                             |                                 |                             |                              |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/>    | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/>    | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/> 30   | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 50     | <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> 70  | <input type="checkbox"/> 80         |
| <input type="checkbox"/> 90   |                             |                                 |                             | Manuell dirigering.....      | <input type="checkbox"/>            |
|                               |                             |                                 |                             | Vegstengning.....            | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 09.10.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet SVV v/ Melake Gebremichael - tlf. 47902335  
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ Entreprenør/byggeleder Mesta AS e-post: 0  
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ Navn på ansvarlig Securitas AS e-post: kristoffer.eliassen@securitas.no
- Ansvarshavende: Johnny Larsen Tlf./e-post: 97739968/johnny.larsen@mesta.no  
Stedsansvarlig(e): Kristoffer Eliassen Tlf./e-post: 46442019/Kristoffer.eliassen@securitas.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ..... ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒  
Vegtrafikksentralen..... ☒  
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):  
Kollektivselskap..... ☒ Angi hvilke(t): Skyss / Vy  
Radio, presse m.m..... ☒ Angi hvem: NRK lokal, Lokalaviser i Nordhordland. Ansv. : Svv-byggeleder.  
Andre..... ☐ Angi hvem:
- Tillatelser:  
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒  
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
Fjernskiltning skal settes ut min. 5 dager før oppstart. Plassering : Se "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres".  
Nødetater under utrykning må ringe VTS før ankomst.  
Brua stenges i tida kl 22:00 - 05:30. Gjennomkjøring hver hele time.  
Entreprenør må avklare med busselskap så rutegående busser kommer over i rute.  
Gående kan passere etter avtale med ansvarlig for arbeidet på stedet.  
Varsle NRK lokal + lokalaviser om stengningen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

09.10.2019

Sted

Dato

Arve Løtveit  
Sign. (etter fullmakt)



|                              |                                    |            |            |              |                                     |
|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| Plan nr.:                    | N9305-2019                         | Mime-nr.:  | 19 / 233   | Vedtak nr.:  | N9305-2019                          |
| Veg nr.:                     | FV 565                             | fra Hp/km: | 02 / 0,001 | til Hp/km:   | 02 / 0,350                          |
| Strekning:                   | Alverstraumen bru - Lindås kommune |            |            | Sted:        | Alverstraumen bru                   |
| Arbeid som skal utføres:     | Broinspeksjoner                    |            |            |              |                                     |
| Utførende av arb. varsling*: | Securitas AS                       |            |            |              |                                     |
| Adresse:                     | Storetveitvegen 56, 5072 Bergen    |            |            |              |                                     |
| Ansvarshavende:              | Johnny Larsen                      |            |            | Tlf./e-post: | 97739968/johnny.larsen@mesta.no     |
| Stedsansvarlig(e):           | Kristoffer Eliassen                |            |            | Tlf./e-post: | 46442019/Kristoffer.eliasen@securit |
| Arbeidet utføres             | fra dato:                          | 17 oktober | 2019       | Til dato:    | 18 oktober 2019                     |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

| <u>Varslingsmaterieel:</u>                                                        |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                   | <u>Skilt nr.:</u> | <u>Ant.:</u> |
|  | 110               | 2 stk        |
|  | 106               | 2 stk        |
|  | 808.727           | 2 stk        |
|  | 930               | 2 stk        |
|  | 1098 BI lykt      | 4            |
|                                                                                   | dirigent          | 2+           |
|  | 906 H/V           | e.behov      |
|  |                   |              |

Hastighet på stedet er 50 km/t -

NB: Eksisterende skilt, pilsymboler og gangfelt er utelatt fra skissen for lesbarhetens skyld. Disse må vurderes spesielt, og evt tildekkes / suppleres.

Plasseringen av midlertidige skilt må tilpasses det aktuelle arbeidsstedet i henhold til håndbok N301.

Bruk 1098 blinkende gult lys på 930 og 110.

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås, Austrh og Radøy

**Skisse:**

560 som vist i  
tilleggsopplysninger

Alverstråumen Bro stengt  
Torsdag 17. okt kl 22:00-05:30  
Åpen for gjennomkjøring  
hver hele time

Manuell dirigering

150m

0

Manuell dirigering

150m

## Bergen

09.10.2019

## Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

|                          |                                    |            |            |             |                   |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Plan nr.:                | N9305-2019                         | Mime-nr.:  | 19 / 233   | Vedtak nr.: | N9305-2019        |
| Veg nr.:                 | FV 565                             | fra Hp/km: | 02 / 0,001 | til Hp/km:  | 02 / 0,350        |
| Strekning:               | Alverstraumen bru - Lindås kommune |            |            | Sted:       | Alverstraumen bru |
| Arbeid som skal utføres: | Broinspeksjoner                    |            |            |             |                   |

Ansvarshavende: Johnny Larsen Tlf./e-post: 97739968/johnny.larsen@mesta.no

Utførende arb.v.\*: Securitas AS Adresse: Storetveitvegen 56, 5072 Bergen

| Arbeidet utføres i perioden |            |      |           | Arbeidets varighet |      |
|-----------------------------|------------|------|-----------|--------------------|------|
| Fra dato:                   | 17 oktober | 2019 | Til dato: | 18 oktober         | 2019 |
|                             |            |      |           | 2200-0530          |      |

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

| Broarbeid                                                             | Konsekvens:                                     | Sannsynlighet:                                       | Risiko  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Høy ADT                                                               | Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens: | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen? | = K x S |
| Vind                                                                  | Stor: 3                                         | Stor: 3                                              |         |
| Arbeid i høyde                                                        | Middels: 2                                      | Middels: 2                                           |         |
| Høy fart                                                              | Liten: 1                                        | Liten: 1                                             |         |
|                                                                       | 3                                               | 2                                                    | 6       |
| 1: Dropp av utstyr/verktøy fra bra og ned på ferdsel under            | 1                                               | 3                                                    | 3       |
| 2: Arbeid på utsiden av gelender på bro over hav/terreng med fallfare | 1                                               | 1                                                    | 1       |
| 3: Påkjørsel av arbeidere ved utsetting/innhenting av skilt           | 3                                               | 1                                                    | 3       |
| 4: Påkjørsel av dirigent ved dirigering                               | 3                                               | 1                                                    | 3       |
| 5: Påkjørsel av hovedentreprenørens arbeidere og/eller maskiner       | 2                                               | 1                                                    | 2       |
| 6: Myke trafikanter i arbeidsområde                                   | 1                                               | 3                                                    | 3       |
| 7: Skilt og sperremattriell kan komme ut av posisjon                  | 2                                               | 1                                                    | 2       |
| 8: Trafikanter har høy fart inn i arbeidsområdet                      | 2                                               | 2                                                    | 4       |
| 9:                                                                    |                                                 |                                                      | 0       |
| 10:                                                                   |                                                 |                                                      | 0       |
| 11:                                                                   |                                                 |                                                      | 0       |

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Feste verktøy og utstyr til sele eller rekkverk på bro før dette tas med til utsiden av broen
- 2: Bruk av godkjent fallsele, makkepar som jobber sammen med godkjent fallsikringskurs
- 3: Skilte opp en side om gangen, benytte dirigent til å lede trafikken forbi ved behov
- 4: Være årvåken, rullere på oppgavene slik at fokus og konsentrasjon opprettholdes. Benytte godkjent synlighetstøy
- 5: Benytte manuell dirigering
- 6: Være årvåken, dirigent og mannskaper leder fotgjengere trygt forbi arbeidsstedet
- 7: Påse at skilt er korrekt satt ut, påse at disse ikke kommer ut av posisjon og sikre ekstra ved vind.
- 8: Redusere skiltet hastighet til 50 km/t - ekstra årvåken på trafikkflyt.
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Johnny Larsen bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

|                                                 |                                    |            |            |                      |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------|
| Plan nr.:                                       | N9305-2019                         | Mime-nr.:  | 19 / 233   | Vedtak nr.:          | N9305-2019                               |
| Veg nr.:                                        | FV 565                             | fra Hp/km: | 02 / 0,001 | til Hp/km:           | 02 / 0,350                               |
| Strekning:                                      | Alverstraumen bru - Lindås kommune |            |            | Sted:                | Alverstraumen bru                        |
| Ansvarshavende*:                                | Johnny Larsen                      |            |            | Tlf./e-post:         | 97739968/johnny.larsen@mesta.no          |
| Utførende entreprenør:                          | Mesta AS                           |            |            | Adresse:             | Sognefjordvegen 24 6863 Leikanger        |
|                                                 |                                    |            |            | (Ev.e-post)          |                                          |
| Utførende arb. varsling*:                       | Securitas AS                       |            |            | Adresse:             | Storetveitvegen 56, 5072 Bergen          |
| Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | 920 144 950                        |            |            | (Ev. e-post:)        | kristoffer.eliasen@securitas.no          |
| Stedsansvarlig(e):                              | Kristoffer Eliassen                |            |            | Tlf./e-post:         | 46442019/Kristoffer.eliasen@securitas.no |
| Arbeid som skal utføres*:                       | Broinspeksjoner                    |            |            |                      |                                          |
| Arbeidet utføres i perioden                     |                                    |            |            | (Arbeidets varighet) |                                          |
| Fra dato:                                       | 17                                 | oktober    | 2019       | Til dato:            | 18 oktober 2019                          |
|                                                 |                                    |            |            | 2200-0530            |                                          |

Broinspeksjon - hele broen

Det benyttes brulift ved inspeksjonene.

Da broen bare har ett kjørefelt er det nødvendig å stenge broen for gjennomkjøring under arbeidene.

Det skiltes i forkant om at "broen blir stengt Torsdag 17.10 fra kl 2200-0530 Gjennomkjøring hver hele time"

Skisse for 560 opplysningsskilt vist i tilleggsopplysninger.

INFO-tavler vedr stengning skal utplasseres min. 5 dager før oppstart.

Antall info-tavler : 3 stk.

Plassering : Ved rundkjøring Isdal-bakken (2 stk) med retning nord Fv 57 og retning mot Radøy Fv 565.

Ved Austrheim kirke Fv 565 retning mot Radøy.


Info lokalaviser. Ansvarlig : SVV v/ Byggelder.



Statens vegvesen

### Tilleggsopplysninger

|                               |                                    |            |            |              |                                 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|
| Plan nr.:                     | N9305-2019                         | Mime-nr.:  | 19 / 233   | Vedtak nr.:  | N9305-2019                      |
| Veg nr.:                      | FV 565                             | fra Hp/km: | 02 / 0,001 | til Hp/km:   | 02 / 0,350                      |
| Strekning:                    | Alverstraumen bru - Lindås kommune |            |            | Sted:        | Alverstraumen bru               |
| Arbeid som skal utføres:      | Broinspeksjoner                    |            |            |              |                                 |
| Ansvarshavende:               | Johnny Larsen                      |            |            | Tlf./e-post: | 97739968/johnny.larsen@mesta.no |
| Utførende av arbeidsvarsling: | Securitas AS                       |            |            | Adresse:     | Storetveitvegen 56, 5072 Bergen |
| Arbeidet utføres i perioden   |                                    |            |            |              |                                 |
| Fra dato:                     | 17 oktober                         | 2019       | Til dato:  | 18 oktober   | 2019                            |

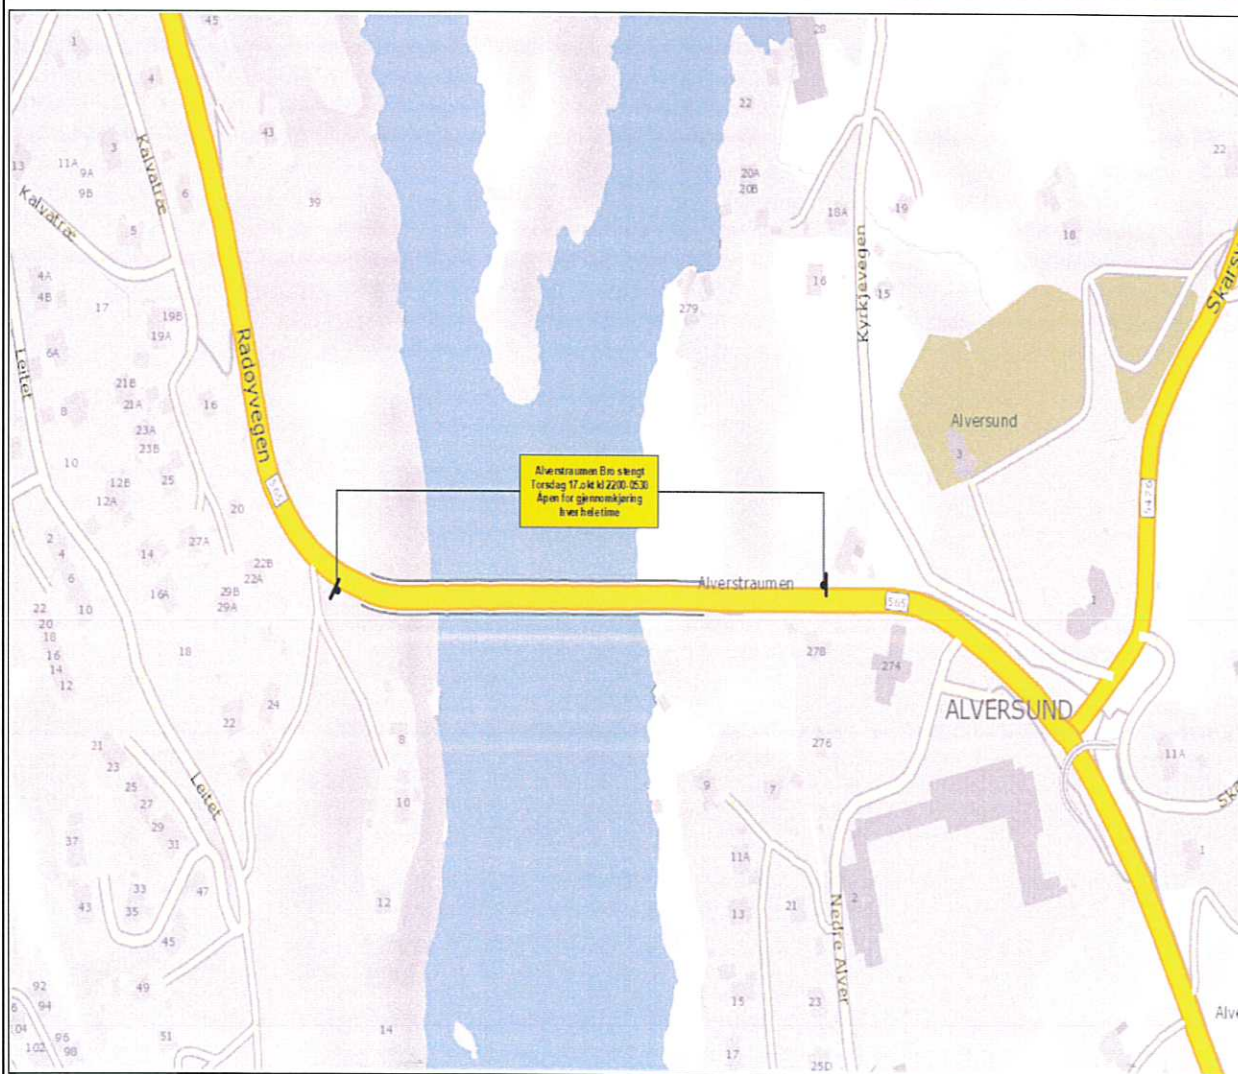



# Statens vegvesen

## Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

|                       |                                    |                     |                   |             |            |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|
| Plan nr.:             | N9305-2019                         | Mime-nr:            | 19 / 233          | Vedtak nr.: | N9305-2019 |
| Veg nr.:              | FV 565                             | fra Hp/km:          | 02 / 0,001        | til Hp/km:  | 02 / 0,350 |
| Strekning:            | Alverstraumen bru - Lindås kommune | Sted:               | Alverstraumen bru |             |            |
| Utførende:            | Securitas AS                       |                     |                   |             |            |
| Ansvarshavende:       | Johnny Larsen                      |                     |                   |             |            |
| Stedsansvarlig:       | Kristoffer Eliassen                |                     |                   |             |            |
| Kontroll utført dato: |                                    | Kontroll utført av: |                   |             |            |

| Forhold:                                                      | OK | Merknad: | Frist: |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet    |    |          |        |
| Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig            |    |          |        |
| Midlertidig signalregulering er fjernet                       |    |          |        |
| Permanent signalregulering er igangsatt                       |    |          |        |
| Midlertidig vegoppmerking er fjernet                          |    |          |        |
| Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende                  |    |          |        |
| Midlertidig sikringsutstyr er fjernet                         |    |          |        |
| Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene   |    |          |        |
| Brakkerigg er fjernet                                         |    |          |        |
| Arbeidsområdet er ryddet                                      |    |          |        |
| Vegdekket er i tilfredsstillende stand                        |    |          |        |
| Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket               |    |          |        |
| Forholdene for de gående er tilfredsstillende                 |    |          |        |
| Forholdene for de syklende er tilfredsstillende               |    |          |        |
| Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende    |    |          |        |
| Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet       |    |          |        |
| Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet |    |          |        |
| Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert                   |    |          |        |

Merknader:



# Statens vegvesen

## Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

|                                                      |                              |                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Plan nr.: <b>N9305-2019</b>                          | Mime-nr: <b>19 / 233</b>     | Vedtak nr.: <b>N9305-2019</b>  |
| Veg nr.: <b>FV 565</b>                               | fra Hp/km: <b>02 / 0,001</b> | til Hp/km: <b>02 / 0,350</b>   |
| Strekning: <b>Alverstraumen bru - Lindås kommune</b> |                              | Sted: <b>Alverstraumen bru</b> |
| Utførende av arb.varsling: <b>Securitas AS</b>       |                              |                                |
| Ansvarshavende: <b>Johnny Larsen</b>                 |                              |                                |
| Stedsansvarlig: <b>Kristoffer Eliassen</b>           |                              |                                |
| Kontroll utført dato:                                | Kontroll utført av:          |                                |

|                           | Ja                                            | Nei                      |        | Ja                       | Nei                      | Ikke kontr.              |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ansvarshavende tilstede:  | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> | -----> | Nødvendige kurs?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stedsansvarlige tilstede: | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> | -----> | Nødvendige kurs?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Øvrige tilstede:          | Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs? |                          |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <div></div>               | Risikovurdering forevist og OK?               |                          |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                           | Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?          |                          |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                           | Loggbok forevist og OK?                       |                          |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

| Nr. | Tema                                                                                      | 1 | 2 | 3 | Merknader | Frist: |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------|
| 0   | Arbeidsvarslingsplan:                                                                     |   |   |   |           |        |
| 0.1 | Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?                             |   |   |   |           |        |
| 0.2 | Ansvarshavende: Tilgjengelig?                                                             |   |   |   |           |        |
| 0.3 | Stedsansvarlig: utpekt?                                                                   |   |   |   |           |        |
| 0.4 | Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?                                                         |   |   |   |           |        |
| 0.5 | Risikovurdering: Foreligger den?                                                          |   |   |   |           |        |
| 1   | Varsling                                                                                  |   |   |   |           |        |
| 1.1 | Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?                                    |   |   |   |           |        |
| 1.2 | Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold                  |   |   |   |           |        |
| 1.3 | Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil |   |   |   |           |        |

| Nr. | Tema                                                                                             | 1 | 2 | 3 | Merknader | Frist: |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------|
| 1.4 | Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter                                        |   |   |   |           |        |
| 1.5 | Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking                               |   |   |   |           |        |
| 1.6 | Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?                                                   |   |   |   |           |        |
| 1.7 | Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?            |   |   |   |           |        |
| 1.8 | Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?                                                    |   |   |   |           |        |
| 1.9 | Hindermarkeringer og lignende                                                                    |   |   |   |           |        |
| 2   | Sikring                                                                                          |   |   |   |           |        |
| 2.1 | Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute                       |   |   |   |           |        |
| 2.2 | Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone                                       |   |   |   |           |        |
| 2.3 | Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking                                   |   |   |   |           |        |
| 3   | Trafikkomlegging                                                                                 |   |   |   |           |        |
| 3.1 | Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?                                 |   |   |   |           |        |
| 3.2 | Interimsveg: Optisk ledning OK?                                                                  |   |   |   |           |        |
| 3.3 | Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter                                                         |   |   |   |           |        |
| 3.4 | Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp |   |   |   |           |        |
| 3.5 | Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner   |   |   |   |           |        |
| 4   | Rigg/Lager                                                                                       |   |   |   |           |        |
| 4.1 | Brakkerigg                                                                                       |   |   |   |           |        |
| 4.2 | Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!                                         |   |   |   |           |        |
| 5   | Personlig verneutstyr                                                                            |   |   |   |           |        |
| 6   | Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet                          |   |   |   |           |        |
| 7   | Andre forhold                                                                                    |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |
|     |                                                                                                  |   |   |   |           |        |



|                          |                                            |            |                   |             |                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| Plan nr.:                | <b>N9305-2019</b>                          | Mime-nr:   | <b>19 / 233</b>   | Vedtak nr.: | <b>N9305-2019</b>                      |
| Veg nr.:                 | <b>FV 565</b>                              | fra Hp/km: | <b>02 / 0,001</b> | til Hp/km:  | <b>02 / 0,350</b>                      |
| Strekning:               | <b>Alverstraumen bru - Lindås kommune</b>  |            |                   | Sted:       | <b>Alverstraumen bru</b>               |
| Arbeid som skal utføres: | <b>Broinspeksjoner</b>                     |            |                   |             |                                        |
| Ansvarshavende:          | <b>Johnny Larsen</b>                       |            |                   | Tlf.:       | <b>97739968/johnny.larsen@mesta.no</b> |
| Stedsansvarlig(e):       | <b>Kristoffer Eliassen</b>                 |            |                   |             |                                        |
| Loggbok sendes:          | <b>Statens vegvesen avdeling Hordaland</b> |            |                   |             |                                        |

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)
