

| ID | Aktivitetsr | Aktivitetsnavn   | Varighet         | Start              | Slutt              | Ansvar                | Halvdel 1, 2018 |   | Halvdel 2, 2018 |   |
|----|-------------|--|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|---|
|    |             |  |                  |                    |                    |                       | j               | m | m               | j |
| 1  |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 2  |             | <b>MILEPÆLSPLAN / FREMDRIFTSPLAN - BØ BARNEHAGE</b>  | <b>405 dager</b> | <b>on 15.05.19</b> | <b>ti 01.12.20</b> |                       |                 |   |                 |   |
| 3  |             | Revisjon 01 - 02.05.2019   |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 4  |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 5  |             | <b>OPPSTART</b>  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 6  |             | Oppstart prosjektet  |                  | on 15.05.19        |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 7  |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 8  |             | <b>SØKNAD</b>  | <b>405 dager</b> | <b>on 15.05.19</b> | <b>ti 01.12.20</b> |                       |                 |   |                 |   |
| 9  |             | INNSENDING FORHÅNDSUTTALELSE VA  | 1 dag            | ma 20.05.19        | ma 20.05.19        | RIVA                  |                 |   |                 |   |
| 10 |             | INNSENDING SØKNAD IG-1 RIVING, GRUNNARBEIDER OG UTVENDIG VA  | 1 dag            | ma 27.05.19        | ma 27.05.19        | SØK                   |                 |   |                 |   |
| 11 |             | INNSENDING SØKNAD IG-2 BETONGARBEIDER  | 1 dag            | ma 05.08.19        | ma 05.08.19        | SØK                   |                 |   |                 |   |
| 12 |             | INNSENDING SØKNAD IG-3 RESTERENDE FAG  | 1 dag            | ma 02.09.19        | ma 02.09.19        | SØK                   |                 |   |                 |   |
| 13 |             | INNSENDING SØKNAD BRUKSTILLATELSE / FERDIG ATTEST  | 1 dag            | ma 02.11.20        | ma 02.11.20        | SØK                   |                 |   |                 |   |
| 14 |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 15 |             | <b>PROSJEKTERING</b>   | <b>90 dager</b>  | <b>on 15.05.19</b> | <b>ti 17.09.19</b> | <b>PROSJEKTERENDE</b> |                 |   |                 |   |
| 16 |             | Utvendig vannforsyning og avløpsanlegg, samt overvannshåndtering   |                  |                    | ma 20.05.19        | RIVA                  |                 |   |                 |   |
| 17 |             | Geoteknikk, utarbeidelse av grunndata og fundamentering  |                  |                    | fr 24.05.19        | RIG                   |                 |   |                 |   |
| 18 |             | RIB - betongarbeider / statikk   |                  |                    | fr 02.08.19        | RIB                   |                 |   |                 |   |
| 19 |             | Arkitekturprosjektering - inkludert interiørarkitektur (Statikk/bygningsfysikk / konstruksjon inngår som del av prosjektering) |                  |                    | on 28.08.19        | ARK                   |                 |   |                 |   |
| 20 |             | Landskap / arkitekturprosjektering   |                  |                    | on 28.08.19        | LARK                  |                 |   |                 |   |
| 21 |             | Brannprosjektering   |                  |                    | on 28.08.19        | RIBR                  |                 |   |                 |   |
| 22 |             | Ventilasjon og klimainnstallasjoner  |                  |                    | on 28.08.19        | PRO VENT              |                 |   |                 |   |
| 23 |             | Sanitær og varme   |                  |                    | on 28.08.19        | PRO SANITÆR           |                 |   |                 |   |
| 24 |             | Brann, nødlis og ledesystem - samt elektroarbeider   |                  |                    | on 28.08.19        | PRO ELEKTRO           |                 |   |                 |   |
| 25 |             | Kartlegging av lyd og vibrasjonskilder   |                  |                    | on 28.08.19        | RIAku                 |                 |   |                 |   |
| 26 |             | Kartlegging støy   |                  |                    | on 28.08.19        |                       |                 |   |                 |   |
| 27 |             | Annet  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 28 |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 29 |             | <b>RIVINGSARBEIDER</b>   |                  | ma 10.06.19        |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 30 |             | Rivningsarbeider OMSORGSBYGG   |                  | ma 10.06.19        |                    | RIVINGSENTREPRENØR    |                 |   |                 |   |
| 31 |             | Rivningsarbeider TIDLIGERE RÅDHUS  |                  | ma 05.08.19        |                    | RIVINGSENTREPRENØR    |                 |   |                 |   |
| 32 |             | Rivningsarbeider EKSISTERENDE BØ BARNEHAGE   |                  |                    |                    | RIVINGSENTREPRENØR    |                 |   |                 |   |
| 33 |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 34 |             | <b>GRUNNARBEIDER</b>   |                  | fr 02.08.19        |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 35 |             | Oppstart grunnarbeider   |                  | fr 02.08.19        |                    | GRUNNENTREPRENØR      |                 |   |                 |   |
| 36 |             |  |                  |                    |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 37 |             | <b>BETONGARBEIDER</b>  |                  | ma 02.09.19        |                    |                       |                 |   |                 |   |
| 38 |             | Oppstart betongarbeider  |                  | ma 02.09.19        |                    | BETONGENTREPRENØR     |                 |   |                 |   |

Prosjekt: FREMDRIFTSPLAN GR  
Dato: ti 07.05.19

|                    |  |                     |  |                               |  |                   |  |
|--------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| Aktivitet          |  | Inaktiv aktivitet   |  | Manuell sammendragsfremheving |  | Ekstern milepæl   |  |
| Deling             |  | Inaktiv milepæl     |  | Manuelt sammendrag            |  | Tidsfrist         |  |
| Milepæl            |  | Inaktivt sammendrag |  | Bare start                    |  | Fremdrift         |  |
| Sammendrag         |  | Manuell aktivitet   |  | Bare slutt                    |  | Manuell fremdrift |  |
| Prosjektsammendrag |  | Bare varighet       |  | Eksterne aktiviteter          |  |                   |  |

| ID | Aktivitetsr | Aktivitetsnavn   | Varighet         | Start              | Slutt              | Ansvar                         | Halvdel 1, 2018 |   | Halvdel 2, 2018 |   |
|----|-------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|
|    |             |  |                  |                    |                    |                                | j               | m | m               | j |
| 39 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 40 |             | <b>TØMMER</b>  |                  | <b>fr 01.11.19</b> |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 41 |             | Oppstart tømmerarbeider  |                  | fr 01.11.19        |                    | TØMRER MED FLERE               |                 |   |                 |   |
| 42 |             | Tett bygg  |                  |                    | lø 01.02.20        | TØMRER MED FLERE               |                 |   |                 |   |
| 43 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 44 |             | <b>BYGGTØRK</b>  | <b>20 dager</b>  | <b>lø 01.02.20</b> | <b>to 27.02.20</b> |                                |                 |   |                 |   |
| 45 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 46 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 47 |             | <b>UTOMHUS</b>   | <b>100 dager</b> | <b>fr 01.05.20</b> | <b>to 17.09.20</b> |                                |                 |   |                 |   |
| 48 |             | Detaljplan må utarbeides   |                  |                    |                    | GRUNN + GARTNER                |                 |   |                 |   |
| 49 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 50 |             | <b>VED OPPSTART INNVENDIGE ARBEIDER SKAL DET LAGES DETALJPLANER BASERT PÅ SONER. FREMDRIFTSPLAN UTARBEIDES ETTER LEAN TANKESETT OG MED SONE INNDELING.</b> | <b>165 dager</b> | <b>to 27.02.20</b> | <b>on 14.10.20</b> | <b>ALLE</b>                    |                 |   |                 |   |
| 51 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 52 |             | <b>OPPSTART INNVENDIGE ARBEIDER</b>  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 53 |             | Oppstart innvendige arbeider   |                  | fr 28.02.20        |                    | ALLE                           |                 |   |                 |   |
| 54 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 55 |             | <b>Komplementering</b>   |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 56 |             | Ferdigstilling alle fag  |                  | to 15.10.20        |                    | ALLE                           |                 |   |                 |   |
| 57 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 58 |             | <b>TEKNISK FERDIGSTILLELSE</b>   |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 59 |             | Teknisk ferdigstillelse i tråd med kontrakt  |                  | ma 28.10.19        |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 60 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 61 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 62 |             | <b>Avslutning av byggarbeider</b>  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 63 |             | Kontroll samtlige fag  |                  | ti 20.10.20        |                    | HITLAND                        |                 |   |                 |   |
| 64 |             | Flikk samtlige fag   |                  | on 28.10.20        |                    | ALLE                           |                 |   |                 |   |
| 65 |             | Utvask del 1   |                  | on 28.10.20        |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 66 |             | Utvask del 2   |                  | on 25.11.20        |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 67 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 68 |             | <b>Opplæring og testkjøring</b>  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 69 |             | Opplæring av bruker og driftspersonell   |                  | ma 02.11.20        |                    | HITLAND                        |                 |   |                 |   |
| 70 |             | Inngangsetting av teknisk anlegg mm (innregulering mm)   |                  | ma 02.11.20        |                    | TEKNISKE FAG                   |                 |   |                 |   |
| 71 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 72 |             | <b>OVERLEVERING TIL BYGGHERRE</b>  | <b>1 dag</b>     | <b>ti 01.12.20</b> | <b>ti 01.12.20</b> | <b>HITLAND &amp; BYGGHERRE</b> |                 |   |                 |   |
| 73 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |
| 74 |             | <b>PRØVEDRIFTSPERIODE</b>  | <b>153 dager</b> | <b>ti 01.12.20</b> | <b>to 01.07.21</b> |                                |                 |   |                 |   |
| 75 |             | Månedlig kontroll av bygg mht. tekniske funksjoner   |                  |                    |                    | HITLAND & TEKNISK              |                 |   |                 |   |
| 76 |             |  |                  |                    |                    |                                |                 |   |                 |   |


Prosjekt: FREMDRIFTSPLAN GR  
Dato: ti 07.05.19

|                    |  |                     |  |                               |  |                   |  |
|--------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| Aktivitet          |  | Inaktiv aktivitet   |  | Manuell sammendragsfremheving |  | Ekstern milepæl   |  |
| Deling             |  | Inaktiv milepæl     |  | Manuelt sammendrag            |  | Tidsfrist         |  |
| Milepæl            |  | Inaktivt sammendrag |  | Bare start                    |  | Fremdrift         |  |
| Sammendrag         |  | Manuell aktivitet   |  | Bare slutt                    |  | Manuell fremdrift |  |
| Prosjektsammendrag |  | Bare varighet       |  | Eksterne aktiviteter          |  |                   |  |



Prosjekt: FREMDRIFTSPLAN GR  
 Dato: ti 07.05.19

|                    |  |                     |  |                              |  |                   |  |
|--------------------|--|---------------------|--|------------------------------|--|-------------------|--|
| Aktivitet          |  | Inaktiv aktivitet   |  | Manuell sammendragfremheving |  | Ekstern milepæl   |  |
| Deling             |  | Inaktiv milepæl     |  | Manuelt sammendrag           |  | Tidsfrist         |  |
| Milepæl            |  | Inaktivt sammendrag |  | Bare start                   |  | Fremdrift         |  |
| Sammendrag         |  | Manuell aktivitet   |  | Bare slutt                   |  | Manuell fremdrift |  |
| Prosjektsammendrag |  | Bare varighet       |  | Eksterne aktiviteter         |  |                   |  |

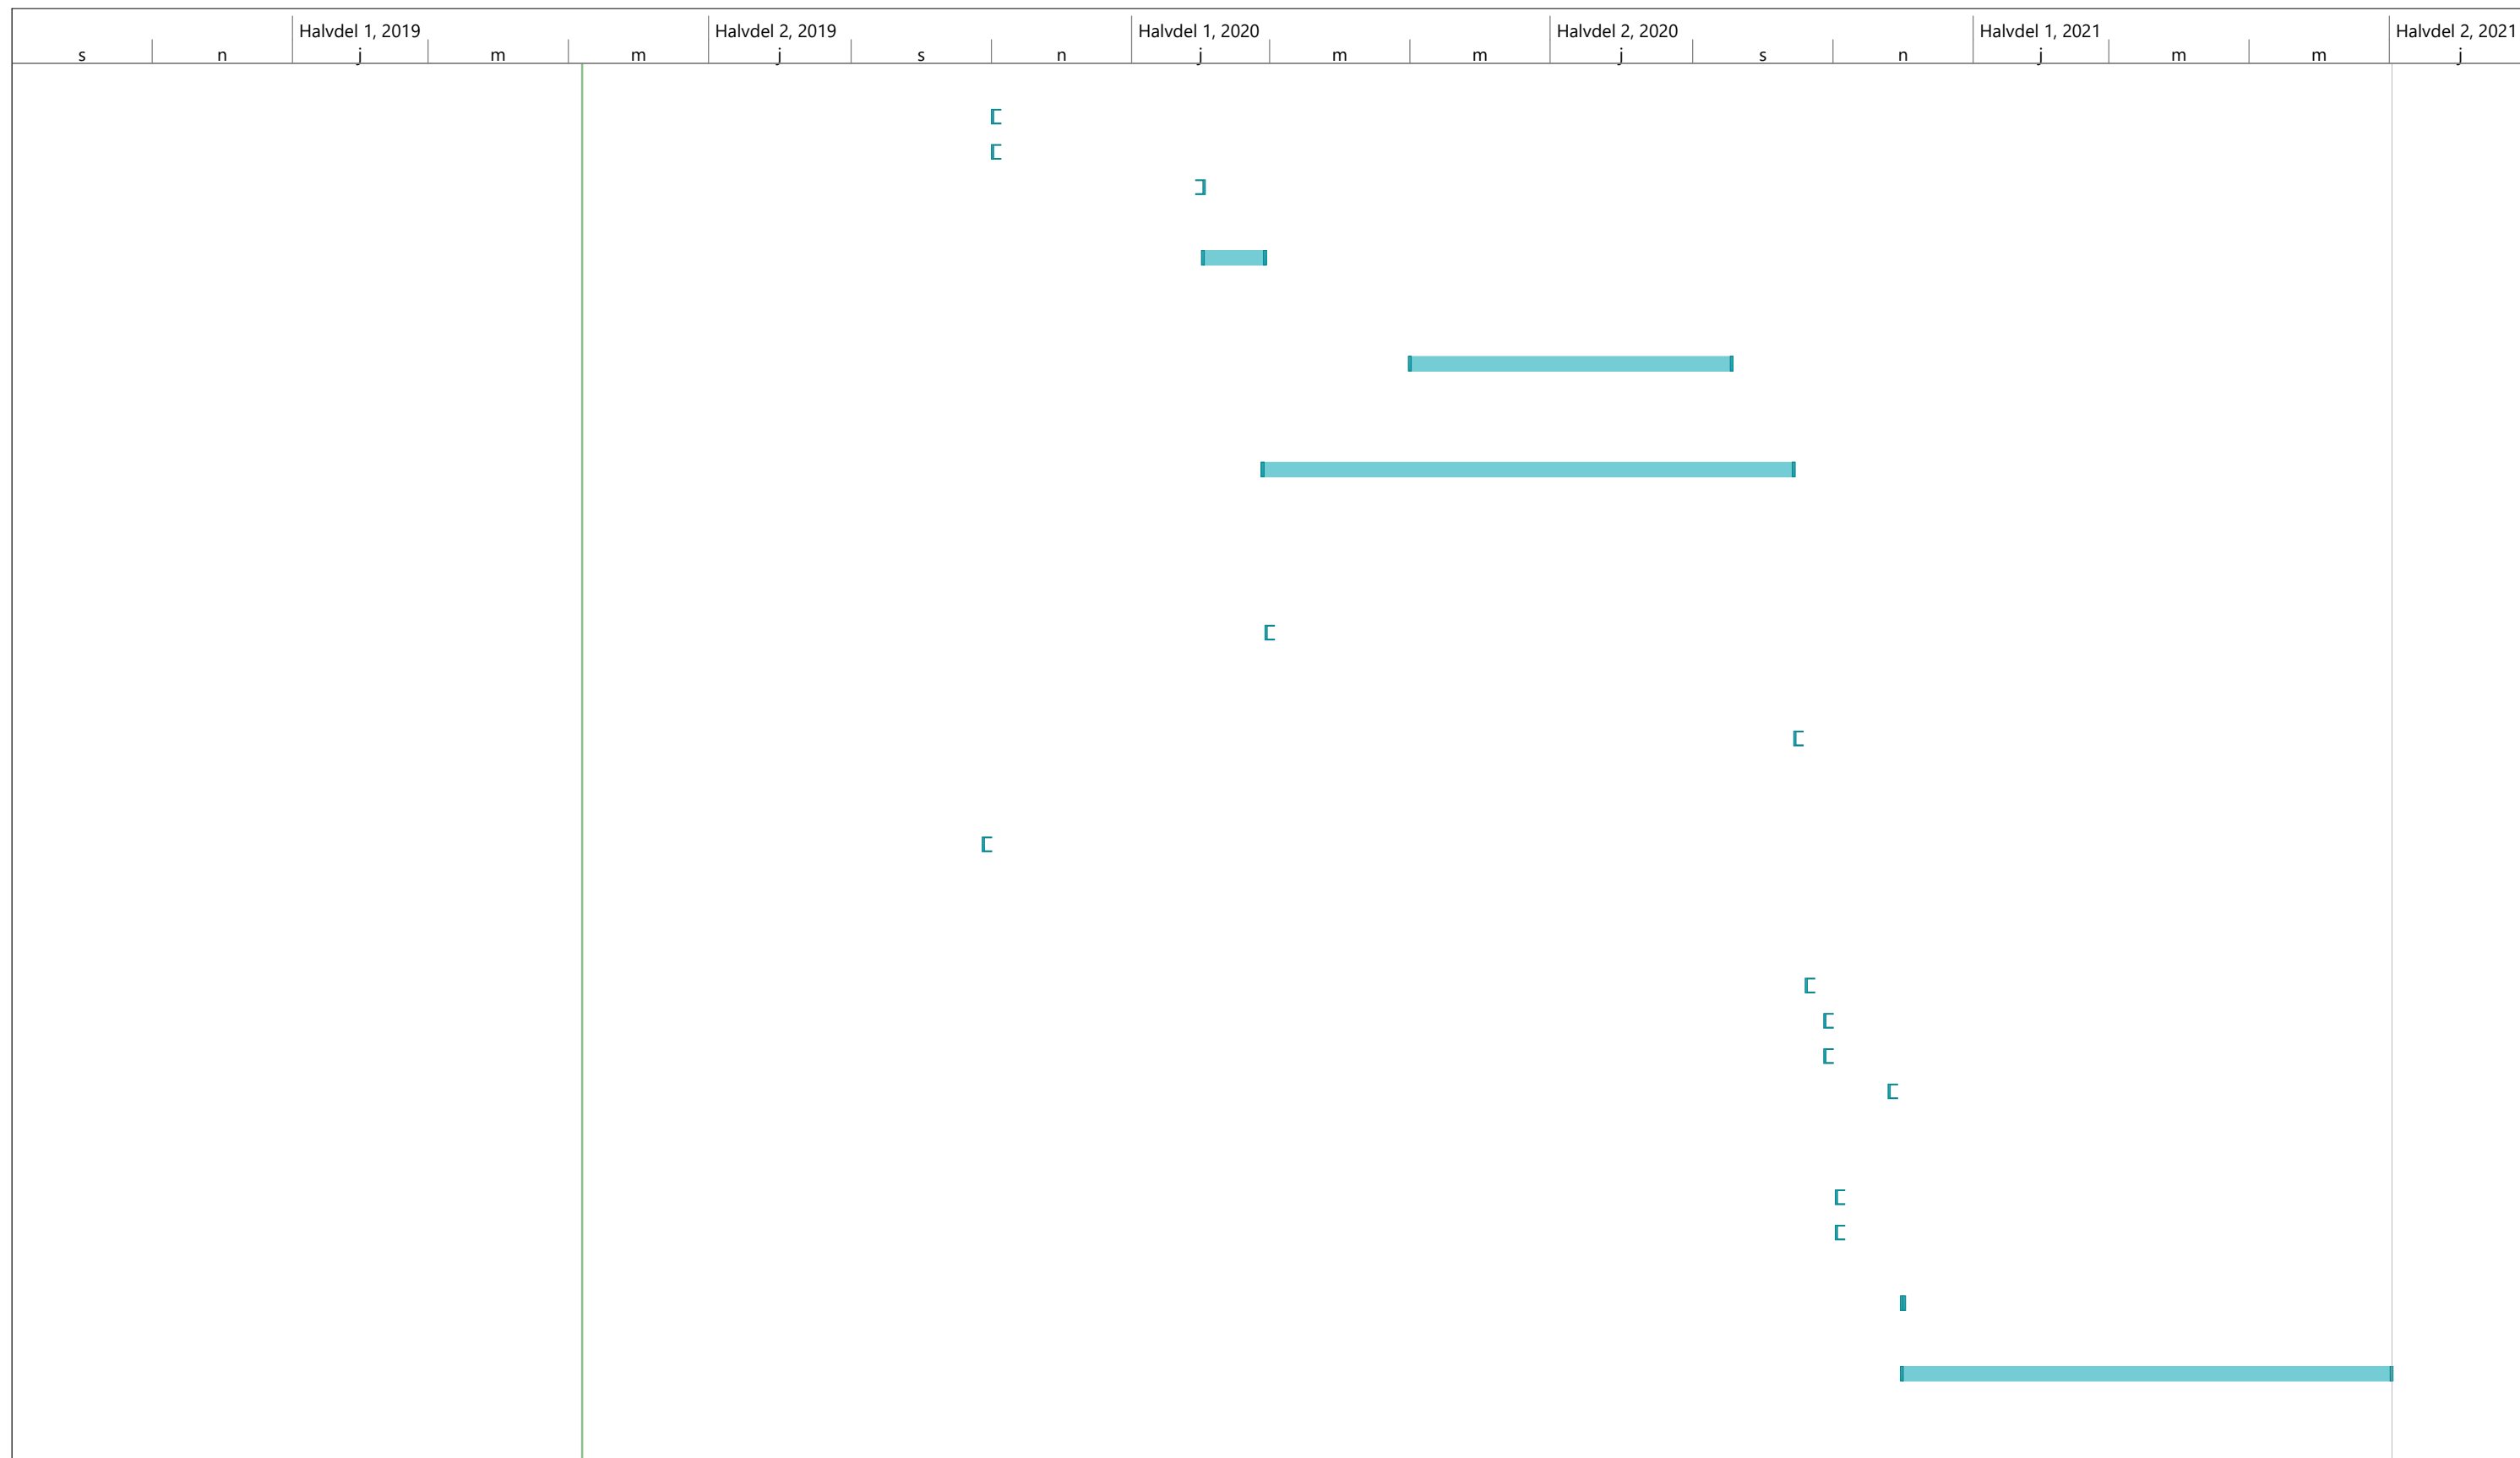

Prosjekt: FREMDRIFTSPLAN GR  
 Dato: ti 07.05.19

|                    |  |                     |  |                               |  |                   |  |
|--------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| Aktivitet          |  | Inaktiv aktivitet   |  | Manuell sammendragsfremheving |  | Ekstern milepæl   |  |
| Deling             |  | Inaktiv milepæl     |  | Manuelt sammendrag            |  | Tidsfrist         |  |
| Milepæl            |  | Inaktivt sammendrag |  | Bare start                    |  | Fremdrift         |  |
| Sammendrag         |  | Manuell aktivitet   |  | Bare slutt                    |  | Manuell fremdrift |  |
| Prosjektsammendrag |  | Bare varighet       |  | Eksterne aktiviteter          |  |                   |  |
