



13/9-2017: Arbeid med demontering av skada mur



18/9 All skada mur fjerna – støtter på plass under støypt golv



18/9 – Steinar frå muren



19/9 – Vekkøying av jordmassar



24/9 – Oppattmuring er starta – arbeid med fundament/murfot



2018 – Mars/April – Arbeid med muring godt i gang




10/4-2018



11/4-2018




14/4-2018

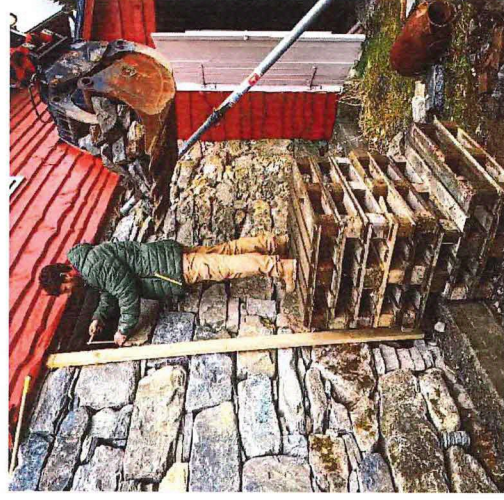

27/4-2018

30/4-2018

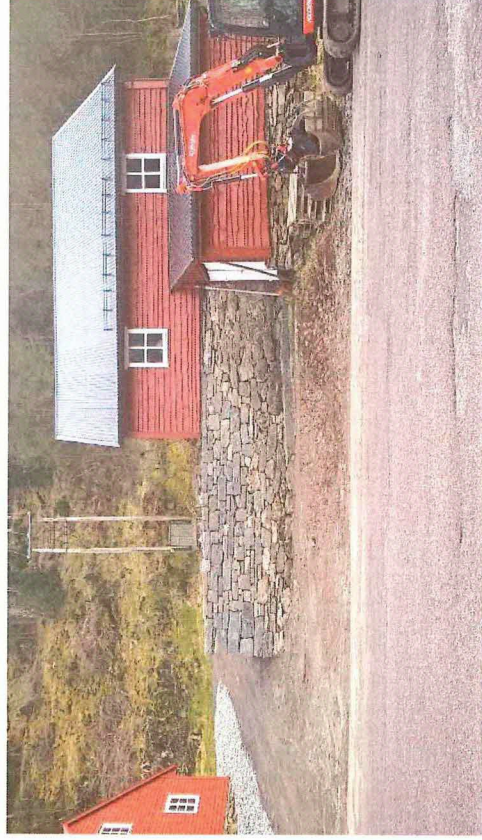

Jord frå løeområdet

I samband med reising av ny støttemur ved løa (i søre enden) grov vi opp ei stor mengd med jord, sterkt iblanda stein. Desse massane vart lagde langs etter vegen (kommunevegen) bortover mot husa, ved den gamle lønnen. Det var så mykje stein i massane at det vart ein fæla jobb å sortera ut steinen og planera ut jorda. Det tok nokre arbeidsdagar. Kristine og Haakon jobba med dette og Rodas var også med på slutten. Vi vart ferdige torsdag 3. mai 2018.

Mesteparten av steinen vart tilbakeført som fylling i bakmuren oppe ved løa.

