

# Massehåndteringsplan Galteråsen



## Innholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| Massehåndteringsplan Galteråsen .....                   | 1 |
| 1. Innledning .....                                     | 3 |
| Vurderinger som er gjort i planarbeidet omfatter: ..... | 3 |
| 2. Masseoversikt.....                                   | 3 |
| 3. Massedisponering .....                               | 4 |
| 4. Arealbehov .....                                     | 5 |
| 5. Konsekvenser for klima, økonomi og ressurser.....    | 5 |
| 6. Forurensning og naturmangfold.....                   | 5 |
| 7. Plangrep og krav for å redusere konsekvensene .....  | 6 |

## 1. Innledning

Massehandtering har blitt vurdert ifbm Reguleringsplanarbeidet. Ved opparbeidelse av arealene som inngår i reguleringsplanen, vil masser bli behandlet og disponert. Dette danner grunnlag for denne planen.

**Vurderinger som er gjort i planarbeidet omfatter:**

Mengde

Kvalitet

Massedisponering av de ulike massene, inkl tidspunkt

Behov for areal til håndtering, lagring og disponering

Konsekvenser for klima

Forurensing og naturmangfold

Plangrep og krav for å redusere konsekvensene

## 2. Masseoversikt

Det er utført mengdeberegninger i Gemini Terreng. Det er utført bonitering i felt for å avdekke mengde jord og løsmasser over fjell. Det er lagt opp til massebalanse for planområdet.

Planområdet er på totalt ca. 124 daa.

Av dette planlegges det ca. 92 daa masseutskifting til bæredyktige masser for areal til Næring og infrastruktur.

Masser fra dette arealet:

-Vekstjord og løsmasser: Ca. 50 000m<sup>3</sup>

-Sprengstein: Ca. 214 000 pfm<sup>3</sup>

Vekstjord og løsmasser har kvaliteter som egner seg til gjenbruk som overflatedyrket mark og til plantefelt. Dette planlegges det for, ref. Planskildring.

Sprengsteinsmasser vurderes til å ha god kvalitet, som vil benyttes som bæredyktige masser for opparbeiding av næringsareal.

### 3. Massedisponering

For å begrense belastning på omgivelsene, planlegges det kort utførelsesperiode for masseflyttfasen.

Det planlegges med utførelsesfase i 6 mnd for VVA-arbeidene for næringsområdet.

Faseplan:

1. Vegetasjonsrydding og graving til bæredyktige masser, inkl transport til permanent benyttelse
2. Sprengning
3. Masseflytt sprengstein
4. VVA-arbeider hovedinfrastruktur
5. Planering
6. Sikringsarbeider
7. Arrondering og tilstelning

| Faseplan Gøtteløsen  | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21 | Uke 22 | Uke 23 | Uke 24 | Uke 25 | Uke 26 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1) Vegetasjonsrydding og graving til bæredyktige masser, inkl transport til permanent benyttelse |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2) Sprengning  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3) Masseflytt Sprengstein  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4) VVA-arbeider hovedinfrastruktur   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5) Planering   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6) Sikringsarbeider  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7) Arrondering og tilstelning  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Det er avsatt areal i L1 til gjenbruk av vekstjord og løsmasser, ref. Planskildring og CO2 regnskap. Her vil ca. 25 000m<sup>3</sup> av disse massene benyttes. Disse massene vil flyttes til permanent lokasjon i fase 1.

Ca. 20 000m<sup>3</sup> av vekstjord og løsmasser er tenkt gjenbrukt til overflatedyrket areal på nærliggende eiendom, Gbnr 139/19, 600-700m fra planområdet. Disse massene vil flyttes til permanent lokasjon i fase 1.

Resterende ca. 5000m<sup>3</sup> planlegges benyttet til tilstelning av skrånninger og vegetasjonsskjermer. Massene vil bearbeides ved behov for gjenbruk til plantefelt. Disse massene vil mellomlagres på området til tidspunkt for benyttelse, fra fase 1 til fase 7. Arealbehov: Ca. 2 daa.

Sprengsteinsmasser vil benyttes som følger:

Totalt 214 000 pfm<sup>3</sup> utsprengt berg:

-164 000 pfm<sup>3</sup> bæredyktige fyllmasser. Disse massene vil flyttes til permanent lokasjon i fase 3.

-50 000 pfm<sup>3</sup> til prosessering av masser for benyttelse på prosjektet som singel, grus og pukk. Disse massene vil mellomlagres på området til tidspunkt for bearbeiding og benyttelse fra fase 3 til 4 og 5. Da unngår en belastende massetransport utenfor anleggsområdet. Massene vil mellomlagres på området. Arealbehov: Ca. 10 daa.

Gravemasser fra Fase 4 vil mellomlagres langs grøft for senere gjenfylling.

Evt. Overskuddsmasser vil benyttes til andre prosjekter i regionen. Det vurderes at dette er av et så begrenset omfang, at prosjekter i regionen vil ha kapasitet til å ta imot eventuelt masseoverskudd fra Galteråsen. Evt. behov for dette vil avdekkes i fase 3, og en har da 10 uker på å finne optimale prosjekter for benyttelse av overskuddsmassene.


For dokumentasjon masser se Volumberegning som vedlegg til Reguleringsplan.

#### 4. Arealbehov

Det legges opp til 6 mnd. Effektiv gjennomføring av grunnarbeidet for næringsområdet for å begrense negativ belastning for nærområdet. Arealbehovet for denne fasen vil være Næringsarealet og deler av L1.

#### 5. Konsekvenser for klima, økonomi og ressurser

Massehåndteringen for Galteråsen er i tråd med avfallspyramiden hvor masser er redusert til et minimum (massebalanse) og gjenbruk av alle massene. Massene gjenbrukes til gode formål på anleggsområdet eller i umiddelbar nærhet til. Det planlegges ingen deponering av masser.

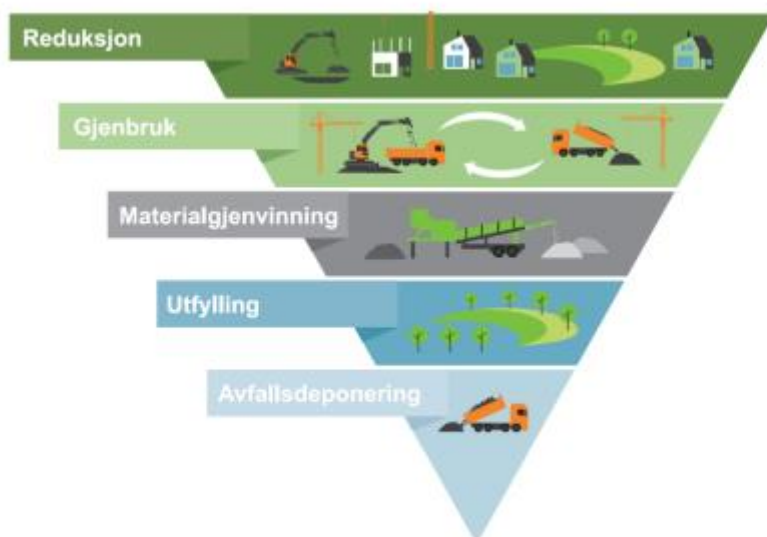

Se ellers planskildring for utfyllende vurdering rundt konsekvenser av massehåndtering.

#### 6. Forurensning og naturmangfold

Se planskildring og KU. Forurensning skal ikke forekomme, og naturmangfold skal ivaretas så langt som mulig.

7. Plangrep og krav for å redusere konsekvensene

Se Faseplan for rekkefølge av massehåndtering.

Uttaksgrenser er ihht plankart. L1 skal kun benyttes for omplassering av masser og for tilkomst til permanent lokasjon for gjenbruk av massene.

Det vil utføres mottakskontroll av stedlige masser for å avdekke evt. forurensning.

Tilkomst for massetransport blir i all hovedsak innenfor planområdet. Tilkomst til Gbnr 139/19 blir via eksisterende veinett. Transportavstand ca. 600-700m.

Massehåndtering vil utføres med effektiv drift for å unngå langvarig anleggsperiode. Driftstider vil være innenfor til enhver tids gjeldende lover og regler.

Det vil etableres et riggområde på anleggsområdet hvor drivstoffylling vil utføres. Tiltak for å hindre avrenning/forurensning vil implementeres. Det vil utarbeides en HMS- og Miljøplan til anleggsfasen.

| Faseplan Galteråsen   | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21 | Uke 22 | Uke 23 | Uke 24 | Uke 25 | Uke 26 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 Vegetasjonsrydding og graving til bæredyktige masser, inkl transport til permanent benyttelse |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Sprengning  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Masseflytt Sprengstein  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 VVA-arbeider hovedinfrastruktur   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Planering   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Sikringsarbeider  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Arrondering og tilstelning  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Utarbeidet av Forslagsstiller ved Romarheim AS 28.02.2023, T. Andås
