



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9333-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres: Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	12 november 2019	Til dato:	31 desember 2019	Fra kl.:	06:00 Til kl.:
				19:00	
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon: 95 845 124		Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90
Trafikkvakter			Manuell dirigering.....		
			Vegstengning.....		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.11.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... Navnet på selskapet SVV v/ Bjørn Trygve Andersen - tlf. 95088630
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften Entreprenør/byggeleder Veidekke Industri AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift Navn på ansvarlig Veidekke Industri AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Andreas Nordstrønen Tlf./e-post: Andreas.Nordstronen@veidekke.no
 Stedsansvarlig(e): Erik Haukås Tlf./e-post: erik.haukas@veidekke.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... Angi hvilke(t): Skyss / Vy
 Radio, presse m.m..... Angi hvem:
 Andre..... Angi hvem:
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Alternativ GS-veg : Burkhovdane. Skal skiltes.
 Bruk trafikkvakter etter behov. NB: Skoler i området.
 Arbeid som medfører manuell dirigering på Fv 57 skal utføres som nattarbeid.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen 11.11.2019

Arve Løtveit

Sted Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9333-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Utførende av arb. varsling*:	Veidekke Industri AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen			Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no
Stedsansvarlig(e):	Erik Haukås			Tlf./e-post:	erik.haukas@veidekke.no
Arbeidet utføres	fra dato:	12 november	2019	Til dato:	31 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: **Ant.:**

Godkj sikr v/behov

Merknader:


Svært høy ÅDT 14000-15500
Fartsgrense 50 km/t

Ifm rep av betongkant på busslomme benyttes tett med 906 mot vegbane. Ved manuelt arbeid mot trafikk skal godkj sikr benyttes et behov.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:

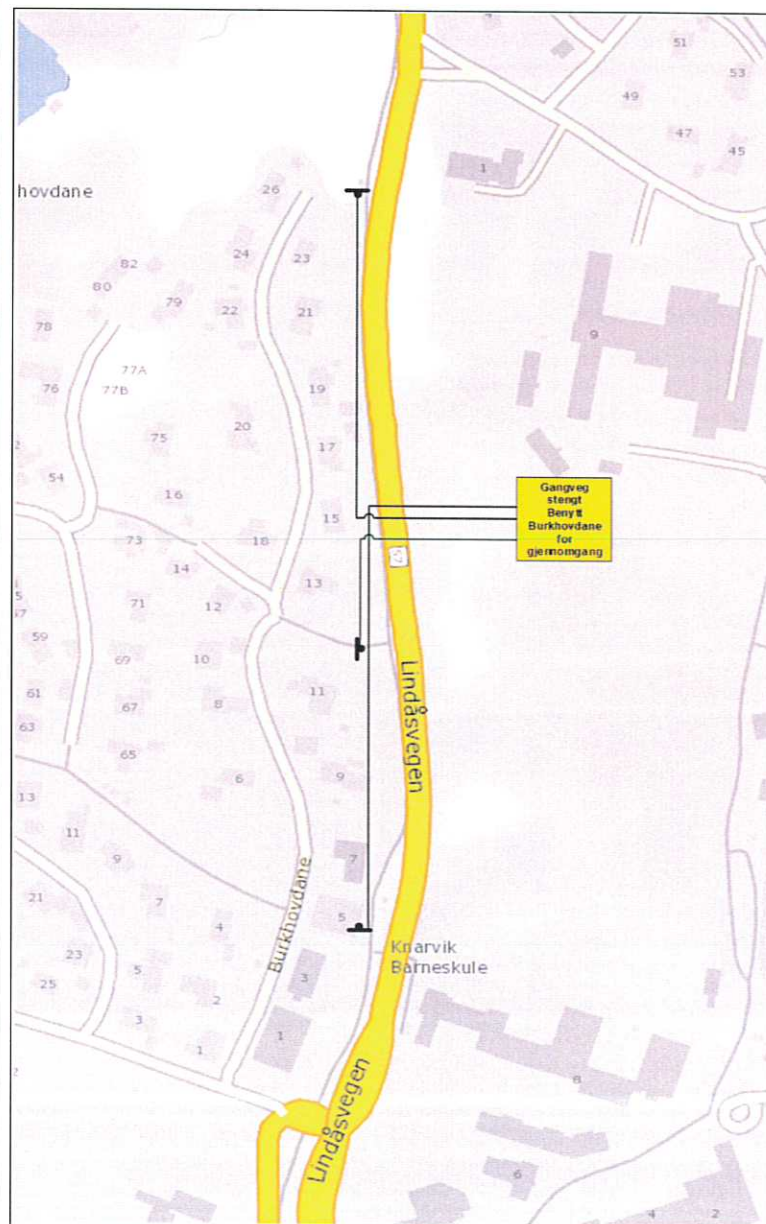

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

11.11.2019

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9333-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Utførende av arb. varsling*:	Veidekke Industri AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen			Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no
Stedsansvarlig(e):	Erik Haukås			Tlf./e-post:	erik.haukas@veidekke.no
Arbeidet utføres	fra dato:	12 november	2019	Til dato:	31 desember 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2+
	808.712	2+
	149	e.behov
	560	2 stk
	906	et behov

Skisse:

Blank area for drawing/skisse.

Merknader:

Svært høy ÅDT 14000-15500
Fartsgrense 50 km/t

Bruk trafikkvakter ved behov.

Undergang under Fv 57 : Bruk trafikkvakter.

Arbeid som medfører lossing fra Fv skal utføres som nattarbeid med manusll dirigering.

Skilte alt GS-veg via Burkhovdane.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

11.11.2019

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9333-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen		Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no	
Utførende arb.v.*:	Veidekke Industri AS			Adresse:	0

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	12 november 2019	Til dato: 31 desember 2019
		1-2 skift dagtid 0600-1900

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Høy ADT 14000 - 15500

Nærhet til Barneskole (Knarvik Barneskole)

Dekkelegging i undergang som benyttes av skolebarn

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

- Skolebarn i anleggsområdet
- Myke trafikanter i asfaltlim/nylagt asfalt
- Påkjørsel av arbeidere ved utsetting/innhenting av skilt.
- Påkjørsel av hovedentreprenørs arbeidere og/eller maskiner
- Biler/Vogntog med høy hastighet inn mot skiltområdet
-
-
-
-
-
-
-

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	3	6
1	2	2
3	1	3
2	1	2
2	2	4
		0
		0
		0
		0
		0
		0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Ekstra varsemhet når man leder disse forbi arbeidsområdet. Egne trafikkvakter benyttes
- Myke trafikanter benytter alternativ veg - Burkhovdane - ledes av trafikkvakter - samt stengning av GS
- Skilte opp en side av gangen, benytte minst 1 dirigent som dirigerer trafikk når oppskilting gjennomføres. Gulblink.
- Sikker plassering av arbeidere og maskiner, benytte dirigenter ved opphold i kjørebane
- Benytte skilt 149 som forvarsling dersom det blir køer
-
-
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Andreas Nordstrønen bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9333-2019			
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281			
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen			
Ansvarshavende*:	Andreas Nordstrønen			Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no			
Utførende entreprenør:	Veidekke Industri AS			Adresse:				
				(Ev.e-post)				
Utførende arb. varsling*:	Veidekke Industri AS			Adresse:				
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 536 770			(Ev. e-post:)				
Stedsansvarlig(e):	Erik Haukås			Tlf./e-post:	erik.haukas@veidekke.no			
Arbeid som skal utføres*:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	12	november	2019	Til dato:	31	desember	2019	1-2 skift dagtid 0600-1900

Dekkelegging av GS

Riving/fjerning av betongkant på sørgående busslomme og reetablering med glidestøpt betongkant

Nærhet til skole - medfører spesiell varsomhet vedrørende myke trafikanter, da spesielt barn.

Første del av arbeidet har FV 57 ÅDT 15500

Andre del av arbeidet har FV 57 ÅDT 14000

Tilstøtende KV Burkhovdane har ÅDT 200

Tilstøtende FV5454 Hagelia har ÅDT 800

Fartsgrense på stedet 50 km/t

Kontaktperson byggherre hos SVV er Bjørn Trygve Andersen

Kart over arbeidsområde i tilleggsplysninger



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9333-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Asfaltarbeider Opprusting av GS - veg langs FV 57 Knarvik - Isdalstø				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen		Tlf./e-post:	Andreas.Nordstronen@veidekke.no	
Utførende av arbeidsvarsling:	Veidekke Industri AS		Adresse:	0	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	12 november	2019	Til dato:	31 desember	2019

Del 2: FG057 hp 201 m982 - m1355



Del 3 Start

Del 2 Slutt

Rød strek:

- Nytt slitelag oppå eksisterende asfaltdekke
- Asfaltere arealet mellom fv57 og GS-veg (under rekkverk) m982 - m1268
- Brøytevennlig» avslutning/nednulling av slitelaget langs avkjørsel inn mot Burkhovdane (m1065)
- Fresekant langs gangveg ned fra busslomme (m1290)
- Fjerne og resette taktile-heller ved busslomme/gangfelt (m1335)
- Kum - nordenden av busslommen (m1355)
- Riving/fjerning av betongkant på sørgående busslomme og reetablering med glidestøpt betongkant
- Nytt slitelag på fortau på busslomme (sørgående)



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9333-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9333-2019
Veg nr.:	FG 057	fra Hp/km:	201 / 0,982	til Hp/km:	201 / 1,281
Strekning:	Knarvik - Isdalstø - Lindås kommune			Sted:	Lindåsvegen
Utførende:	Veidekke Industri AS				
Ansvarshavende:	Andreas Nordstrønen				
Stedsansvarlig:	Erik Haukås				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

