

## Varemottak

Mottak av varer på anleggsplass

**Hovedløpenr.:**  
47-1097-001043

**Dok.nr.:**  
Varemottak-1

**Løpenr:** 5

### PROSJEKT

21033 Nordhordaland Næringspark  
VA

### UNDERPROSJEKT

21033 Nordhordaland Næringspark  
VA

### Emne

V1

### Dato for mottak

03.01.2022 10.45

### Leverandør:

NOBI

### Kva varer er levert? Ta foto

V1



### Er varene levert ihht pakkseddel?

- Ok
- Avvik
- Ikkje aktuelt



### Er leveransen levert til avtalt tid?

- Ok
- Avvik
- Ikkje aktuelt
-  Henta med eigen kranbil på NOBI Voss

### Er merking og identifikasjon i orden?

- Ok
- Avvik
- Ikkje aktuelt




### Er emballasjen heil? (Ta bilde)

- Ok
- Avvik
- Ikkje aktuelt



### Er det synlege skadar/feil/manglar? (Ta bilde)


- Ok
- Avvik
- Ikkje aktuelt
-  Ingen skader

### Er det synlege skadar/feil/manglar? (Ta bilde)

- Ok
- Avvik
- Ikkje aktuelt



# Mottakar av varer



16.03.2022

Mari Røen

Innsendt av **Mari Røen / 16.03.2022**

OPPRETTET AV:  
MARI RØEN


GODKJENT DATO:  
09.12.2021

GODKJENT AV:  
MARI RØEN

VERSJONSNR.:  
1

## VEDLEGG (1 stk.)

1 - Kva varer er levert? Ta foto

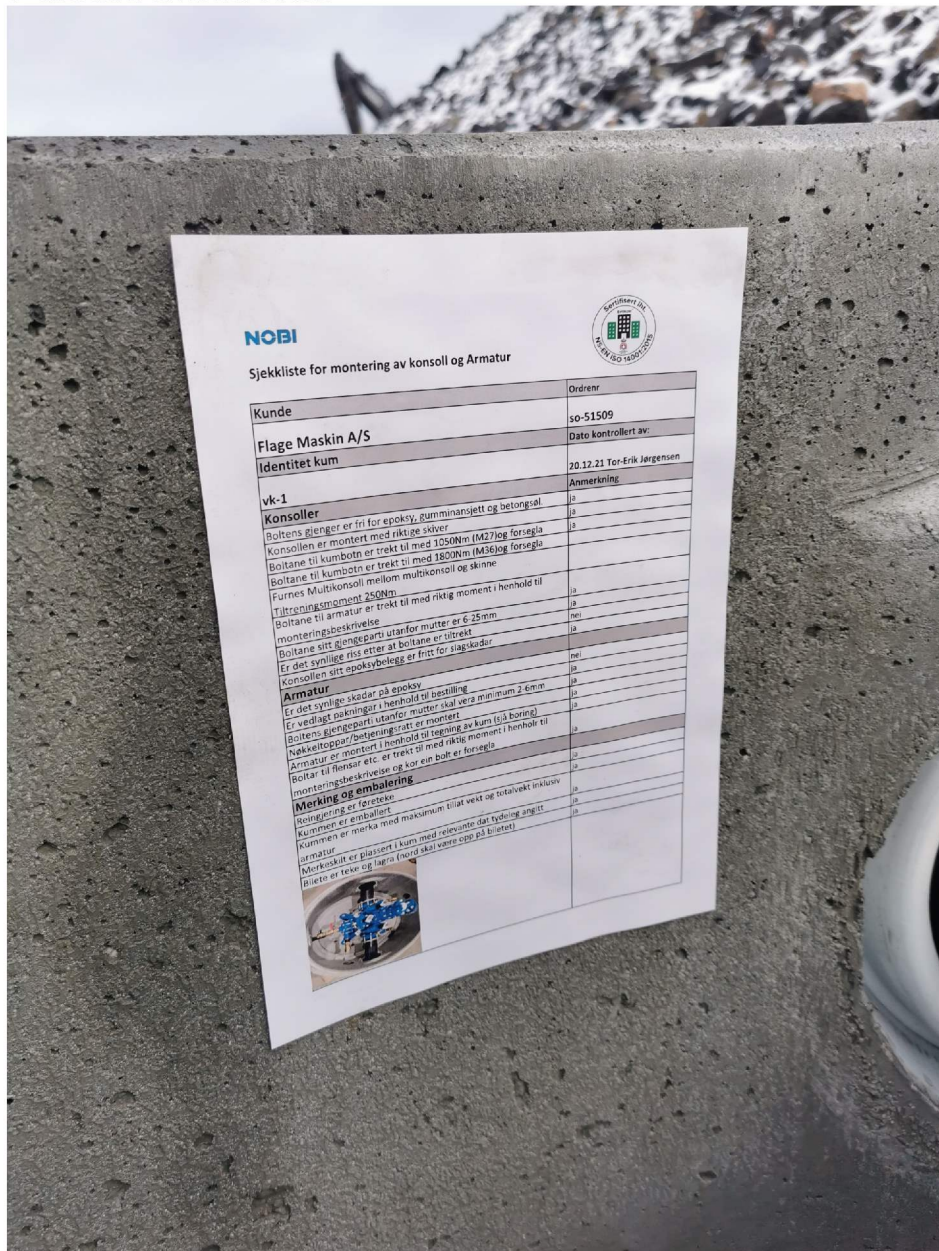

**NOBI**

Sjekkliste for montering av konsoll og Armatur

Kunde	Ordrenr
Flage Maskin A/S	so-51509
Identitet kum	Dato kontrollert av:
	20.12.21 Ter-Erik Jørgensen
vk-1	Anmerkning:
<b>Konsoller</b>	
Boltene glienger er fri for epoksy, gumminansjett og betongslut	ja
Boltene er montert med riktige skiver	ja
Konsollen er trukket til med 1050Nm (M27) og forsegl	ja
Boltene til kumboten er trukket til med 1820Nm (M36) og forsegl	ja
Boltene til kumboten er trukket til med 1820Nm (M36) og forsegl	ja
Furnes Multikonsoll mellom multikonsoll og skinne	
Tilføringsmoment 250Nm	ja
Boltene til armatur er trukket til med riktig moment i henhold til monteringsbeskrivelse	ja
Boltene sitt gliengeparti utadfor mutter er 6-25mm	nei
Boltene sitt gliengeparti utadfor mutter er 6-25mm	ja
Er det synlige riss etter at boltene er uttrekt	nei
Er det synlige riss etter at boltene er uttrekt	nei
Konsollen sitt epoksybelegg er frit for sagskader	nei
<b>Armatur</b>	
Er det synlige skadar på epoksy	ja
Er vedlagt pakningar i henhold til bestilling	ja
Er vedlagt pakningar i henhold til bestilling	ja
Er vedlagt pakningar i henhold til bestilling	ja
Boltene gliengeparti utadfor mutter skal vera minimum 2-6mm	ja
Nokveltepartar/betongslutt er montert	ja
Armatur er montert i henhold til tapping av kum (i.e. boring)	ja
Boltar til flønar etc. er trukket til med riktig moment i henhold til monteringsbeskrivelse og kor ein bolt er forsegl	ja
<b>Merkning og emballering</b>	
Reingjering er foretatt	ja
Kummen er emballert	ja
Kummen er merka med maksimum tillat vekt og totalvekt inkludert armatur	ja
Merkingsnett er plassert i kum med relevante dat tyding angitt	ja
Plakert er ferdig og lagra i kum (i.e. i kum)	ja

## Dokumenthistorikk:

16.03.2022 13.08

Mari Røen lagret skjema permanent
