




Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Skageneset - fleirbruksfale	Anleggsnr. 1260003003
Anleggseier:	Radøy kommune	Kommune: Radøy
Regnskapet er	<input type="radio"/> Delregnskap <input checked="" type="radio"/> Sluttregnskap	for perioden 01.01.2017 til 30.06.2018
Bergen	12.07.2018	
Sted	Dato	Underskrift anleggseier
Anlegget er fullført i samsvar med planen	21/10-18	
Sted	Dato	Stempel og underskrift Kommune
Regnskapet er kontrollert. Revisorattest er vedlagt.	12/11.18	
Sted	Dato	Stempel og underskrift revisor Harald Sylta tatsautorisert revisor

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Regnskap
Tilskudd av spillemidlene (utbetalt)	300 000	
Egenkapital	300 000	300 040
Kommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Private tilskudd, kontanter		
Andre tilskudd		
Lån		
Sum kontantinntekter	600 000	300 040
Gaver, rabatter		
Dugnad		
Sum samlet finansiering i søknaden	600 000	
Ikke utbetalte spillemidler		300 000
Andre utestående fordringer		
Sum samlet finansiering i regnskapet		600 040

Kulturdepartement
Idrettsavdelingen
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 80 64
Telefaks 22 24 95 52
postmottak@kud.dep.no



Utgifter

Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som postene i det godkjente budsjettet.
 Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn.

Hovedpost	Budsjett i søknad				Regnskap				
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester	3) Verdi av dugnad, gaver og rabatter	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabatter	Sum totalverdi
Tilskuddsberettigede utgifter									
1 Fleirbruksflate	175 000			175 000	175 000		176 000		175 000
2 Omlegging/utbedring sti	270 000			270 000	270 000		270 000		270 000
3 Skog- og vegetasjonsrensk	125 000			125 000	122 400		122 400		122 400
4 Administrasjon og rigg	30 000			30 000	33 000		33 000		33 000
5				0			0		0
6				0			0		0
7				0			0		0
8				0			0		0
9				0			0		0
10				0			0		0
11				0			0		0
12				0			0		0
13				0			0		0
14				0			0		0
15				0			0		0
16				0			0		0
17				0			0		0
18				0			0		0
19				0			0		0
20				0			0		0
21				0			0		0
22				0			0		0
23				0			0		0
24				0			0		0
25				0			0		0
26				0			0		0
27				0			0		0
28				0			0		0
29				0			0		0
30				0			0		0
Sum	600 000	0	0	600 000	600 400	0	600 400	0	600 400
Ikke tilskuddsberettigede utgifter									
1				-			-		-
2				-			-		-
3				-			-		-
4				-			-		-
5				-			-		-
6				-			-		-
7				-			-		-
8				-			-		-
9				-			-		-
10				-			-		-
11				-			-		-
12				-			-		-
13				-			-		-
14				-			-		-
15				-			-		-
Sum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlede utgifter				600 000			600 400		600 400

Felter som skal fylles ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	
Fradragsberettiget mva.*	
Søknadsberettiget mva.*	0

*Betalt mva. for tilskuddsberettigede utgifter

*Fradragsberettiget mva. er inngående mva. som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registeret

*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for



KPMG AS
Postboks 4 Kristianborg
Kanalveien 11
N-5822 Bergen

Telephone +47 04063
Fax +47 55 32 71 20
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Hordaland Fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

REGNSKAP FOR SKAGENESET FLEIRBRUKSFLATE – ANLEGGSNR 1260003003 RADØY KOMMUNE – REVISORS UTTALELSE

Vi har på grunnlag av Kulturdepartementets bestemmelser, "Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" gjennomført de kontrollhandlinger som er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å kunne bistå fylkeskommunen i vurderingen av om tilskuddet er brukt samsvar med retningslinjene.

Totalsum for prosjektet er på kr 600 400 ekskl. mva.

Vi har kontrollert at:

1. Det er et eget anleggsregnskap, som enkelt kan skilles fra organisasjonens øvrige regnskapsposter
2. Kostnadene angår anlegget, og at bare kostnader til tilskuddsberettigede elementer inngår som del av anleggets tilskuddsberettigede kostnad
3. Bankkonto som er benyttet er registrert på tilskuddsmottaker
4. Verdien av dugnad ikke er satt høyere enn i godkjent kostnadsoverslag
5. Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som i søknaden var oppført som dugnad, er verdien av dugnad nedjustert med tilsvarende beløp
6. Oppgitte beløp for merverdiavgift tilsvarer faktisk betalt merverdiavgift

Vi rapporterer våre funn nedenfor:


- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er utarbeidet eget anleggsregnskap klart atskilt fra organisasjonens øvrige regnskapsposter
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi ikke avdekket inntekter eller utgifter som ikke vedrører anlegget eller som ikke er tilskuddsberettigede.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at bankkonto er registrert på tilskuddsmottaker
- d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at det ikke er benyttet dugnad
- e) Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at det ikke var oppført dugnad i søknaden
- f) Med hensyn til punkt 6 er det ikke oppgitt noe beløp for betalt merverdiavgift.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er kun ment å skulle distribueres til Hordaland fylkeskommune og anleggseier.

12.11.2018
KPMG AS




Harald Sylta
Statsautorisert revisor

Bergen og Omland Friluftsråd

Spillemidler

Anleggsnr.: 1260003003 Skageneset - fleirbruksflate



Skageneset friluftsområde, Radøy

Sluttrapport for utført arbeid.

	Materiell	Sum	Arbeid	Sum	TOTALSUM
Fleirbruksflate			Entreprise Os Kaiservice AS - se budsjett totalanbud: Os Kaiservice AS - budsjettert: utvendig arbeid 597000,-, rigg og drift 380000,-	175 000	175 000
Omgjgning/utbetring av stigar			Os Kaiservice AS - budsjettert: utvendig arbeid 597000,-, rigg og drift 380000,-	270 000	270 000
Skog- og vegetasjonsrensk			Driftsmannskap 136 à 400,-	54 400	122 400
			Traktor, maskiner 136 à 500,-	68 000	
Administrasjon og rigg			Transport 16 t à 500,-	8 000	33 000
	Aregatleie, brakke, drivstoff, verkøy, e	15 000	Administrasjon 20 t à 500,-	10 000	
		15 000	TOTALSUM		

Vedlegg: Fotodokumentasjon + timelister.

Dato

Revisor

11.07.2018. L. Torgilstveit



Bergen Og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45 Åge Landro
5039 BERGEN

18.05.2017

Deres ref.:

Saksbehandler:
Björg Larsen

Søknadsnr: 16/02358
Arkiv nr: 2016/57-18

**FORDELING AV MIDLAR TIL IDRETTSANLEGG 2017 - TILSEGN OM ORDINÆRE
MIDLER TIL ANLEGGSNR 1260 0030 03 SKAGENESET - FLEIRBRUKSFLATE -
RADØY KOMMUNE.**

Vi viser til søknad om tilskot til nemnde anlegg.

Ved fordeling av spelemidler vart søknaden imøtekomen med eit tilskot på
kr 300 000.

Generelle retningslinjer for utbetaling av løyvd tilskot:

1. Det kan søkjast om delutbetaling når anleggsarbeida er kome godt i gang. Søknad om delutbetaling må innehalde eit delrekneskap og ein statusrapport med kommunal stadfesting på framdrifta av anlegget.
2. Løyvd tilskot skal i hovudsak nyttast i tildelingsåret. Tilskot som ikkje vert teke ut innan 2 år etter at tilsegn er gjeve, det vil seie datoen på tilsegnsbrevet, vert inndrege.
3. Sluttutbetaling vert ikkje gjort før kontrollert rekneskap er sendt inn saman med kommunal stadfesting på at anlegget er fullført i samsvar med godkjende planar. Kommunerevisor må kontrollere rekneskap ved tilsegn om tilskot over kr 100 000,-. For kart skal i tillegg eit eksemplar av kartet leggst ved.
4. Alle utbetalingar skjer via den kommunen der anlegget er fysisk plassert.
5. Dersom det gjeld fornying av søknad, skal denne leverast på elektronisk skjema. Orientering om byggearbeidet og førebels rekneskapsoversikt skal leggst med, sjå V-0732. Dersom anlegget er ferdigstilt, skal kontrollert rekneskap leggst ved søknaden.

Vidare viser vi til føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732.



HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Klagerett:

Forvaltningslova gjev søkjarar som har fått avslag på søknad om tilskot frå spelemidlane rett til å klage over det vedtaket som er gjort, sjå Forvaltningslova § 27 tredje ledd og § 28 andre ledd, samt kapittel 7 i føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, V-0732. Klagefristen er 3 veker frå den dagen dette brevet er motteke. Dersom fylkeskommunen ikkje endrar vedtaket som følgje av klaga, skal saka sendast Kulturdepartementet for endeleg avgjerd.

Klageskjema finn ein på sida <http://www.signform.no/dss/>

Med helsing

Per Morten Ekerhovd
Konst. fylkesdirektør kultur og idrett

Britt Karen Spjeld
Fylkesidrettssjef

Kopi: Radøy kommune

Postadr.: Postboks 7900, 5020 BERGEN

Tlf.: +47 55239000

Faks: +47 55239949


Besøksadr.: Agnes Mowinckels gate 5

E-post: hfk@post.hfk.no

FOTODOKUMENTASJON – OPPARBEIDING AV FLERBRUKSFLATE I SKAGENESET FRILUFTSOMRÅDE, RADØY KOMMUNE



Bilde 1: Ferdig opparbeidet flerbruksflate i Skageneset friluftsområde.

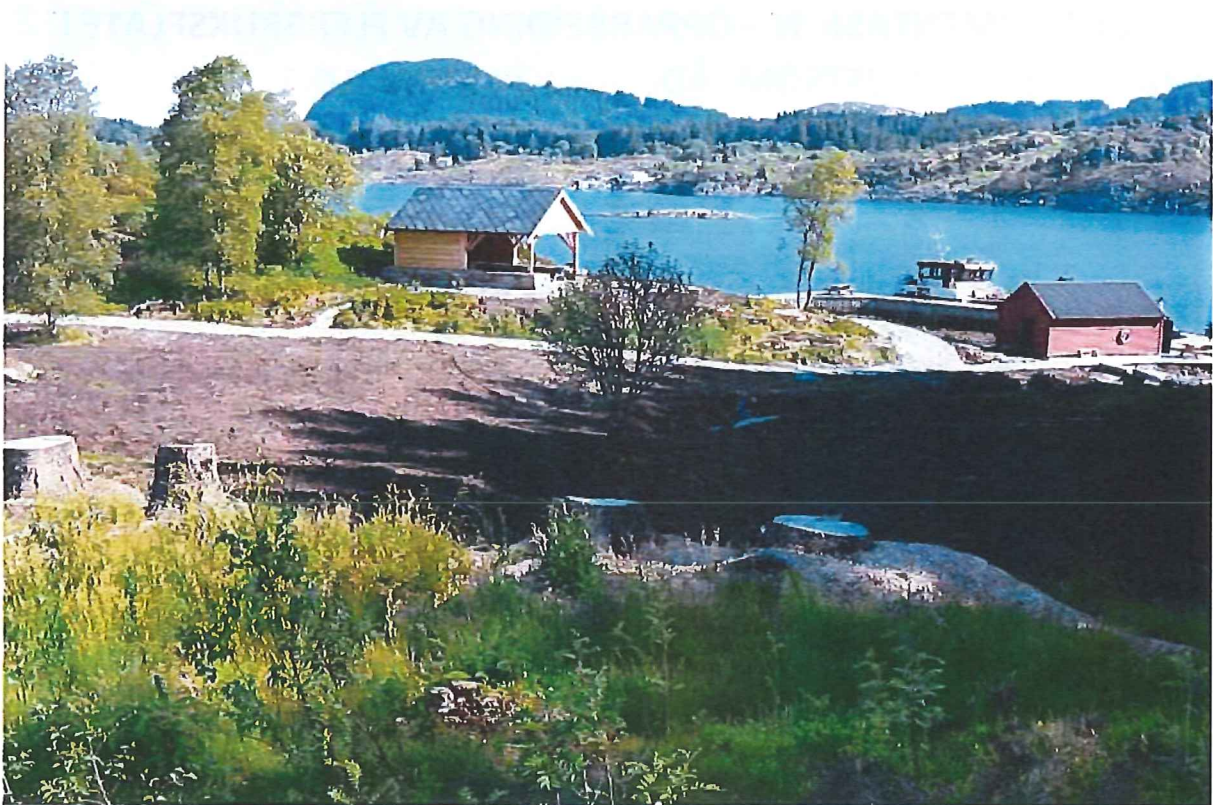

Bilde 2: Området er åpnet opp og skog er fjernet.



Bilde 3: Rydding av skog (store sitkagraner).



Bilde 4: Oppflising av skog.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)

Spillemidler Anleggsnr.: 1260003003

Skaganeset friluftsområde, Radøy: Timeregistrering driftsavdeling BOF (2016, 2017)

2016

RADØY

550	Byngja	47
551	Skaganeset	382
552	Toska	0
553	Uttoska	0
554	Trettholmen	0
555	Solheimsvika	22
*598	Nesvatnet/Klesvika, Mar	27
*599	Snekkevika	0
	Sum Radøy	478

RADØY

550	Byngja	56
551	Skaganeset	242
552	Toska	44
553	Uttoska	12
554	Trettholmen	0
555	Solheimsvika	47
*598	Nesvatnet/Klesvika, Mar	2
*599	Snekkevika	0
	Sum Radøy	403

Uke	Arbeid	Tidsbruk (timer)
2016		
50	Skogsrydding	16
50	Rydding skog	32
50	Skogsrydding	32
50	Skog	40
50	Vegetasjonsrensning	24
51	Skogsrydding	16
51	Skog	8
2017		
1	Vegetasjonsrensning	16
1	Transport	16
3	Skogsrydding	16
3	Skogsrydding	16
3	Vegetasjonsrensning	16
3	Flising av skog	24
3	Vegetasjonsrensning	16
		288

Bergen og Omland Friluftsråd.

Økonomioversikt Skageneset

Tekst	Tilbudssum	Fakturert	Tillegg	Fratrekk	Estimert sluttsum
Rigg og drift	kr 380 000	kr 32 500			
Justert rigg og drift.			kr 32 500		
andel oppvarming, drift		kr 22 000	kr 22 000		
SUM	kr 380 000	kr 54 500	kr 54 500		kr 434 500
Grillhuset	kr 296 000				
Oppretting, kledning, etc.		kr 25 613	kr 25 613		
Arbeid, stendere, kledning		kr 44 730	kr 44 730		
SUM	kr 296 000	kr 70 343	kr 70 343	kr -	kr 366 343
Utvendig arbeid	kr 597 000				
Boring og sprengning					
SUM	kr 597 000	kr -	kr -	kr -	kr 597 000
Våningshuset	kr 916 000				
Skifte taket		kr 166 609	kr 166 609		
Ekstra kledning etc.		kr 54 800	kr 54 800		
Oppretting av yttervegger		kr 64 740	kr 64 740		
Oppretting kjøkken,		kr 11 880	kr 11 880		
Nytt gulv		kr 28 850	kr 28 850		
Nye piper		kr 38 100	kr 38 100		
Utgår post 5.4, 5.5 og 6,2				kr 82 000	
SUM	kr 916 000	kr 364 979	kr 364 979	kr 82 000	kr 1 198 979
Restaurere Løen		kr 90 000	kr 90 000		
SUM		kr 90 000	kr 90 000		kr 90 000
Sum ekstra		kr 579 822			kr 2 686 822
Faktura 905 Forfall 21.11		kr 437 800			
Faktura 910 Forfall 7.12		kr 437 800			
Faktura 916 Forfall 28.12		kr 437 800			
Faktura 924. Forfall 5.2		kr 437 800			
Faktura 923. forfall 31.1		kr 289 462			
Faktura 929. forfall 2.3		kr 441 810			
Faktura 964. forfall 25.6		kr 402 077			
K- Design faktura 20076					
Sum 2017		kr 1 313 400			
Sum 2018		kr 1 169 072			
	kr 2 189 000	kr 2 482 472	kr 525 322	kr 82 000	kr 2 768 822

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Faktura
Fakturanummer 905

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 BERGEN



OS KAISERVICE

Kundenr. 10037
Fakturadato 14.11.2017
Leveringsdato 14.11.2017
Deres referanse oddmund
Vår referanse Jarle
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3	Diverse skageneset 1/5 del av avtalt pris	1,00	tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

Forfallsdato 21.11.2017
KID
Fakturanummer 905
Vennligst angi fakturanummer ved betaling
Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	437 800,00
Mva (25 %)	109 450,00
Avrundning	0,00

Å betale **547 250,00**

Adresse
OS Kaiservice AS
Drangneset 41
5215 Lysekloster

Telefon
99700861
91127300

E-post/hjemmeside
jarle@oskai.no
www.oskai.no

Organisasjonsnr.
985 449 538 MVA
Foretaksregisteret

BILAG

Faktura

Fakturanummer 910

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 BERGEN



OS KAISERVICE

Kundenr. 10037
Fakturadato 01.12.2017
Leveringsdato 03.12.2017
Deres referanse oddmund
Vår referanse Jarle
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3	Diverse arbeid Skageneset 2/5 del av avtalt	1,00	tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

Forfallsdato 07.12.2017
KID
Fakturanummer 910
Vennligst angi fakturanummer ved betaling
Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	437 800,00		
Mva (25 %)	109 450,00		
Avrundning	0,00	Å betale	547 250,00

Adresse
OS Kaiservice AS
Drangneset 41
5215 Lysekloster

Telefon
99700861
91127300

E-post/hjemmeside
jarle@oskai.no
www.oskai.no

Organisasjonsnr.
985 449 538 MVA
Foretaksregisteret

Faktura

Fakturanummer 916

Bergen og Omland Friluftsråd
 Hellebakken 45
 5039 BERGEN



OS KAISERVICE

Kundenr. 10037
 Fakturadato 21.12.2017
 Leveringsdato 21.12.2017
 Deres referanse oddmund
 Vår referanse Jarle
 Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
 forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
3	Skagene set etter avtale 3/5 del	1,00	tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

Forfallsdato 28.12.2017
 KID
 Fakturanummer 916
 Vennligst angi fakturanummer ved betaling
 Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	437 800,00		
Mva (25 %)	109 450,00		
Avrunding	0,00	Å betale	547 250,00

Adresse
 OS Kaiservice AS
 Drangneset 41
 5215 Lysekloster

Telefon
 99700861
 91127300

E-post/hjemmeside
 jarle@oskai.no
 www.oskai.no

Organisasjonsnr.
 985 449 538 MVA
 Foretaksregisteret

BILAG

Faktura

Fakturanummer 924

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 BERGEN



OS KAISERVICE

Kundnr. 10037
Fakturadato 28.01.2018
Leveringsdato 28.01.2018
Deres referanse oddmund
Vår referanse Jarle
Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall Enhet	Enhetspris	Sum
3	Våningshus Skageneset 4/5 del	1,00 tim	437 800,00	437 800,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

6460
Omr 551
29/1 01

Forfallsdato 05.02.2018
KID
Fakturanummer 924
Vennligst angi fakturanummer ved betaling
Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	437 800,00	
Mva (25 %)	109 450,00	
Avrunding	0,00	Å betale 547 250,00

Adresse
OS Kaiservice AS
Drangneset 41
5215 Lysekloster

Telefon
99700861
91127300

E-post/hjemmeside
jarle@oskai.no
www.oskai.no

Organisasjonsnr.
985 449 538 MVA
Foretaksregisteret

Faktura

Fakturanummer 964

Bergen og Omland Friluftsråd
 Hellebakken 45
 5039 BERGEN



OS KAISERVICE

Kundenr. 10037
 Fakturadato 20.06.2018
 Leveringsdato 20.06.2018
 Deres referanse oddmund
 Vår referanse Jarle
 Forsinkelsesrente Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
 forsinkelsesrenteloven

Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall Enhet	Enhetspris	Sum
3	Følge kontrakt skageneset 218.900 -utgåtte 82.000	1,00 tim	136 900,00	136 900,00
3	Ekstraarbeid avtalt	1,00 tim	219 700,00	219 700,00
3	rigg og drift ekstraarbeider 20.7 %	1,00 tim	45 477,00	45 477,00

Selger har eiendomsrett til alle leverte og monterte varer inntil hele beløpet med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Skriftlig reklamasjon innen 8 dager.

Forfallsdato 25.06.2018
 KID
 Fakturanummer 964
 Vennligst angi fakturanummer ved betaling
 Bankkonto 36285185380

Ekskl. mva	402 077,00		
Mva (25 %)	100 519,25		
Avrundning	-0,25	Å betale	502 596,00

Adresse
 OS Kaiservice AS
 Drangsneset 41
 5215 Lysekloster

Telefon
 99700861
 91127300

E-post/hjemmeside
 jarle@oskai.no
 www.oskai.no

Organisasjonsnr.
 985 449 538 MVA
 Foretaksregisteret
