

Årsak til endringsordrar:

Det er 18 endringar initiert av byggherre og entreprenør pr i dag. Dei som kostar mest er omtalt i tabellen under:

Endringsordre:	Sum	Kommentar
006 Utvidelse mellom tiltak 1 og II (skjæring B)	1 228 003	Auka omfang mellom tiltak 1 og 3. Tatt inn for å få auka vegbredde med plass for gåande i denne sona. Oppgjør etter medgåtte mengder
008 Masseutskifting eksisterande vegbane T1-T3	Kr 807 560	Vegen ligg på jord og dette var ikkje tatt med i konkurransegrunnlaget. Ikkje omtalt i forprosjekt eller geologisk rapport. Oppgjør etter medgåtte mengder
011 Betongmur pr 475-490   Viser jordmassane som må haldast på plass. Ikkje godt nok med sognemur då det er er over 0,5 meter jord over berg.	Kr 337 500	Meir jord over berg enn antatt og dermed meir sikring mot utrasing. Oppgjør etter medgåtte mengder


013 Sikring jordmasse mot utras T3



Mur på veg ut og tidlegare tiltak som ligg på jord.



Mur i sving ved NK

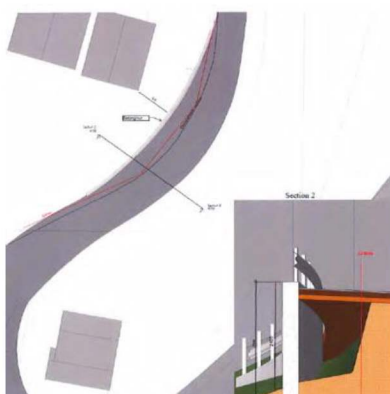

Kr 304 283

Store jordmengder ved T3 som måtte sikrast då tidlegare tiltak ikkje stod på fjell og vegen ovanfor bekken er på veg ut. Oppgjør etter medgåtte mengder

Kr 437 500

Utvider vegen for å få bedre svingradius for brannbil her og rundt svingen oppover til tiltak 1. Oppgjør etter medgåtte mengder

? Svelvikelipse 	Kr 307 775	Autovernet kunne ikkje nyttast på nytt og me valgte å ta elipse som vert billegare enn autovern. Oppgjør etter medgåtte mengder
004 tiltak 4 skredsikring pr 360-370 	Kr 111 211	Mur for å holde på terrenget. Ikkje omtalt i forprosjektet eller i geologisk rapport. Oppgjør etter medgåtte mengder
Sum for ovannevnte tiltak	3 527 831	

21.03.2023

Tone Tysseland Holmefjord
