

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Nordhordaland Næringpark S3mini-S2mini

Oppdragsgiver : **Flage Maskin AS
Bjørkemoen 46
5700 Voss**

Prosjektnummer: **2058**

Prosjekt: **Ordrenr:220342**

Prosjektstart: **25.02.2022 14:29:03**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **25.02.2022 14:52:43**

Vitek Miljø AS


5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :Flage Maskin AS
Bjørkemoen 46
5700 Voss**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk

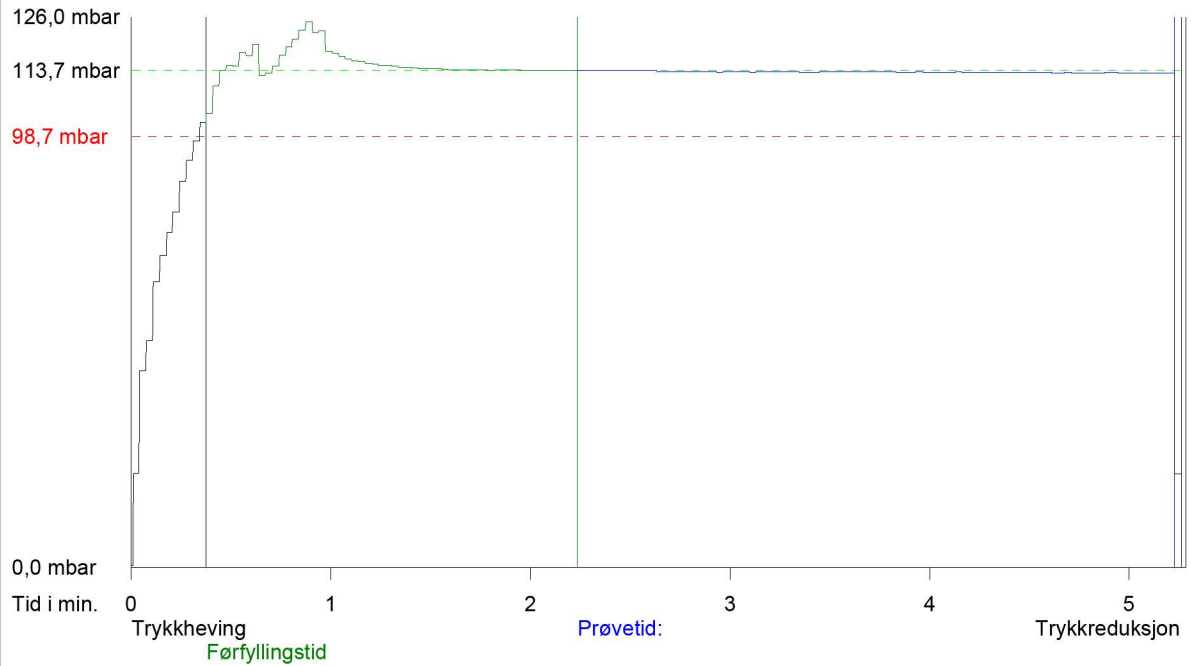

Sted	:		Tegningsnr.:	:	
Sted	:	Eikangervåg	Strekn.nummer	:	S3min-S2mini
Adresse	:	Nordhordaland Næringpark	Fra	:	S3mini
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	S2mini
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	30,3 m
Ordrenr.	:	2058	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	25.02.2022 14:52:43	Diameter	:	160 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:	1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Område	:	Rør			
Materiell	:	PVC			
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	05.10.2021
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	113,7 mbar	Førfyllingstid	:	1:52 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	3:00 min
Faktisk trykktap	:	-0,6 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum		Prøving		
<i>Prøvenr.</i>	<i>Strekn.numme</i>	<i>Fra</i>	<i>Sted</i>	<i>Norm</i>	<i>Prøvetrykk i mbar</i>	<i>Trykktap</i>
<i>Prøvedato</i>	<i>Rør-Nr.</i>	<i>Etter</i>	<i>Adresse</i>	<i>Prosedyre</i>	<i>Lengde i mtr.</i>	<i>Resultat</i>
160						
1	S3min-S2mini	S3mini	Eikangervåg	EN 1610	100	-0,64
25.02.2022 14:52:43	1	S2mini	Nordhordaland Næringpark	Luft LC	30,3	Godkjent
				Antall	1 Godkjent	
				Total lengde i m:	30,30	
