



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7080-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7080-2017
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	01 / 2,938	til Hp/km:	01 / 2,430
Strekning:	Storavatnet - Høyland ved Heggernes			Sted:	Høylandsvegen
Arbeid som skal utføres: Demontering av høyspentliner over vei					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	23 januar 2017	Til dato:	14 mars 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 07.00 - 19.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90
				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **19.01.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	ONE Nordic Kraftmontasje AS	
- Ansvarshavende: **Per Magne Bjerkevoll** Tlf./e-post: **41457580/permagne.bjerkevoll@on**
 Stedsansvarlig(e): **Endre Fivelstad** Tlf./e-post: **97054948/endre.fivelstad@one-nor**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy.

Sikre evt tilstøtende veier.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

19.01.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvveit
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen


Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7080-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7080-2017
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	01 / 2,938	til Hp/km:	01 / 2,430
Strekning:	Storavatnet - Høyland ved Heggernes			Sted:	Høylandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Demontering av høyspentlinjer over vei				
Entreprenør:	ONE Nordic Kraftmontasje AS				
Adresse:	Skorgen, 6390 Vestnes	0	permagne.bjerkevoll@one-n		
Ansvarshavende:	Per Magne Bjerkevoll	Tlf./e-post:			41457580/permagne.bjerkevoll@one-
Stedsansvarlig(e):	Endre Fivelstad	Tlf./e-post:			97054948/endre.fivelstad@one-nordic.no
Arbeidet utføres	fra dato:	23 januar	2017	Til dato:	14 mars 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	808.727	2
		2
		2
		2

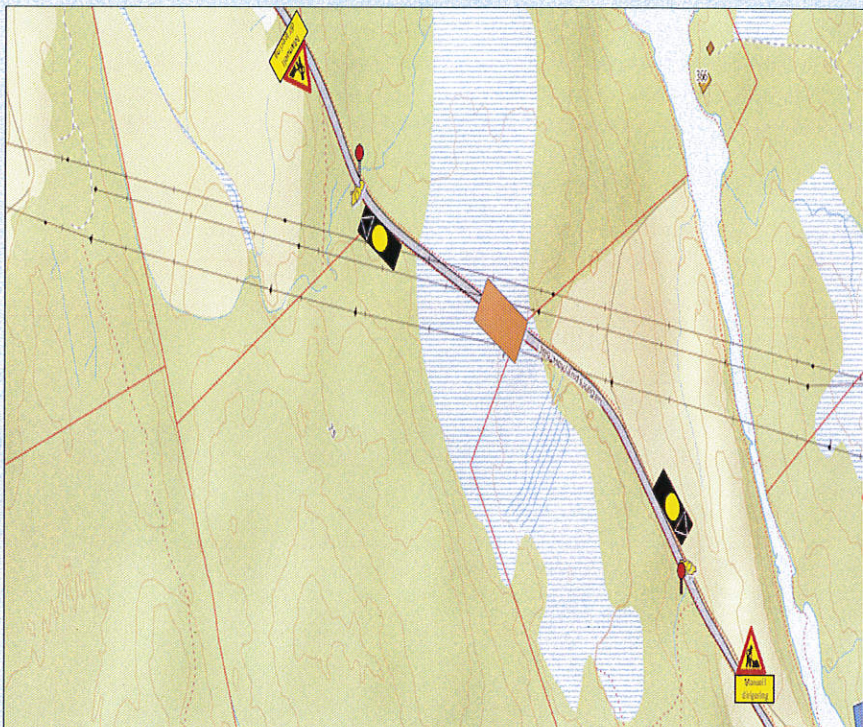

Merknader:

Lage arbeideområdet så kort som mulig.
Husk evt gjentakelse av nedsatt hastighet. Skilt avstand (362.50) max 250 m.
Vurdere bruk av 149 Kø.

Skilt skal blendes / fjernes når det ikke pågår arbeid.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

19.01.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvveit
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7080-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7080-2017
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	01 / 2,938	til Hp/km:	01 / 2,430
Strekning:	Storavatnet - Høyland ved Heggernes			Sted:	Høylandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Demontering av høyspentliner over vei				
Ansvarshavende:	Per Magne Bjerkevoll			Tlf./e-post:	580/permagne.bjerkevoll@one-nor
Entreprenør:	ONE Nordic Kraftmontasje AS			Adresse:	Skorgen, 6390 Vestnes

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	23 januar	2017	Til dato:	14 mars	2017	E-post:	permagne.bjerkevoll@one-nordic.no
-----------	-----------	------	-----------	---------	------	---------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Påkjørsel arbeidere	1	2	2
2: Kødannelse med påkjørsel bakfra	3	1	3
3: Påkjørsel arbeidsmaskin	2	2	4
4: Høyspentline faller ned over kjøretøy/personell	3	2	6
5:	3	1	3
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Merking med skilt at arbeid pågår/stengt vei. Manuell dirigering for å stenge med bil som tung sikring mot arbeidsområde
- 2: Merking med skilt at arbeid pågår/stengt vei.
- 3: Merking med skilt at arbeid pågår/stengt vei. Manuell dirigering for å stenge med bil som tung sikring mot arbeidsområde
- 4: Avsperringsområde, med hjelp av manuell dirigering

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:

Statens vegvesen

