



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: Kvasnesv./E39 fra Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560	til Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560	
Strekning: Kvasnesvegen X m E39	Sted: Knavik, Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer for Statens vegvesen		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 8 mars 2017	Til dato: 9 mars 2017	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900 06.03.17
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Statens vegvesen (grunnboringer)	
- Ansvarshavende: Olaf Bøckmann (norconsult AS) Tlf./e-post: 982 39 877
Stedsansvarlig(e): Ruben Myra (Bergs maskin AS) Tlf./e-post: 416 38 115
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	NOBIVA	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Konstert mulig stenging av kjørefelt.
Manuell dirigering

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

for Atle Dingen
Linda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)

0
Knavik
Sted

06.03.2017
00.01.1900
Dato



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kvasnesv./E39 fra Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560		til Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560		
Strekning:	Kvasnesvegen X m E39		Sted:	Knavik, Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres:	Grunnboringer for Statens vegvesen				
Ansvarshavende:	Olaf Bøckmann (norconsult AS)		Tlf./e-post:	982 39 877	
Entreprenør:	Statens vegvesen (grunnboringer)		Adresse: Norconsult AS		
Arbeidet utføres i perioden			Valkendorfsgt.6, 5012 Bergen		
Fra dato:	8 mars	2017	Til dato:	9 mars	2017
			E-post:	olaf.bockmann@norconsult.com	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
↓ Beskrivelse:	Stor: 1	Stor: 1	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjøring av borebygg	2	2	4
2: Påkjøring av boremannskaper	2	1	2
3: Klemfare for forgjengere	3	2	6
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Skilting med skilt 110 vegarbeid + 106.2 Smalere veg + 808.727 Manuell dirigering

2: Manuell trafikkdirigering

3: Varsling med 906 rundt borryg.

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kvasnesv./E39 fra Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560			til Hp/km:	Kv1023 X HP23/Km 0,560
Strekning:	Kvassnesvegen X m E39			Sted:	Knarik, Lindås kommune
Arbeid som skal utføres:	Grunnboringer for Statens vegvesen				
Entreprenør:	Statens vegvesen (grunnboringer)				
Adresse:	Norconsult AS	Valkendorfsgt.6, 5012 Bergen olaf.bockmann@norconsult.no			
Ansvarshavende:	Olaf Bøckmann (norconsult AS)	Tlf./e-post: 982 39 877			
Stedsansvarlig(e):	Ruben Myra (Bergs maskin AS)	Tlf./e-post: 416 38 115			
Arbeidet utføres	fra dato:	8 mars	2017	Til dato:	9 mars 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkgulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

	Skilt nr.:	Ant.:
	K	4
	106,1	4
	906.VH	11
	810.H90	1
	810.V90	1
	808,727	4


Merknader:

Arbeidsvarslingen gjelder ett bopunkt
 Arbeidene ønskes utført mellom kl 10 og 14. Det er søkt om 2 alternative dager.
 Det vil bli brukt 3 trafikkdirigenter i omsøkt tidsrom. Arbeidet blir utført i en av de omsøkte dagene
 Antatt boretid ca 2-3 timer

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- _____

Skisse:

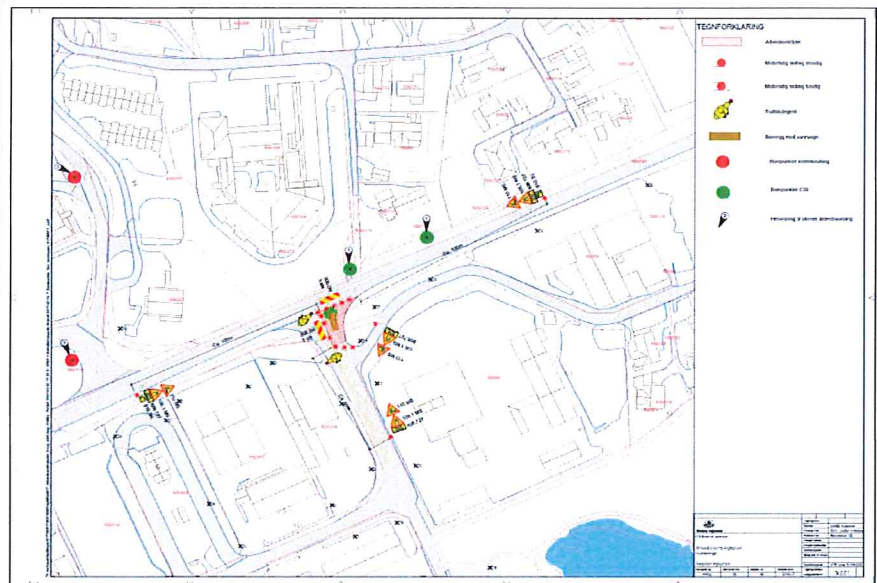

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Atle Dungen

dinda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik
 Sted

06.03.2017
 Dato



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: Kvasnesv./E39 fra Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560 til Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560

Strekning: Kvasnesvegen X m E39 Sted: Knavik, Lindås kommune

Arbeidsvarslingsplan nr.: 0

Utførende: Statens vegvesen (grunnboringer)

Ansvarshavende: Olaf Bøckmann (norconsult AS)

Stedsansvarlig: Ruben Myra (Bergs maskin AS)

Kontroll utført dato: _____ Kontroll utført av: _____

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.:	Kvasnesv./E39 fra Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560	til Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560
Strekning:	Kvassnesvegen X m E39	Sted: Knavik, Lindås kommune
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0	
Utførende:	Statens vegvesen (grunnboringer)	
Ansvarshavende:	Olaf Bøckmann (norconsult AS)	
Stedsansvarlig:	Ruben Myra (Bergs maskin AS)	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kvasnesv./E39	fra Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560	til Hp/km: Kv1023 X HP23/Km 0,560
Strekning: Kvasnesvegen X m E39	Sted: Knavik, Lindås kommune	
Arbeid som skal utføres:	Grunnboringer for Statens vegvesen	
