



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	HP 1 M368	til Hp/km:	468
Strekning:	Kvassnessvegen 19			Sted:	Bergen
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber, grøft, ny trekkekum samt mulig skjøtehull.				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk		Tlf./e-post:	901 20 216	
Entreprenør:	Minimaskin AS		Adresse:	PB 34 Minde	
Arbeidet utføres i perioden				5821 Bergen	
Fra dato:	16 april	2018	Til dato:	31 mai	2018
			E-post:	bente@minimaskin.net	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:		Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :		(= produktet)
↓ Beskrivelse:	Stor: 1	Stor: 1		
	Middels: 2	Middels: 2		
	Liten: 3	Liten: 3		
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	
1: Stå langs vei og jobbe med utstyr, påkjørselsfare/kollisjonsfare	3	1	3	
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	1	3	
3: Fremkommelighet Brannvesen og generell trafikk, problemer	3	2	6	
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3	
5:			0	
6:			0	
7:			0	
8:			0	
9:			0	
10:			0	
11:			0	

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Skilte, sperrer av rundt graveområdet. Graver en halvdel om gangen ved utkjøring/kryss. Vaktmann ved behov.
- 2: Sikrer fotgjengere med sperring mot arbeidsområdet. Skiltes. Leder fotgjengere over til andre siden/fortau. Vaktmann
- 3: Ikke til hinder
- 4: Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Vaktmann stopper trafikk ved overgang til fortau andre siden for fotgjengere. Sperrer av fortau.



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	HP1 m301	til Hp/km:	m448
Strekning:	Kvassnessvegen 19			Sted:	5914 Isdalstø
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber, grøft, ny trekkefum samt mulig skjøtehull.				
Entreprenør:	Minimaskin AS				
Adresse:	PB 34 Minde	5821 Bergen		bente@minimaskin.net	
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf./e-post:	901 20 216
Stedsansvarlig(e):	Thomas Tverrelv			Tlf./e-post:	41616551
Arbeidet utføres	fra dato:	16	april	2018	Til dato: 31 mai 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:




Skilt nr.: 110.212
Ant.: 5



106.1a
Ant.: 5



1



2



2

Merknader:

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☐ Entreprenør
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐


Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

19.04.2018

Sted

Dato

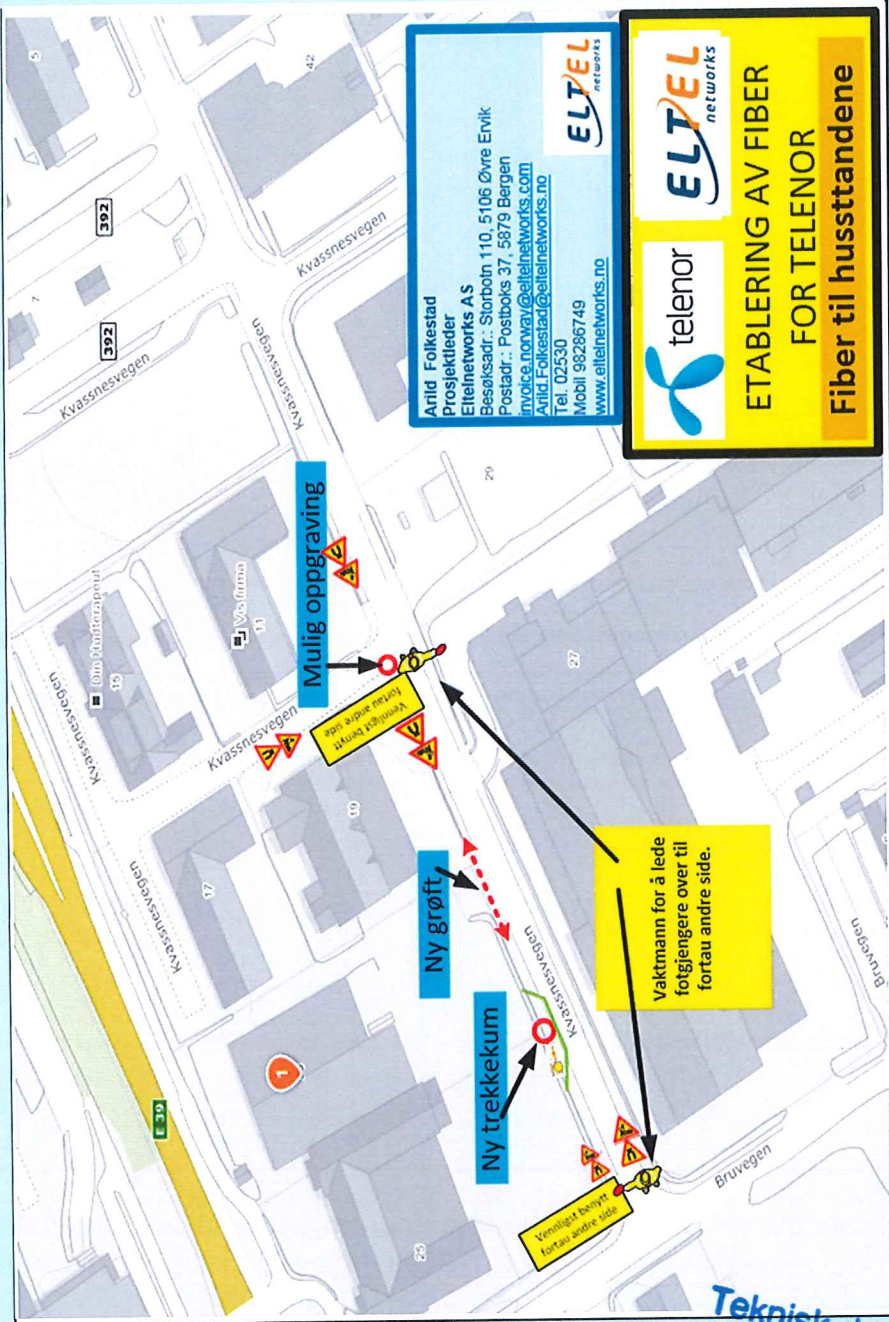

Arild Folkestad
Prosjektleder
Eltelnetworks AS
Besøksadr.: Storbøen 110, 5106 Øvre Evik
Postadr.: Postboks 37, 5879 Bergen
Invoice: invoice@eltelnetworks.no
Arild.Folkestad@eltelnetworks.no
Tel. 02530
Mobil 98286749
www.eltelnetworks.no



Teknisk drift
Godkjent

Anders Brautwahr

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV 1023	fra Hp/km: HP1 m301	til Hp/km: m448
Strekning: Kvassnessvegen 19		Sted: 5914 Isdalstø
Arbeid som skal utføres: Grave for etablering av fiber, grøft, ny trekkeikum samt mulig skjøtehull.		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 16 april 2018	Til dato: 31 mai 2018	
Annet:		

Region: Vest	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon: Lindås Kommune	Telefon:	Faks:
Adresse: Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø	e-post: postmottak@lindas.kommune.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐			
☐	☐	☐	☐	Manuell dirigering.....	☐			
30	40	50	60	70	80	90	Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 19.04.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	☐	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	☒	⇒	Minimaskin AS	
- Ansvarshavende: Bente Vassbakk Tlf./e-post: 901 20 216
Stedsansvarlig(e): Thomas Tverrelv Tlf./e-post: 41616551
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☐	Brannvesen.....	☐	Ambulanse/lege.....	☐
Vegtrafikksentralen.....	☐				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	☐	⇒	Angi hvilke(t):		
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	☐	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☒	Arbeidstillatelse.....	☐
----------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Sjå graveløyve. Utførende skal vere godkjendt for arbeid i offentlig veg og ha godkjedt arbeidsvarslingskurs

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

19.04.2018

Sted

Dato

Teknisk drift
Godkjent

Anders Brakhaug

Sign. (etter fullmakt)



Plan nr.:	0	Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	HP1 m301	til Hp/km:	m448
Strekning:	Kvassnessvegen 19			Sted:	5914 Isdalstø
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber, grøft, ny trekkefum samt mulig skjøtehull.				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf.:	901 20 216
Stedsansvarlig(e)::	Thomas Tverrelv				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Velg				

[illegible]



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: **KV 1023** fra Hp/km: **HP1 m301** til Hp/km: **m448**
Strekning: **Kvassnessvegen 19** Sted: **5914 Isdalstø**
Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**
Utførende: **Minimaskin AS**
Ansvarshavende: **Bente Vassbakk**
Stedsansvarlig: **Thomas Tverrelv**
Kontroll utført dato: _____ Kontroll utført av: _____

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidssedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	HP1 m301	til Hp/km:	m448
Strekning:	Kvassnessvegen 19			Sted:	5914 Isdalstø
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0				
Utførende:	Minimaskin AS				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk				
Stedsansvarlig:	Thomas Tverrelv				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

[illegible]



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1023	fra Hp/km:	HP1 m301	til Hp/km:	m448
Strekning:	Kvassnessvegen 19			Sted:	5914 Isdalstø
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber, grøft, ny trekkekum samt mulig skjøtehull.				
