



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8167-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8167-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 1,085	til Hp/km:	05 / 10,425
Strekning:	Lindås - Mongstad			Sted:	Mongstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Fres og asfaltering				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	13 juni 2018	Til dato:	6 juli 2018	Fra kl.:	18:00
				Til kl.:	06:00
Annet:	Arb. Man - fre. Kl 18.00 - 06.00.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Ledebil kjører kontinuerlig.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **12.06.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **Statens vegvesen ved Harald Midtun - tlf 9174 9247**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **NCC Industry** e-post: **ronny.skramesto@ncc.no**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **NCC Industry** e-post: **ronny.skramesto@ncc.no**
- Ansvarshavende: **Ronny Skråmestø** Tlf./e-post: **91704123/ronny.skramesto@ncc.no**

Stedsansvarlig(e): **Håvard Skråmestø/Bjørn Georg Langeland** Tlf./e-post: **91704123/91704168**

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nobina**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10. Spesielle vilkår/betingelser:

Etablere korte arbeidsområder. Ledebil kjører kontinuerlig. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Rutegående- og utrykningskjøretøy må slippe gjennom med minimal venting. Bruk skilt 149 KØ etter behov. Sikre sideveger ihh skisse. Viktig info: Kan til tider være høyt fartsnivå i området.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

12.06.2018

Sted

Dato

A. Løvveit

Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8167-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8167-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	05 / 1,085	til Hp/km:	05 / 10,425
Strekning:	Lindås - Mongstad	Sted:	Mongstadvegen		
Arbeid som skal utføres:	Fres og asfaltering				
Utførende av arb. varsling*:	NCC Industry				
Adresse:	PB93 Sentrum 0101 Oslo				
Ansvarshavende:	Ronny Skråmestø	Tlf./e-post:	91704123/ronny.skramesto@ncc.no		
Stedsansvarlig(e):	Håvard Skråmestø/Bjørn Georg Langeland	Tlf./e-post:	91704123/91704168		
Arbeidet utføres	fra dato:	13 juni	2018	Til dato:	6 juli 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110
	362.50
	e.b
	e.b
	e.b
	112.a
	362.xx
	4
	2
	1
	4

Merknader:

Antall skilt 362.XX benyttes etter behov; faste skilt blendes i den tiden produksjon pågår.

Etablere korte arbeidsområder.

Skilt blendes / fjernes etter endt skift.


Bruk 149 KØ etter behov.

Bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt. (Gjelder natt).

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås og Austrheim komm

Skisse:

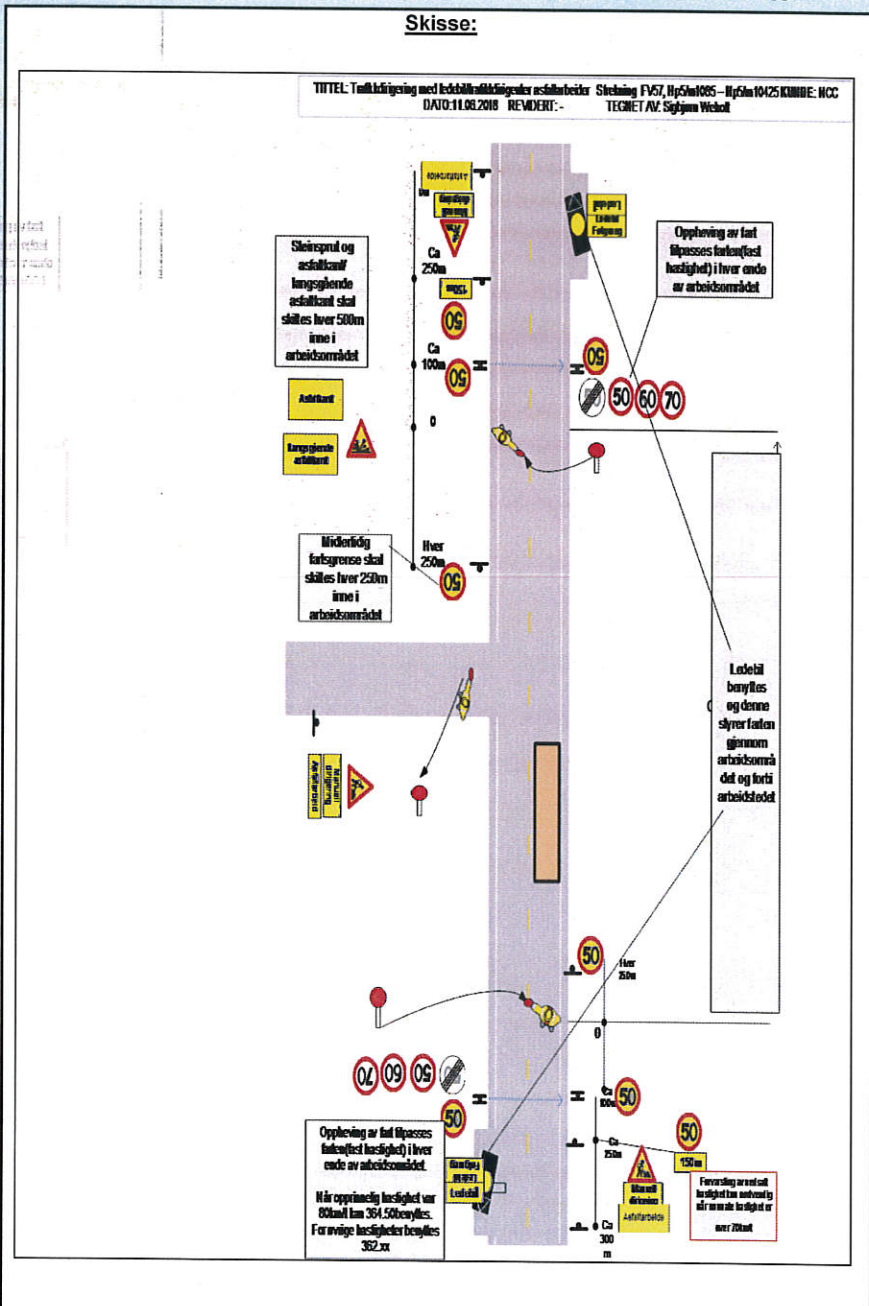

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

12.06.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8167-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtatt nr.: N8167-2018
Veg nr.: Fv. 57	fra Hp/km: 05 / 1,085	til Hp/km: 05 / 10,425
Strekning: Lindås - Mongstad	Sted: Mongstadvegen	

Arbeid som skal utføres: Fres og asfaltering

Ansvarshavende: Ronny Skråmestø Tlf./e-post: 91704123/ronny.skramesto@ncc.no

Utførende arb.v.*: NCC Industry Adresse: PB93 Sentrum 0101 Oslo

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 13 juni 2018	Til dato: 6 juli 2018	ca 4 uker

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Møtenede trafikk i samme felt, trafikanter med høy hastighet

Myke trafikanter igjennom AV-området

Trafikk fra sideveier

Steinsprut

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

- Påkjørrel/skade på personell ved rigg av skilt/sikringsutstyr
- Påkjørrel/skade på arbeidere innenfor AV-området
- Skade på trafikanter innenfor AV-området
- Skade på myke trafikanter innefor AV-området
- Trafikanter fra sideveier kjører/kommer inn i AV-området
- Påkjørrel av anleggskjøretøy inn og ut av AV området
-
-
-
-
-

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
3	2	6
2	2	4
3	2	6
2	3	6
2	2	4
		0
		0
		0
		0
		0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleggeopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Personell benytter godkjent synlighetstøy, samt sikres med bil med gulblink
- Området reguleres med skilt/sikring, det benyttes ledebil igjennom området
- Det benyttes trafikkvakt for å lede myke trafikanter igjennom området ved behov
- Det vil benyttes trafikkvakt for å lede myke trafikanter igjennom AV-området ved behov
- Sideveier skiltes, trafikkdirigent benyttes ved behov
- Øvrig trafikk stanses i perioden hvor anleggstrafikk skal ut og inn av området
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleggeopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Ronny Skråmestø** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8167-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8167-2018
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km.:	05 / 1,085	til Hp/km.:	05 / 10,425
Strekning:	Lindås - Mongstad			Sted:	Mongstadvegen
Ansvarshavende*:	Ronny Skråmestø			Tlf./e-post:	91704123/ronny.skramesto@ncc.no
Utførende entreprenør:	NCC Industry			Adresse:	PB93 Sentrum 0101 Oslo
				(Ev.e-post)	ronny.skramesto@ncc.no
Utførende arb. varsling*:	NCC Industry			Adresse:	PB93 Sentrum 0101 Oslo
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	984884176			(Ev. e-post:)	ronny.skramesto@ncc.no
Stedsansvarlig(e):	Håvard Skråmestø/Bjørn Georg Langeland			Tlf./e-post:	91704123/91704168
Arbeid som skal utføres*:	Fres og asfaltering				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	13 juni	2018	Til dato:	6 juli	2018
					ca 4 uker

Det skal utføres fres og asfaltering innenfor søkt AV-område. Fres vil starte 13.6 og området vil fresas i sin helhet før oppstart asfaltering .
Arbeidet vil utføres i perioden kl. 18.00 - 06.00.

D

AV-området vil være åpent for normal trafikk i tidsrommet 06.00 - 18.00. Det vil være faste faatsgrenser i dette tidsrommet. Det vil skiltes med skilt for steinsprut pr 500 meter.



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løtveit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 12.06.2018		
Plan nr.: N8167-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8167-2018		
Veg nr.: Fv. 57 fra Hp/km: 05 / 1,085	til Hp/km: 05 / 10,425		
Strekning: Lindås - Mongstad	Sted: Mongstadvegen		
Arbeid som skal utføres: Fres og asfaltering			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 13 juni 2018	Til dato: 06 juli 2018	Fra kl.: 18:00	Til kl.: 06:00
Utførende arb.v. NCC Industry		Adr.: PB93 Sentrum 0101 Oslo	Arbeidets varighet
			ca 4 uker
Ansvarshavende: Ronny Skråmestø		Tlf./e-post: 91704123/ronny.skramesto@ncc.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input checked="" type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Fresing / asfaltering. Manuell dir. Ledebil som kjører kontinuerlig.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: N8167-2018	Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8167-2018
Veg nr.: Fv. 57	fra Hp/km: 05 / 1,085	til Hp/km: 05 / 10,425
Strekning: Lindås - Mongstad	Sted: Mongstadvegen	
Utførende: NCC Industry		
Ansvarshavende: Ronny Skråmestø		
Stedsansvarlig: Håvard Skråmestø/Bjørn Georg Langeland		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

