

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

☒ Legging ☐ Utskifting ☐ Reparasjon ☐ Luftspenn

Veg nr.: 1123 Hp.: 1 Km: 0,026 - 0,051 Arbeidsstad: Hjelmåsen ved hus nr 4

Arbeida gjeld:

☐ Vassleidning ☐ Telekabel ☐ Avløpsleidning ☒ Anna: Fiber
☐ El-kabel ☐ Gassleidning ☐ TV-kabel

Noverande dekke:

☒ Asfalt ☐ Brostein ☐ Grus ☐ Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: _____ bnr.: _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Graving av grøft for fiber

Arbeidet er ønska oppstarta: 13.11.2018 og venta avslutta: 30.12.2018

Talet på kryssingar: 1 stk. Boring: ☐ ja, ved km: _____ ☐ nei

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: 25 m frå km: 0,026 til km: 0,051

Som eigar av og oppdragsgjevar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghaldar. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjevar/byggherre: Telenor Norge AS Org nr 976 967 631

Adresse: Snarøyveien 30. 1360 Fornebu

Kontaktperson hos oppdragsgjevar/byggherre: Dagfinn Jensen (På vegne av Telenor) Tlf.: 99515978

Dato: 12.11.2018 Underskrift: Dagfinn Jensen

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

☐ El-kabel ☐ Vassleidning ☐ Signalkabel ☐ Kulturminne
☒ Telekabel ☐ Avløpsleidning ☐ Polygonpunkt ☐ Gass
☐ TV-kabel ☐ Gassleidning ☐ Grøntanlegg ☐ Anna: _____

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. ☒ (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrørte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre før arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ☒ ja ☐ nei (kryss av)

Entreprenør: K. Amundsen Maskin AS Org nr 897 882 442

Adresse: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend

Kontaktperson hos entreprenør: Kenneth Amundsen Tlf.: 48292259

Dato: 12.11.2018 Underskrift: Kenneth Amundsen

☐ Spesielle vilkår, evt sjå baksida: Arbeida utføres etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg- og gate graving" gjeldende for Lindås Kommune

☒ Graveløyve gitt

☐ Graveløyve avslått

Lindås / Veg
Kommune / Eining

den 13 / 11 2018

Teknisk drift
Godkjent
A. Bratland
Underskrift

Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen






Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1123	fra Hp/km:	HP 1 / 0,026km	til Hp/km:	HP 1 / 0,051km
Strekning:	Hjelmåsen nr 4			Sted:	Bergen
Ansvarshavende*:	Kenneth Amundsen			Tlf./e-post:	48292259
Utførende entreprenør:	K. Amundsen Maskin AS			Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend
				(Ev.e-post)	post@kamundsenmaskin.no
Utførende arb.varsling*:	K. Amundsen Maskin AS			Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	Org nr 897 882 442			(Ev. e-post:)	post@kamundsenmaskin.no
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen			Tlf./e-post:	48292259
Arbeid som skal utføres*:	Graving i veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber.				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	13	november	2018	Til dato:	30 desember 2018
					2 dager



Graving av grøft for fiber
Sikring av arbeidsområde
Vaktmann sikrer fotgjengere
Bruk av kjøreplate ved kryssing av veg
Ved kryssing av veg kan vegen bli stengt i 15 min.
Utrykningskjøretøy kan passere



ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1123	fra Hp/km: HP 1 / 0,026km	til Hp/km: HP 1 / 0,051km
Strekning: Hjelmåsen nr 4	Sted: Bergen	
Arbeid som skal utføres: Graving i veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber.		

Ansvarshavende: Kenneth Amundsen	Tlf./e-post: 48292259
Utførende arb.v.*: K. Amundsen Maskin AS	Adresse: Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 13 november 2018	Til dato: 30 desember 2018	2 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Påkjørsel i arbeidsområde		Konsekvens:		Sannsynlighet:		Risiko	
Stor trafikk av myke trafikanter		Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:		Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?		= K x S	
Graving i veg							
Monteringsarbeid av sikringsutstyr							
Graving i smal veg							
Uønskede hendelser		Stor: 3		Stor: 3			
Beskrivelse av hendelsen:		Middels: 2		Middels: 2			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.		Liten: 1		Liten: 1			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafkant		3		2		6	
1: Bil kjører inn i arbeidsområde		3		1		3	
2: Uvedkommende innenfor sperringer		2		2		4	
3: Kødanelse grunnet innsnevret vegbane		3		3		9	
4: Arbeidsmann blir påkjørt ved utsetting av tung sikring		2		2		4	
5: Gravearbeider sperrer veg grunnet smal veg.		2		3		6	
6:						0	
7:						0	
8:						0	
9:						0	
10:						0	
11:						0	
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger").							

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Bruk av godkjent tung sikring. Skilting med 110 og 106.1 skilt
- 2: Avsperring og vakthold for å hindre uvedkommende tilgang til arbeidsområdet.
- 3: Skilting med vegen stengt i korte perioder, (Utrykningskjøretøy kan passere) Arbeid på tidspunkt med mindre trafikk
- 4: Strobelys på arbeidsbil , sidemann sitter ut skiltematriell.
- 5: Arbeid på tidspunkt med mindre trafikk i område, Bruk av kjøreplater, Varsling med 560 skilt ,(Vegen stengt i korte perioder)
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Kenneth Amundsen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1123	fra Hp/km:	HP 1 / 0,026km	til Hp/km:	HP 1 / 0,051km
Strekning:	Hjelmåsen nr 4	Sted:	Bergen		
Arbeid som skal utføres:	Graving i veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber.				
Utførende av arb. varsling*:	K. Amundsen Maskin AS				
Adresse:	Stamsneset 42, 5252 Søreidgrend				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen	Tlf./e-post:	48292259		
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen	Tlf./e-post:	48292259		
Arbeidet utføres	fra dato:	13 november	2018	Til dato:	30 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
Hjelmåsen ved nr 4 kan bli stengt inntil 15min	560	1
	110	2
	106.1	2
	906	20
	Vakt	1


Merknader:

Graving av grøft for fiber.
Se arbeidsbeskrivelse

Søknadnr.: 602 / 2018
Bergen : 12.11.2018
Sem Sikkerhet AS

Blankettfordeling:

☐	Statens vegvesen
☒	Utførende av arbeidet
☐	Ansvarshavende
☐	Politiet
☒	Lindås kommune

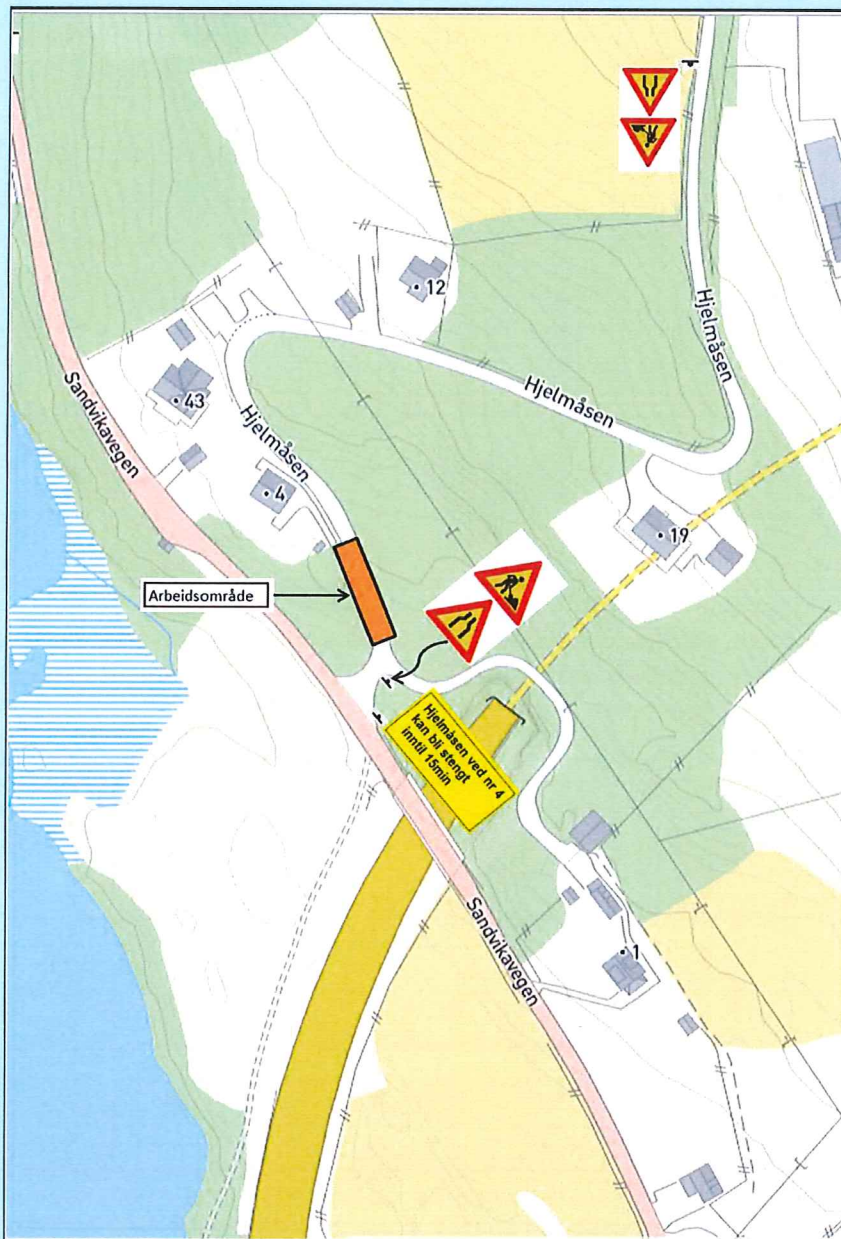

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

13.11.2018

Sted*

Dato*

A. Bratwaane

Sign. (etter fullmakt)*

Teknisk drift
Godkjent



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV 1123	fra Hp/km: HP 1 / 0,026km	til Hp/km: HP 1 / 0,051km
Strekning: Hjelmåsen nr 4	Sted: Bergen	
Arbeid som skal utføres: Graving i veg. Innsnevring av veg, grøft for fiber.		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 13 november 2018	Til dato: 30 desember 2018	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg		Region (2):
Avdeling:		Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon:		Telefon: Faks:
Adresse:		e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 13.11.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☐ Navnet på selskapet Telenor Norge AS v Dagfinn Jensen 99515978
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☐ Entreprenør/byggeleder < Amundsen Maskin AS e-post: post@kamundsenmaskin.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☐ Navn på ansvarlig < Amundsen Maskin AS e-post: post@kamundsenmaskin.no
4. Ansvarshavende: Kenneth Amundsen Tlf./e-post: 48292259
Stedsansvarlig(e): Kenneth Amundsen Tlf./e-post: 48292259
5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Lindås Kommune
6. Lede-/følgebil ☐
7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☐ Brannvesen..... ☐ Ambulanse/lege..... ☐
Vegtrafikksentralen..... ☐
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☐ Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:
8. Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☐
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø


13.11.2018

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0		
Veg nr.:	KV 1123	fra Hp/km:	HP 1 / 0,026km	til Hp/km:	HP 1 / 0,051km		
Strekning:	Hjelmåsen nr 4			Sted:	Bergen		
Arbeid som skal utføres:	Graving i veg. Innsnevring av veg , grøft for fiber.						
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen		Tlf.:	48292259			
Stedsansvarlig(e):	Kenneth Amundsen						
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Lindås Kommune						

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1123	fra Hp/km:	HP 1 / 0,026km	til Hp/km:	HP 1 / 0,051km
Strekning:	Hjelmåsen nr 4			Sted:	Bergen
Utførende av arb. varsling:	K. Amundsen Maskin AS				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen				
Stedsansvarlig:	Kenneth Amundsen				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

	Ja	Nei			Ja	Nei	Ikke kontr.
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet iht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1123	fra Hp/km:	HP 1 / 0,026km	til Hp/km:	HP 1 / 0,051km
Strekning:	Hjelmåsen nr 4			Sted:	Bergen
Utførende:	K. Amundsen Maskin AS				
Ansvarshavende:	Kenneth Amundsen				
Stedsansvarlig:	Kenneth Amundsen				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

