



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8322-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8322-2018-REV2
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	28 / 1,240	til Hp/km:	28 / 3,500
Strekning:	Ostereidet - XFv 570 Andås			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Rekkverksarbeid				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	7 desember 2018	Til dato:	21 desember 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00
Annet:	Man - fre. Fredag til kl 14:00.				
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):			
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3):			
Adresse:			Telefon:	95 845 124	Faks:
			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **04.12.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **SVV v/ Øystein Hagesæter - tlf. 976 74 634**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **Løvaas Maskin AS** e-post: **0**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **Presis Vegdrift AS** e-post: **0**
- Ansvarshavende: **Kenneth Hermansen** Tlf./e-post: **452 04 765 / khe@pvdrift.no**
 Stedsansvarlig(e): **Raido Suu / Tore Bruvik** Tlf./e-post: **941 79 535 / 922 64 876**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Skyss / Nettbuss, Firda billag**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Se "Tilleggsopplysninger"

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 04.12.2018
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8322-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8322-2018-REV2
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	28 / 1,240	til Hp/km:	28 / 3,500
Strekning:	Ostereidet - XFv 570 Andås			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Rekkverksarbeid				
Utførende av arb. varsling*:	Presis Vegdrift AS				
Adresse:	Kvassnesvegen 32, 5914 Isdalstø				
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen			Tlf./e-post:	452 04 765 / khe@pvdrift.no
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu / Tore Bruvik			Tlf./e-post:	941 79 535 / 922 64 876
Arbeidet utføres	fra dato:	7	desember	2018	Til dato: 21 desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	1098 BI lykt	et behov
	149	2
	362.50	4
	362.70	2
	364.50	1
	808.727.	2
	560.611	1
	560.610	1
	560.612	2
	802	2

Merknader:

Blir supplert med ekstra fartsgrenseskilt iht. behov.


Bruk 1098 Blinkende gult lys på skiltstolper for 110- og 149-skilt.

Se også "Tilleggsopplysninger"

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:

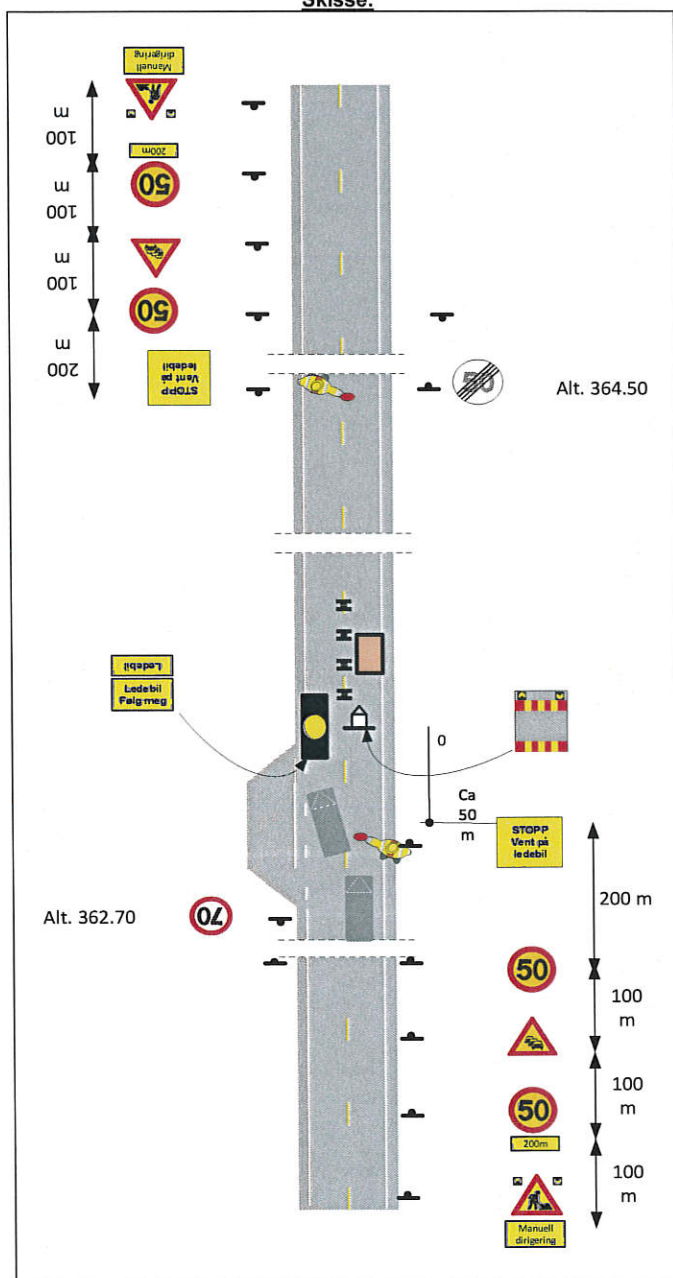

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

04.12.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8322-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtatt nr.:	N8322-2018-REV2			
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	28 / 1,240	til Hp/km:	28 / 3,500			
Strekning:	Ostereidet - XFv 570 Andås			Sted:	Osterfjordvegen			
Arbeid som skal utføres:	Rekkverksarbeid							
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen		Tlf./e-post:	452 04 765 / khe@pvdrift.no				
Utførende arb.v.*:	Presis Vegdrift AS			Adresse: Kvassnesvegen 32, 5914 Isdalstø				
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet				
Fra dato:	7	desember	2018	Til dato:	21	desember	2018	07:00 - 19:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Påkjørsel Skråning ned mot vann Vinter	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
1: Arbeid langs veg	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="9"/>
2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="9"/>
3: Påkjørsel av dirigenter	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
4: Utforkjøring i skråning, ned mot vann	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
5: Påkjørsel av arbeider	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
6: Glatt vegbane	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
11:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht. plan
- 2: Være forsiktig og oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy. Bruke bil med varssellys som buffer.
- 3: Oppmerksom på plassering i vegbane. Vurdere siktlinje, bremselengde og rømningvei.
- 4: Rekkverk skal alltid være lukket
- 5: Manuell dirigering og ledebil forbi arbeidsområde
- 6: Kommunikasjon med brøytemannskap
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Utrykningskjøretøy og rutebiler kan passere. God kommunikasjon med brøytemannskap.

Skilt blir tilpasset arbeidsområdet

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Hilde Kristin Iden** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8322-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8322-2018-REV2		
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	28 / 1,240	til Hp/km:	28 / 3,500		
Strekning:	Ostereidet - XFv 570 Andås			Sted:	Osterfjordvegen		
Arbeid som skal utføres:	Rekkverksarbeid						
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen			Tlf./e-post:	452 04 765 / khe@pvdrift.no		
Utførende av arbeidsvarsling:	Presis Vegdrift AS			Adresse:	Kvassnesvegen 32, 5914 Isdalstø		
Arbeidet utføres i perioden							
Fra dato:	7	desember	2018	Til dato:	21	desember	2018

Ledebil kjører kontinuerlig.

Prioritere kolonner fra nord. (Kolonnekjøring Masfjordtunnelen).

Unngå opphopning av kjøretøy i Bjørsviktunnelen.

Ta hensyn til siktsoner ved skiltplassering.

Bruk 1098 blinkende gult lys på skiltstolper for 110- og 149-skilt.

Varsle arbeidet i god avstand fra arbeidsområdet. (110 + 149).

Tilbakeføre til gjeldende hastighet etter endt skift.

Utrykningskjøretøy under utrykning skal prioriteres.

Ved evt fare for glatt vegbane må driftsentreprenør kontaktes omgående. Om nødvendig må arbeid midlertidig avsluttes.

Rekkverk rives og nytt monteres fortløpende, dette pga bratt skråning ned mot Husdalsvatnet.

Etablere godt samband mellom trafikkdirigenter, ledebil og enreprenør.

Info til personell om høyt fartsnivå i området.

Tilrettelegge for driftsentreprenørens vintervedlikehold.



Statens vegvesen


**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8322-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtatt nr.:	N8322-2018-REV2			
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	28 / 1,240	til Hp/km:	28 / 3,500			
Strekning:	Ostereidet - XFv 570 Andås			Sted:	Osterfjordvegen			
Ansvarshavende*:	Kenneth Hermansen			Tlf./e-post:	452 04 765 / khe@pvdrift.no			
Utførende entreprenør:	Løvaas Maskin AS			Adresse:				
				(Ev. e-post)				
Utførende arb. varsling*:	Presis Vegdrift AS			Adresse:	Kvassnesvegen 32, 5914 Isdalstø			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	914888794			(Ev. e-post:)				
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu / Tore Bruvik			Tlf./e-post:	941 79 535 / 922 64 876			
Arbeid som skal utføres*:	Rekkverksarbeid							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	7	desember	2018	Til dato:	21	desember	2018	07:00 - 19:00

Fjerning av gammelt og montering nytt rekkverk.
Det skal brukes manuell dirigering og ledebil forbi arbeidsted.
Arbeid blir utført på dagtid i perioden 07:00 - 19:00
Fartsgrense på stedet er 70 km/t og 80 km/t
ÅDT er 2800
Iht. avtale med A.løtveit skal rekkverk alltid være lukket.



Det vil fra 26.11.18 også bli utført fjellrensk på strekke (km 4,0 til 4,4)
Iht. avklaring blir dette kjørt som et arbeidsområde, men manulle dirigering og ledebil.
Ledebil regulerer fart mellom arbeidsområder.
Oppheving av fartsgrense rett etter arbeidsområdet.
Stedsansvarlig på fjellsikringsjobben er Tore Bruvik mob. 92264876.

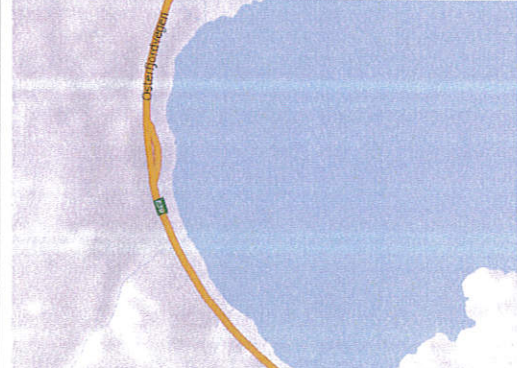



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8322-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8322-2018-REV2	
Veg nr.:	E 39	fra Hp/km:	28 / 1,240	til Hp/km:	28 / 3,500	
Strekning:	Ostereidet - XFv 570 Andås			Sted:	Osterfjordvegen	
Utførende:	Presis Vegdrift AS					
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen					
Stedsansvarlig:	Raido Suu / Tore Bruvik					
Kontroll utført dato:					Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

