



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9110-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9110-2019
Veg nr.:	Fv. 415	fra Hp/km:	01 / 0,560	til Hp/km:	01 / 0,660
Strekning:	Bleikvollen 4 - Veråsvegen - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Pigging av fjell				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	8 mars 2019	Til dato:	9 mars 2019	Fra kl.:	08:00 Til kl.: 18:00
Annet:	Planlegge arbeidet til tider med minst trafikk. Arbeid stipulert å ta 2 - 4 timer.				
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 06.03.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder hordland grunn og betone e-post: william.raugstad@ngb.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig hordland grunn og betone e-post: 0
- Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 90660320
 Stedsansvarlig(e): Stian Vikebø Tlf./e-post: 95729128
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Skyss
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Grunnet lav ÅDT blir det ikke skiltet vegstengning. Hjulmaskin vil stå i vegbane ifm arbeidet. Max ventetid for kjøretøy vil være 15 min.
Ta hensyn til buss i rute og utrykningskjøretøy - rask forflytning av hjulmaskin.
Utvise smidighet ift trafikk som "må fram", ex post, heimesjukepleie, annen nyttetraffic mm.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

06.03.2019

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9110-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9110-2019
Veg nr.:	Fv. 415	fra Hp/km:	01 / 0,560	til Hp/km:	01 / 0,660
Strekning:	Bleikvollen 4 - Veråsvegen - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Pigging av fjell				
Utførende av arb. varsling*:	Nordhordland grunn og betong AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	90660320
Stedsansvarlig(e):	Stian Vikebø			Tlf./e-post:	95729128
Arbeidet utføres	fra dato:	8 mars	2019	Til dato:	9 mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2
1098 BI lykt	2

Skisse:



Merknader:

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Bruk 1098 Blinkende gul lykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

06.03.2019

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9110-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9110-2019
Veg nr.:	Fv. 415	fra Hp/km:	01 / 0,560	til Hp/km:	01 / 0,660
Strekning:	Bleikvollen 4 - Veråsvegen - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen
Arbeid som skal utføres:	Pigging av fjell				
Utførende av arb. varsling*:	Nordhordland grunn og betong AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	90660320
Stedsansvarlig(e):	Stian Vikebø			Tlf./e-post:	95729128
Arbeidet utføres	fra dato:	8 mars	2019	Til dato:	9 mars 2019


Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2
1098 BI lykt	2

Skisse:

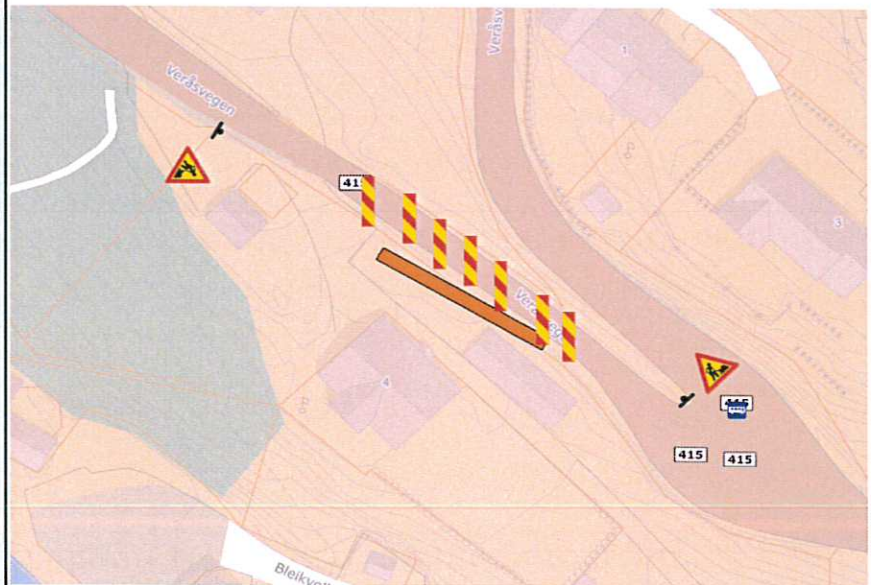

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

06.03.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N9110-2019 Mime-nr.: 19 / 233 Vedtak nr.: N9110-2019
 Veg nr.: Fv. 415 fra Hp/km: 01 / 0,560 til Hp/km: 01 / 0,660
 Strekning: Bleikvollen 4 - Veråsvegen - Lindås kommune Sted: Veråsvegen
 Arbeid som skal utføres: Pigging av fjell

Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 90660320

Utførende arb.v.*: Nordhordland grunn og betong AS Adresse: 0

Arbeidet utføres i perioden
 Fra dato: 8 mars 2019 Til dato: 9 mars 2019 Arbeidets varighet: 2 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø
 Fare for steinsprut er liten pga av pigging utføres på nedsiden av mur.
 Høydeforskjell ifra eksisterende vei og ned til fjell er 3-4m

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy	3	2	6
2: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant	2	1	2
3: Uoppmerksomme trafikanter som kommer kjørende	3	1	3
4: Uoppmerksomme trafikanter som kommer kjørende	2	1	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Ikkje mulig å passere, hjulmaskin flyttes når det kommer trafikk.
- 2: Myke trafikanter går alternative traseer
- 3: God og synlig skilting rundt arbeidsområdet. Roterende gult lys på anleggsutstyr som ferdes i anleggsområdet.
- 4: God sikt og lav hastighet ved anleggsområdet
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 600

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Atle Hamre** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N9110-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9110-2019
Veg nr.:	Fv. 415	fra Hp/km:	01 / 0,560	til Hp/km:	01 / 0,660
Strekning:	Bleikvollen 4 - Veråsvegen - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen
Ansvarshavende*:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	90660320
Utførende entreprenør:	Nordhordland grunn og betong AS			Adresse:	Mongstadvegen 1000
				(Ev.e-post)	william.raugstad@ngb.no
Utførende arb. varsling*:	Nordhordland grunn og betong AS			Adresse:	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:				(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Stian Vikebø			Tlf./e-post:	95729128
Arbeid som skal utføres*:	Pigging av fjell				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	8 mars	2019	Til dato:	9 mars	2019
					2 dager

Pigging av fjell på Bleikvollen 4 5955 Lindås

For å utføre arbeidet må maskina stå i Veråsvegen/ Fv 415 ved «Storesvingen». Når maskina arbeider vil vegen vera sperra for køyretøy- og personelltrafikk. Det er omkøyingsmogelegheit for personbiler via «Likhusbrekka»/ forbi Lindåstunet. For gåande er det greit med alternative traseer forbi arbeidsstaden. Det er 50 km/t sone på staden.

Eg har vore i forbindelse med Statens Vegvesen v/ Arve Johannes Løvteit mtp tiltak relatert til arbeidet. Løvteit var på synfaring i går og fekk ein gjennomgang av prosjektet.

Løvteit er fleksibel og ser gjennomføring slik me har planlagt som hensiktsmessig og godt gjennomførbar. Han rår oss til å senda inn arbeidsvarsling så snart som mogeleg for å sikra tilstrekkelig informasjon, trafikkavvikling og tryggleik.

Løvteit indikerte følgjande tiltak som hensiktsmessige:

- arbeidsvarsling innsendt av kompetent person snarast råd
- «veiarbeid pågå» skilt ved/ like før arbeidsstaden
- forøvrig at me viser sunn fornuft og fleksibilitet med ytterlegare opning dersom nyttetraffikk treng passering
- beredskap for hurtig opning av vegen ved behov for passering av utrykningskjøring



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9110-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9110-2019	
Veg nr.:	Fv. 415	fra Hp/km:	01 / 0,560	til Hp/km:	01 / 0,660	
Strekning:	Bleikvollen 4 - Veråsvegen - Lindås kommune			Sted:	Veråsvegen	
Utførende:	Nordhordland grunn og betong AS					
Ansvarshavende:	Atle Hamre					
Stedsansvarlig:	Stian Vikebø					
Kontroll utført dato:					Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

