



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reparasjon av asfalkskader				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	7 mai 2018	Til dato:	25 mai 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00
Annet:	Arbeid man - fre. Ikke arb søn- og høytidsdager.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124
				Faks:	
Adresse:				e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skytte).....	☐				
☐	☐	☐	☐	Manuell dirigering.....	☐				
30	40	50	60	70	80	90		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 03.05.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet SVV v/ Håvard Dyrkolbotn - 992 35 726
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ Entreprenør/byggeleder Løvaas Maskin AS e-post: post@lovaas-maskin.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ Navn på ansvarlig Løvaas Maskin AS e-post: post@lovaas-maskin.no
- Ansvarshavende: Arild Sundal Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no
Stedsansvarlig(e): Svein Ove Ljunggren Tlf./e-post: 94002551/sveinove@lovaas-maskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☐ Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta hensyn til myke trafikanter som passerer. Ingen bevegelse på maskiner når myke trafikanter passerer. Bruk fysisk skille / evt trafikkvakt mellom myke trafikanter og anleggsomr.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

03.05.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Reparasjon av asfaltskader				
Utførende av arb. varsling*:	Løvaas Maskin AS				
Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen				
Ansvarshavende:	Arild Sundal			Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Svein Ove Ljunggren			Tlf./e-post:	94002551/sveinove@lovaas-maskin.no
Arbeidet utføres		fra dato:	7 mai	2018	Til dato: 25 mai 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieell:

Skilt nr.: Ant.:



110

2

Merknader:

Myke trafikanter skal ledes forbi arbeidsområde.
Ingen bevegelse på kjøretøy og maskiner når disse passerer.


Husk krav til stolpehøyde på GS-veg.

Bruk gjerde / evt trafikkvakt.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Meland og Lindås komm.

Skisse:

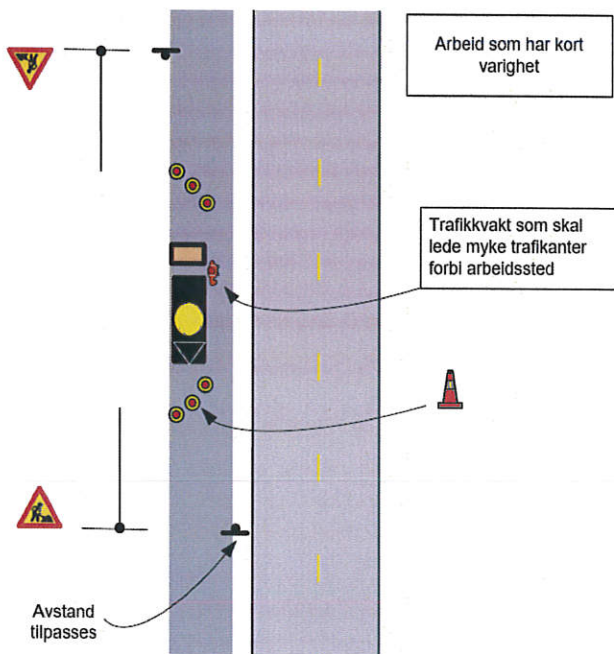

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.05.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8135-2018	Mime-nr.: 18 / 495	Vedtak nr.: N8135-2018
Veg nr.: EG 39	fra Hp/km: 222 / 0,563	til Hp/km: 226 / 0,893
Strekning: Nordhordlandsbrua - Haugsvær		Sted: Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres: Reparasjon av asfaltskader		
Ansvarshavende: Arild Sundal		Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no
Utførende arb.v.*: Løvaas Maskin AS		Adresse: Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 7 mai 2018	Til dato: 25 mai 2018	ca 3-5 dager i tidsperioden

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid med maskin i en gang og sykkelvei

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

- Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Myke trafikanter inn i arbeidsområde som kan medføre uønsket hendelse

2: Syklister i stor fart inn i arbeidsområde

3: Farlige situasjoner ved inn og utkjøring på gang og sykkelvei

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	3	6
2	1	2
2	2	4
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Varsling med skilting i begge kjøreretning
- 2: Vaktmann/sikringsmann skal lede myke trafikanter gjennom arbeidssted, ingen bevegelse på maskiner og kjøretøy
- 3: Kjøring på gang og sykkelvei skal utføres med stor aktsomhet, ved rygging skal det brukes vaktmann / sikringsmann
- 4: bak kjøretøy.
- 5: Kjøretøy skal bruke gult varsellys ved kjøring på og av gang og sykkelvei og ved opphold på GS
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeid utføres i tidsrom 0700-1900

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Arild Sundal** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)




Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Ansvarshavende*:	Arild Sundal			Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no
Utførende entreprenør:	Løvaas Maskin AS			Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
				(Ev.e-post)	post@lovaas-maskin.no
Utførende arb. varsling*:	Løvaas Maskin AS			Adresse:	Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	925264342			(Ev. e-post:)	post@lovaas-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Svein Ove Ljunggren			Tlf./e-post:	94002551/sveinove@lovaas-maskin.no
Arbeid som skal utføres*:	Reparasjon av asfalskader				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	7	mai	2018	Til dato:	25 mai 2018
				ca 3-5 dager i tidsperioden	

På oppdrag for SVV skal det gjennomføres reparasjon av asfalt / fast dekke på mindre areal på flere punkter langs gang og sykkelvei. Nærmer beskrivelse av alle punkter er opplistet i vedlegg 1

Arbeidet er viderføring av tidligere igangsatt og vedtak E39-26-Gjervik N7384.



Statens vegvesen

Byggeplan

Tekniske tegninger

GS veg E39 Nordhordland reparasjoner Vedlegg D2-3.

Informasjon – tegninger av oppdrag

Statens vegvesen





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnf
Avdeling: Hordaland	Dato: 03.05.2018
Plan nr.: N8135-2018 Mime-nr: 18 / 495 Vedtak nr.: N8135-2018	
Veg nr.: EG 39 fra Hp/km: 222 / 0,563 til Hp/km: 226 / 0,893	
Strekning: Nordhordlandsbrua - Haugsvær Sted: Osterfjordvegen	
Arbeid som skal utføres: Reparasjon av asfaltskader	
Arbeidet utføres i perioden	
Fra dato: 7 mai 2018	Til dato: 25 mai 2018
Daglig arbeids- / virketid	
Fra kl.: 07:00	Til kl.: 19:00
Utførende arb.v. Løvaas Maskin AS Adr.: Espehaugen 54, 5258 Blomsterda	
Arbeidets varighet	
ca 3-5 dager i tidsperioden	
Ansvarshavende: Arild Sundal Tlf./e-post: 45418914/arild@lovaas-maskin.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☐

Dette på grunn av:

Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

Merknader:

Rep asfalt på GS-veg. Kjørende ikke berørt.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8135-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8135-2018
Veg nr.:	EG 39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Utførende:	Løvaas Maskin AS				
Ansvarshavende:	Arild Sundal				
Stedsansvarlig:	Svein Ove Ljunggren				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

