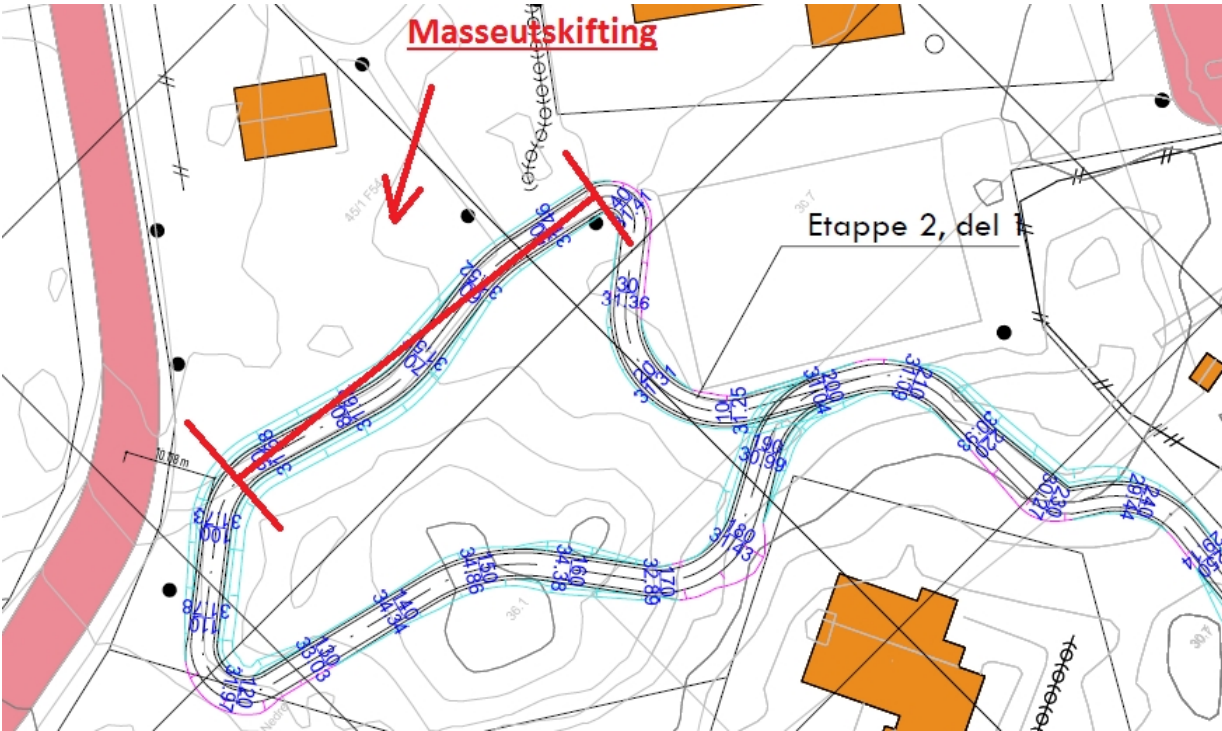


Prosjekt: 027.18 Radøy Kommune - Turveg Manger tri

**Endringsmelding**

Endringsmelding nr: 1	Dato: 28.12.2018
<p><b>Beskrivelse:</b></p> <p><b>EM-01 Masseutskifting av eksisterende gangvei bak Coop Obs</b></p> <p>Iht. beskrivelse skulle NGB kun gruse opp gangvei bak Coop Obs. Når gravearbeidene startet så viste det seg at den eksisterende gangveien var bygd opp med svært dårlige masser som gjorde det nødvendig å masseutskifte.</p> <p>NGB varslet Ingrid Didriksen på telefon og fikk bekreftet noen timer senere at vi kunne gå i gang med arbeidene med å masseutskifte.</p> <p>Arbeidene blir avregnet etter medgått tid og materiell.</p> <p><b>Beskrivelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjerning av de uegnede masser</li><li>• Utlegging av fiberduk</li><li>• Tilkjøring av engangsknust</li></ul>  <p><b>Ref. til tegning/postnr:</b></p>	

<b>Årsak:</b> Dårlige masser i eksisterende gangvei
<b>Konsekvenser:</b> Ref: Timeliste
<b>Tidsmessige konsekvenser i arbeidsdager:</b> 3
<b>Økonomiske konsekvenser i kr eks mva:</b> 83 270,00
<b>NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS signatur:</b>  28.12.2018
<b>Oppdragsgiver kommentar, dato og signatur:</b>

### Postgrunnlag

Postnr	Beskrivelse	Enhet	Mengde	EnhetsPris	PostPris
1	Timeliste uke 41-2018	uker	1,00	83 270,00	83 270,00 <i>Mva: 20 817,50</i>

Sum totalt netto: 83 270,00

+Mva: 20 817,50

---

Sum inkl. mva. 104 087,50

---

---

Nordhordland

**Grunn og Betong as**

Entreprenørforretning

**KUNDE:** Radøy Kommune

Turveg Manger trinn 2

EM-01 Masseutskifting av gangvei bak Coob Obs

**PROSJEKT NR:** 027.18

**Uke:** 41-2018

Overtidstillegg

NAVN	M	TI	ONS	TO	F	L	S	Sum t.	Kr./t	50 %	100 %	BELØP	MERKNADER
								0	0			0	
								0	0			0	
								0	0			0	
								0	0			0	
UTSTYR & MASKINER													
								0	0			0	
Gravemaskin 8t	8	8	4,5					20,5	850			17425	
Traktor	8	8	4,5					20,5	850			17425	
Dumper (dg)	1	1	0,5					2,5	2500			6250	
								0	0			0	
MEDGÅTT MATERIALER- MASKINTIMER- REKVISITA ETC.								ANT.	PRIS				
												0	
Uegnde masser til deponi (m3)								115	38			4370	
Engangsknust (m3)								138	250			34500	
Fiberduk (m2)								165	20			3300	
												0	
												0	

**TOTAL SUM 83270**



Sign.

28.12.2018
