



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N7059-2017	Sveis nr: 17/3014	Vedtak nr.: N7059-2017
Veg nr.: Fv. 409	fra Hp/km: 02 / 0,358	til Hp/km: 02 / 1,275
Strekning: Radøyvegen - Radøy kommune		Sted: Radøyvegen
Arbeid som skal utføres: oppgrave 2 trekkehull og sette ned 3 kummer.		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 12 januar 2017	Til dato: 20 februar 2017	
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 07.00 . 19.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 90		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
								Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- 1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.01.2017
- 2. Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- 3. Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 - Statens vegvesen..... ⇒ Byggeleder: _____
 - Annen offentlig etat..... ⇒ Angi hvilken: _____
 - Entreprenør..... ⇒ Tertnes Maskin As
- 4. Ansvarshavende: Thomassen Tlf./e-post: 90721743
Stedsansvarlig(e): Thomassen.Devik.Granberg.Fredrikser Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no
- 5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- 6. Lede-/følgebil
- 7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 - Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 - Vegtrafikksentralen.....
 - Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 - Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Tide
 - Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 - Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- 8. Tillatelser:
 - Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 - NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- 9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- 10. Spesielle vilkår/betingelser:
 - All graving min 3 m. fra hvitstripe. Alt graving foregår utenfor hvitstripe, Bruk gjerne 1098 blinklykt på 110-skilt.
 - Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Når det ikke pågår arbeid skal alle 362 / 364-skilt blendes / fjernes. (Dersom forsvarlig). Godt skiltvedlikehold / tilsyn / renhold.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

11.01.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N7059-2017	Sveis nr.:	17/3014	Vedtak nr.:	N7059-2017
Veg nr.:	Fv. 409	fra Hp/km:	02 / 0,358	til Hp/km:	02 / 1,275
Strekning:	Radøyvegen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	oppgrave 2 trekkehull og sette ned 3 kummer.				
Entreprenør:	Tertnes Maskin As				
Adresse:	Toppemyr 12. 5136 Mjølkeråen 0			vivian@tertnesmaskin.no	
Ansvarshavende:	Thomassen			Tlf./e-post: 90721743	
Stedsansvarlig(e):	Thomassen.Devik.Granberg.Fredriksen			Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no	
Arbeidet utføres	fra dato:	12 januar	2017	Til dato:	20 februar 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:		
Skilt nr.:	Ant.:	
	110	2
	1098 Bl.lykt	et behov
	106	2
	godkj sikr byggjerde	v/ behov
		v/ behov
	906H	et behov
		et behov
	802 / 150 m	2
	364.50	2
	362.50 Hvit	2

Merknader:
All graving min 3 m fra hvitstripe.
Lage korte arbeidsområder og flytte med skilt.
Husk : Oppheving av midlertidig fartsgrense til den eksisterende.
Når det ikke pågår arbeid skal alle 362/364-skilt blendes / fjernes. (Dersom forsvarlig).
Alt arbeid foregår utenfor hvitstripen.

Blankettfordeling:
<input checked="" type="checkbox"/> Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/> Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/> Politiet
<input checked="" type="checkbox"/> Radøy kommune

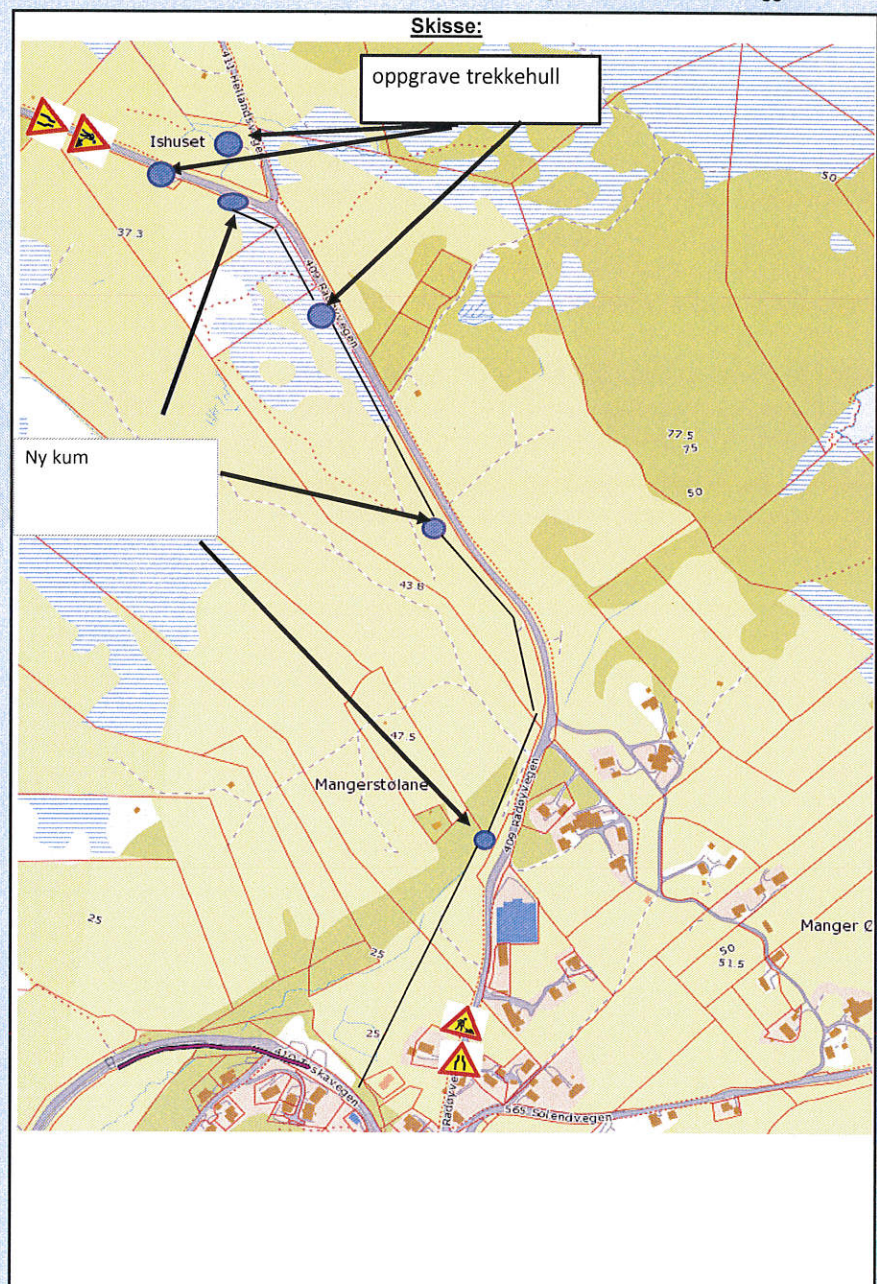

Fylles ut av skiltmyndigheten:		Statens vegvesen	
Bergen	11.01.2017		
Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)	



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7059-2017	Sveis nr.:	17/3014	Vedtak nr.:	N7059-2017
Veg nr.:	Fv. 409	fra Hp/km:	02 / 0,358	til Hp/km:	02 / 1,275
Strekning:	Radøyvegen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	oppgrave 2 trekkehull og sette ned 3 kummer.				
Ansvarshavende:	Thomassen			Tlf./e-post:	90721743
Entreprenør:	Tertnes Maskin As			Adresse:	Toppemyr 12. 5136 Mjøkeråen

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	12 januar	2017	Til dato:	20 februar	2017	E-post:	vivian@tertnesmaskin.no
-----------	-----------	------	-----------	------------	------	---------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)	
	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Stor: 1		Middels: 2
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	3	1	2	2
1: oppgrave trekkehull og sette ned kummer	2	1	2	1	2	2
2: Bruk av maskiner / Klemfare	2	1	2	1	2	2
3: Personell	3	1	2	1	2	3
4: Fotgjengere	3	1	2	1	2	3
5:						0
6:						0
7:						0
8:						0
9:						0
10:						0
11:						0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: skilte-oppmerke
- 2: skilte-oppmerke
- 3: Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring
- 4: vakt som leder fotgjengere
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Her skal det graves 2 trekkehull og settes ned 3 kummer. Vi subber fra eksist.kum i Toakavegen og til ny kum i Radøyvegen- Vi skilte ned til 50km i timen i arbeidsområdet

