

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Kubbaleitet GH92 S15-S16

Oppdragsgiver : **Hjelmås vvs AS
Leknesv.183
5915 Hjelmås**

Tel. 56354050

Prosjektnummer: **2045**

Prosjekt: **Ordrenr: 220266**

Prosjektstart: **16.02.2022 12:39:42**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **16.02.2022 13:42:32**

Vitek Miljø AS


5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :Hjelmås vvs AS
Leknesv.183
5915 Hjelmås
Tel. 56354050**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk

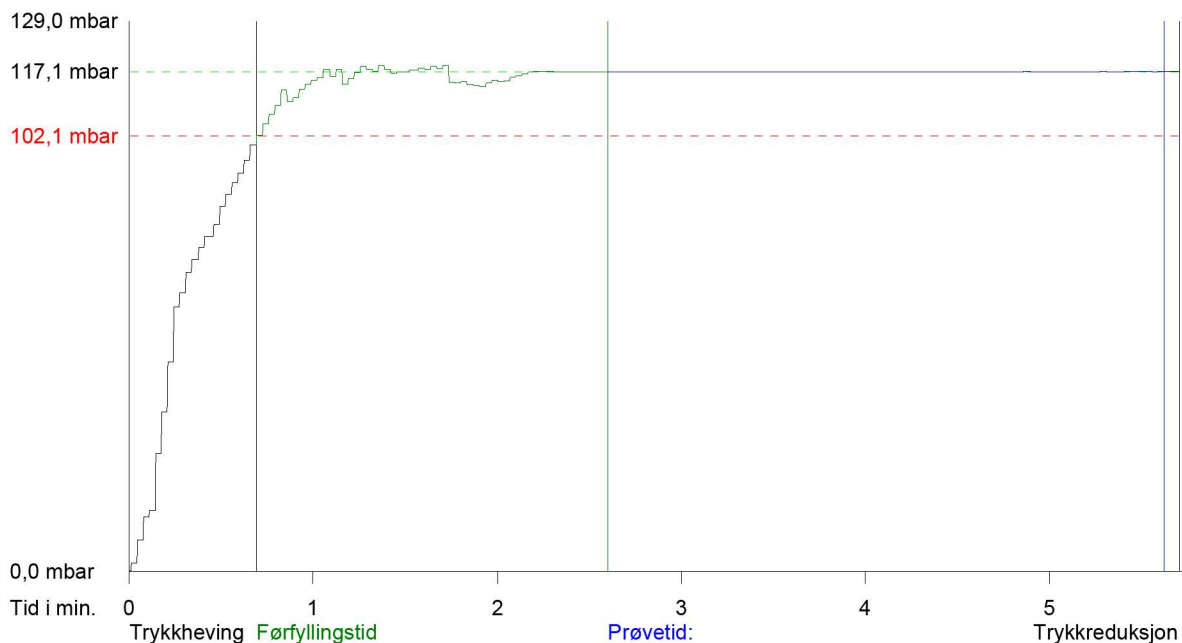

Sted	:		Tegningsnr.:	:	GH92
Sted	:	Alver	Strekn.nummer	:	S15-S16
Adresse	:	Kubbaleitet	Fra	:	S15
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	S16
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	55,0 m
Ordrenr.	:	2045	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	16.02.2022 13:42:32	Diameter	:	160 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610			
Prøveklasse	:	Luft LC			
Område	:	Rør	Rør-Nr.	:	1
Materiell	:	PVC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	05.10.2021
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	117,1 mbar	Førfyllingstid	:	1:55 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	3:02 min
Faktisk trykktap	:	0,0 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum			Prøving			
160	Prøvenr.	Strekn.numme		Fra	Sted	Norm	Prøvetrykk i mbar	Trykktap
	Prøvedato	Rør-Nr.	Etter		Adresse	Prosedyre	Lengde i mtr.	Resultat
	1	S15-S16	S15		Alver	EN 1610	100	-0,04
	16.02.2022 13:42:32	1	S16		Kubbaleitet	Luft LC	55,0	Godkjent
						Antall	1 Godkjent	
						Total lengde i m:	55,00	
