

Fra: Arne Helgesen
Sendt: mandag 17. juli 2023 09:21
Til: arvidrik@yahoo.no; thorleif@stendalvvs.no; oddmartinhaugen@gmail.com
Kopi: Eilin Houlison Molvik; Postmottak Alver; Linda Hammersvik Folkestad
Emne: Sak 21/10574. Støttemur V/Kommunal VA. 134/478

I forbindelse med inføring av nytt sak arkiv system, går eg no gjennom alle saker for avslutning.

Det har fremdeles ikkje kompt inn noko sluttdokumentasjon i denne saken, visser til min mail 21.03- 23:

Det kan godt hende at dette er ei god løysing, men det er ikkje mulig å gjennomføre dette på ein sikker måte, uten å ta trykket av hoved vannledning. Fundament skal våra 1-1,5 m. fra nermaste hovedledning, som i dette tilfellet er vannledning. Utførelse må dokumenteres med bilder og innmålingsdata,

Ferdigmelding for dei to to manns bustadene kan heller ikkje godkjennes, før vi har mottatt, og godkjent mur- omlegging av hoved ledninger.

Fint om det kan sende nødvendig sluttdokumentasjon til postmottak mrk med sak nr. 21/10574. Slik at eg kan få avslutta sak.

Med vennlig helsing

Arne Helgesen | Rådgevar prosjekt
Telefon: 959 454 34

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>
Sendt: tirsdag 21. mars 2023 09:25
Til: arvid rikstad <arvidrik@yahoo.no>
Kopi: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>; trond <trond@bolig-eiendom.no>;
oddmartinhaugen@gmail.com <oddmartinhaugen@gmail.com>
Emne: Sv: Støttemur V/Kommunal VA. 134/478

Her er det søkt om ei løysing som er godkjent, i utgangspunktet kan ein ikkje gjære dette på ein anna måte, uten å sende inn ein revidert plan, å få den godkjent.

Det kan godt hende at dette er ei god løsning, men det er ikkje mulig å gjennomføre dette på ein sikker måte, uten å ta trykket av hoved vannledning. Fundament skal være 1-1,5 m. fra nermaste hovedledning, som i dette tilfellet er vannledning. Utførelse må dokumenteres med bilder og innmålingsdata,

Fra: arvid rikstad <arvidrik@yahoo.no>

Sendt: onsdag 15. mars 2023 17:30

Til: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>

Kopi: Thorleif Stendal <thorleif@stendalvvs.no>; trond <trond@bolig-eiendom.no>;
oddmartinhaugen@gmail.com <oddmartinhaugen@gmail.com>

Emne: Støttemur V/Kommunal VA. 134/478

Heisann.

Vi velger å montere 2.4 tonn tunge legoklosser i betong 160x80x80 i forband på komprimert grunn langs med og ifra samme høyde som vann og avløp ligger ved 134/478


Det blir lagt geo-netting ut fra skift nr 2 inn i fylling, samt murt hjørne i forband i sør for god stabilitet.

Da får vi til å gjøre arbeidet med mur og fylling samtidig - slik at vi ikke trenger å åpne mer enn endel av lengden på muren/grøften om gangen.

Dette vil gi en sikker installasjon for fremtidig vedlikeholdsarbeid langs lokal VA trase.

Trykket er fortsatt redusert på stedet.


Tiltaket vil bli utført i løpet av de siste to ukene i Mars.

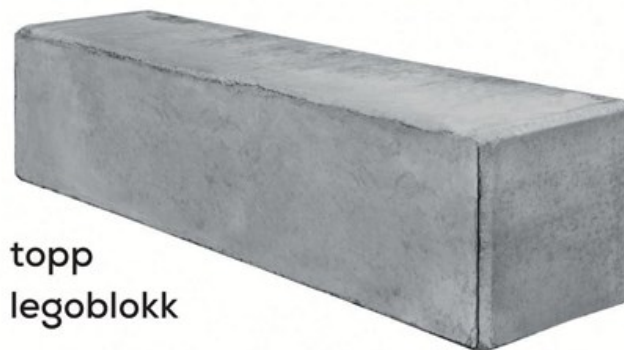

topp
legoblokk



3x2
legoblokk

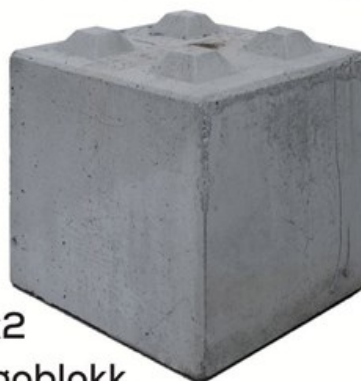

2x2
legoblokk



1x1
legoblokk



4x2
legoblokk

Mvh Arvid Rikstad
915 68 466
