

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Vardane Alver OK2-SF4 315mm

Oppdragsgiver : **123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**

Prosjektnummer: **1851**

Prosjekt: **Ordrenr:21171301**

Prosjektstart: **27.05.2021 11:19:50**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **27.05.2021 11:30:43**

Vitek Miljø AS


5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk

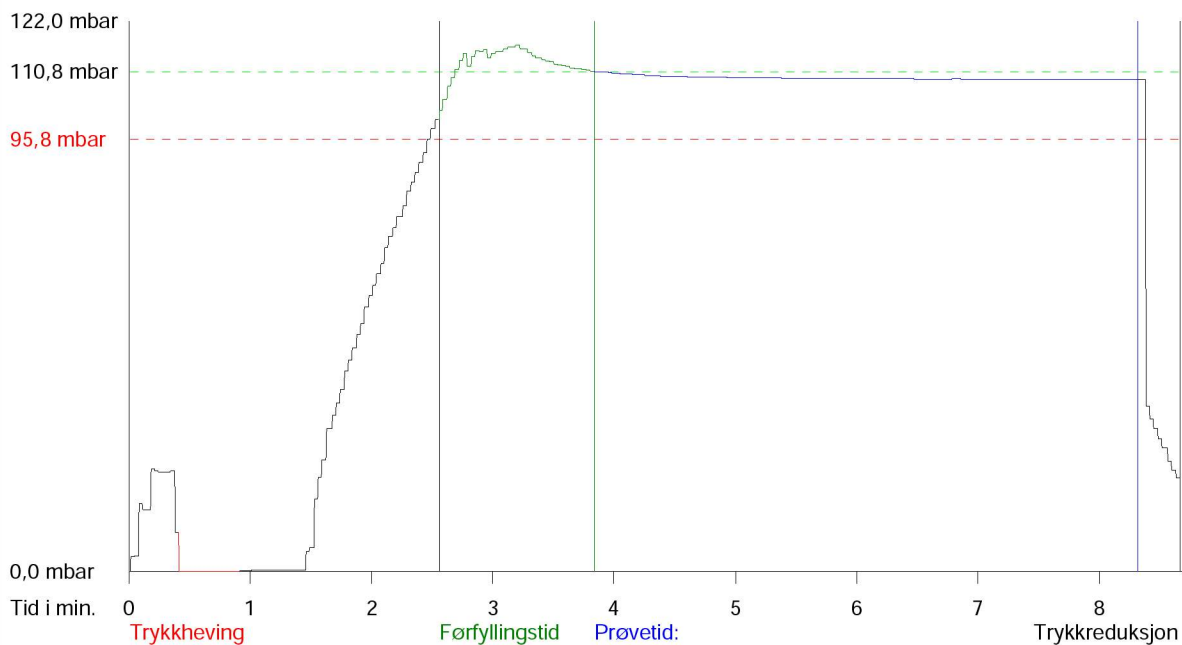

Sted	:		Tegningsnr.:	:	H1-B
Sted	:	Alversund	Strekn.nummer	:	OK2-SF4
Adresse	:	Vardane	Fra	:	OK2
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:	SF4
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	25,0 m
Ordrenr.	:	1851	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	27.05.2021 11:30:43	Diameter	:	315 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:	1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Område	:	Rør			
Materiell	:	Polpropylen			
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	26.02.2020
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	110,8 mbar	Førfyllingstid	:	1:17 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	4:30 min
Faktisk trykktap	:	-1,9 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Ordrenr.: 1851 Prøvenr.: 1

Rør Luft/Vakuum

<i>Diameter</i>		<i>Kum</i>		<i>Prøving</i>		
<i>Prøvenr.</i>	<i>Prøvedato</i>	<i>Strekn.numme</i>	<i>Fra</i>	<i>Sted</i>	<i>Norm</i>	<i>Prøvetrykk i mbar</i>
		<i>Rør-Nr.</i>	<i>Etter</i>	<i>Adresse</i>	<i>Prosedyre</i>	<i>Lengde i mtr.</i>
315	1	OK2-SF4	OK2	Alversund	EN 1610	100
	27.05.2021 11:30:43	1	SF4	Vardane	Luft LC	25,0
					<i>Antall</i>	<i>1 Godkjent</i>
					<i>Total lengde i m:</i>	<i>25,00</i>
