

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Vardane Alver SK6 - SK7

Oppdragsgiver : **123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**

Prosjektnummer: **1846**

Prosjekt: **Ordrenr:211713**

Prosjektstart: **19.05.2021 10:57:10**

Ledningseier **Alver kommune**

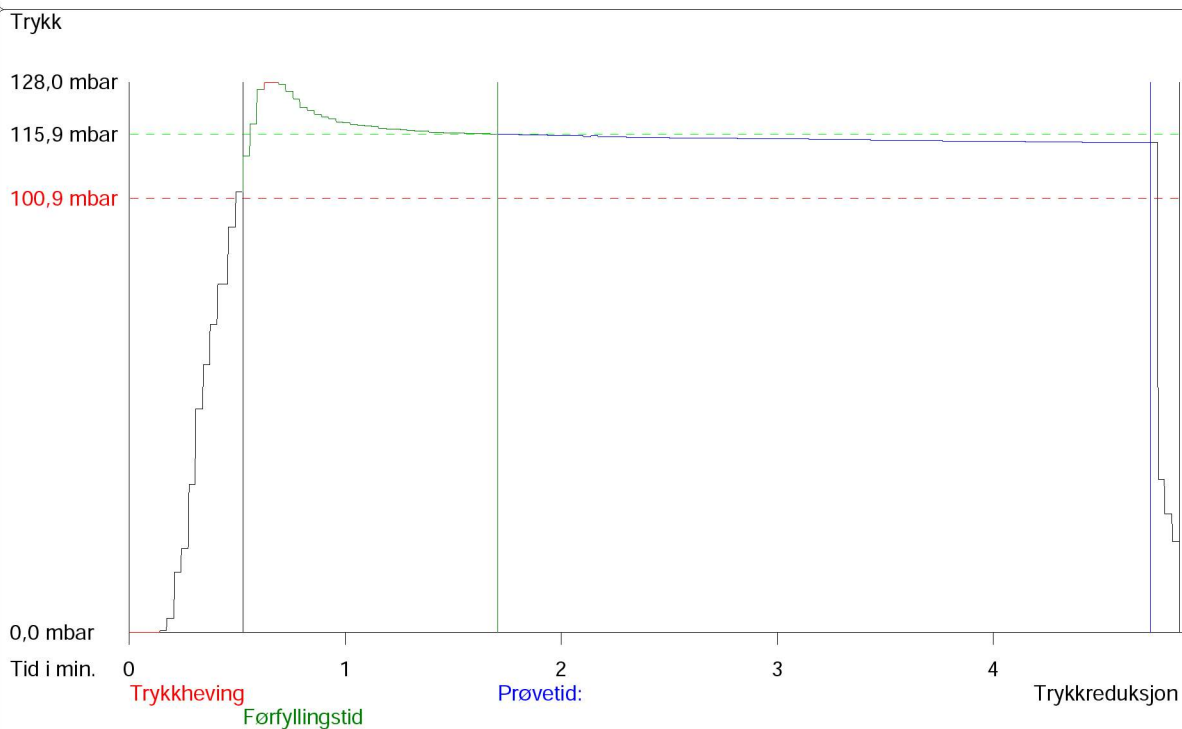
Siste endring: **19.05.2021 11:12:43**

Vitek Miljø AS

5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :123 Rør
Sælenveien 12
5151 Strausmgrend**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Sted	:		Tegningsnr.:	:	H1-B
Sted	:	Alversund	Strekn.nummer	:	SK6 - SK7
Adresse	:	Vardane	Fra	:	SK6
Operatør	:	02.Erlend Østigård	Til	:	SK7
Prøvetstyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:	25,0 m
Ordrenr.	:	1846	Rørprofil	:	Krets
Prøvedato	:	19.05.2021 11:12:43	Diameter	:	160 mm
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:	1
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:	Uten
Område	:	Rør			
Materiell	:	Polpropylen			
Bemerkning	:				
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:	26.02.2020
Godkjenning	:				

Prøvetrykk	:	115,9 mbar	Førfyllingstid	:	1:11 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	3:02 min
Faktisk trykktap	:	-1,9 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum		Prøving			
Prøvenr.	Strekn.numme	Fra	Sted	Norm	Prøvetrykk i mbar	Trykktap	
Prøvedato	Rør-Nr.	Etter	Adresse	Prosedyre	Lengde i mtr.	Resultat	
160							
1	SK6 - SK7	SK6	Alversund	EN 1610	100	-1,95	
19.05.2021 11:12:43	1	SK7	Vardane	Luft LC	25,0	Godkjent	
				Antall	1 Godkjent		
				Total lengde i m:	25,00		
