



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr.:	19 / 37194	Vedtak nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid i veg samt kryssing av veg				
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	27 februar 2019	Til dato:	29 mai 2019	Fra kl.:	07:00 Til kl.: 19:00
Annet:	Man - fred.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lysregulering ved behov.		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>			
30	40	50	60	70	80	90	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 27.02.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet Eikanger vassverk v/ Ivar Eidsheim - tlf. 9166 1261
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Tore Haaland e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Tore Haaland e-post: 97192485
- Ansvarshavende: Tore Haaland Tlf./e-post: 97192485
 Stedsansvarlig(e): Tore Haaland Tlf./e-post: tore.haland@yahoo.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Nettbuss
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem:
 Andre..... ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ved kryssing av vegbane graves halve vegbredden om gangen. Ingen vegstengning.
 Lysregulering på korte strekk ved behov.
 Ta hensyn til myke trafikanter.
 Bruk trafikkvakt ved behov.
 Åpne grøfter som forlates skal sikres ihh HB N3201 / 101.
 Unngå plassering av biler, maskiner eller materiell i vegens sikkerhetssone.
 Tilrettelegge for driftsentreprenørs vedlikeholdsoppgaver.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

27.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr.:	19 / 37194	Vedtatt nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid i veg samt kryssing av veg				
Utførende av arb. varsling*:	Tore Haaland				
Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim				
Ansvarshavende:	Tore Haaland	Tlf./e-post:	97192485		
Stedsansvarlig(e):	Tore Haaland	Tlf./e-post:	tore.haland@yahoo.no		
Arbeidet utføres fra dato:			27 februar 2019	Til dato: 29 mai 2019	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterielt:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	1098 Bl lykt Godkj sikr	2 et behov
	906	30
	Vakt	1

Merknader:

Graving ved veg, Grøft for VA og fiber


Bruk 1098 Blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

Korte arbeidsområder om gangen.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:

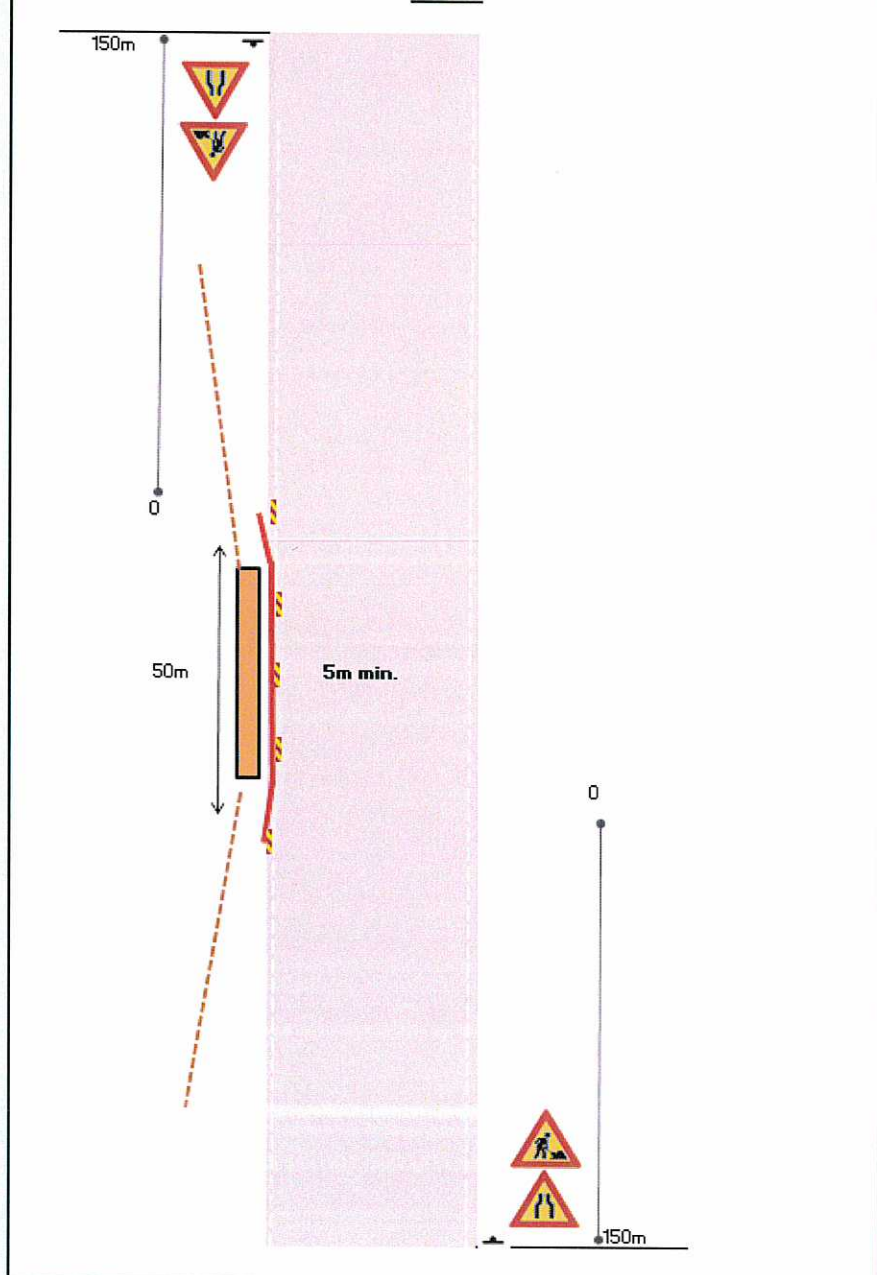

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

A. Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr.:	19 / 37194	Vedtaks nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid i veg samt kryssing av veg				
Utførende av arb. varsling*:	Tore Haaland				
Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim				
Ansvarshavende:	Tore Haaland			Tlf./e-post:	97192485
Stedsansvarlig(e):	Tore Haaland			Tlf./e-post:	tore.haland@yahoo.no
Arbeidet utføres	fra dato:	27 februar	2019	Til dato:	29 mai 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110 2
	106.1 2
	906V/H et behov
1098 BI lykt	2
Godkj sikr	et behov
	Vakt 1

Merknader:

Graving ved veg, Grøft for VA og fiber
Vegen blir ikke sperret.


Bruk 1098 Blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Bruk godkjent sikring i kombinasjon med 906 et behov. (ihh HB N301 / 101).

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune

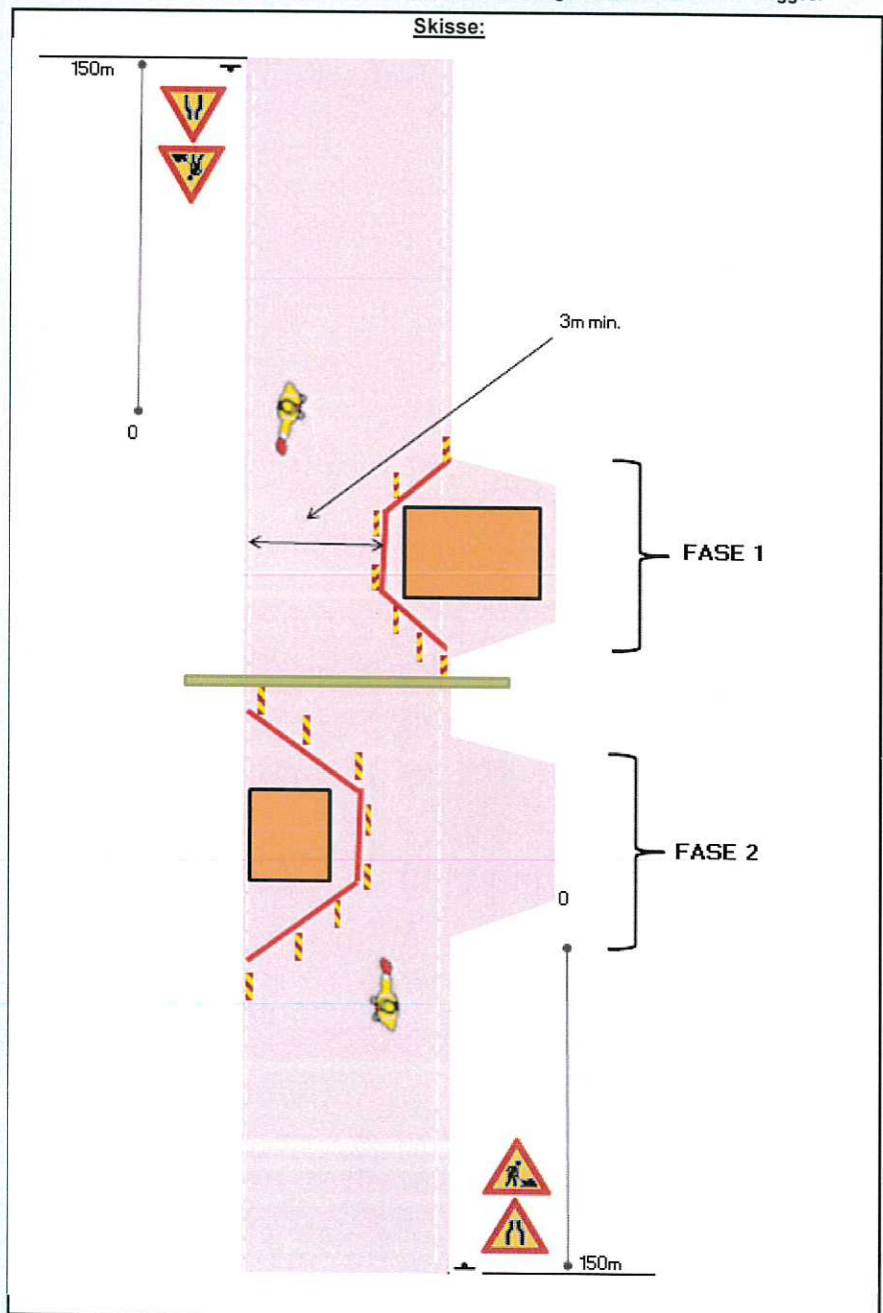

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

A. Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr.:	19 / 37194	Vedtak nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid i veg samt kryssing av veg				
Utførende av arb. varsling*:	Tore Haaland				
Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim				
Ansvarshavende:	Tore Haaland	Tlf./e-post:	97192485		
Stedsansvarlig(e):	Tore Haaland	Tlf./e-post:	tore.haland@yahoo.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	27 februar	2019	Til dato:	29 mai 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:		
Skilt nr.:	Ant.:	
	110	2
	132	2
	560	2
	906	et behov
1098 BI lykt	2	
Godkj sikr	et behov	
	Vakt	1

Merknader:

Graving ved veg, Grøft for VA og fiber

Utstrekning lysregulering skal være kortest mulig. (Ref. HB N301 pkt. 3.4.3.3). Skal kun brukes ved absolutt behov.


Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved plassering av skilt og lysregulering.

Jevnlig tilsyn med batteri for lysregulering.

Bruk 1098 Blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

Lysregulering skal ikke benyttes der det er tilstøtende veger.

Blankettfordeling:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune

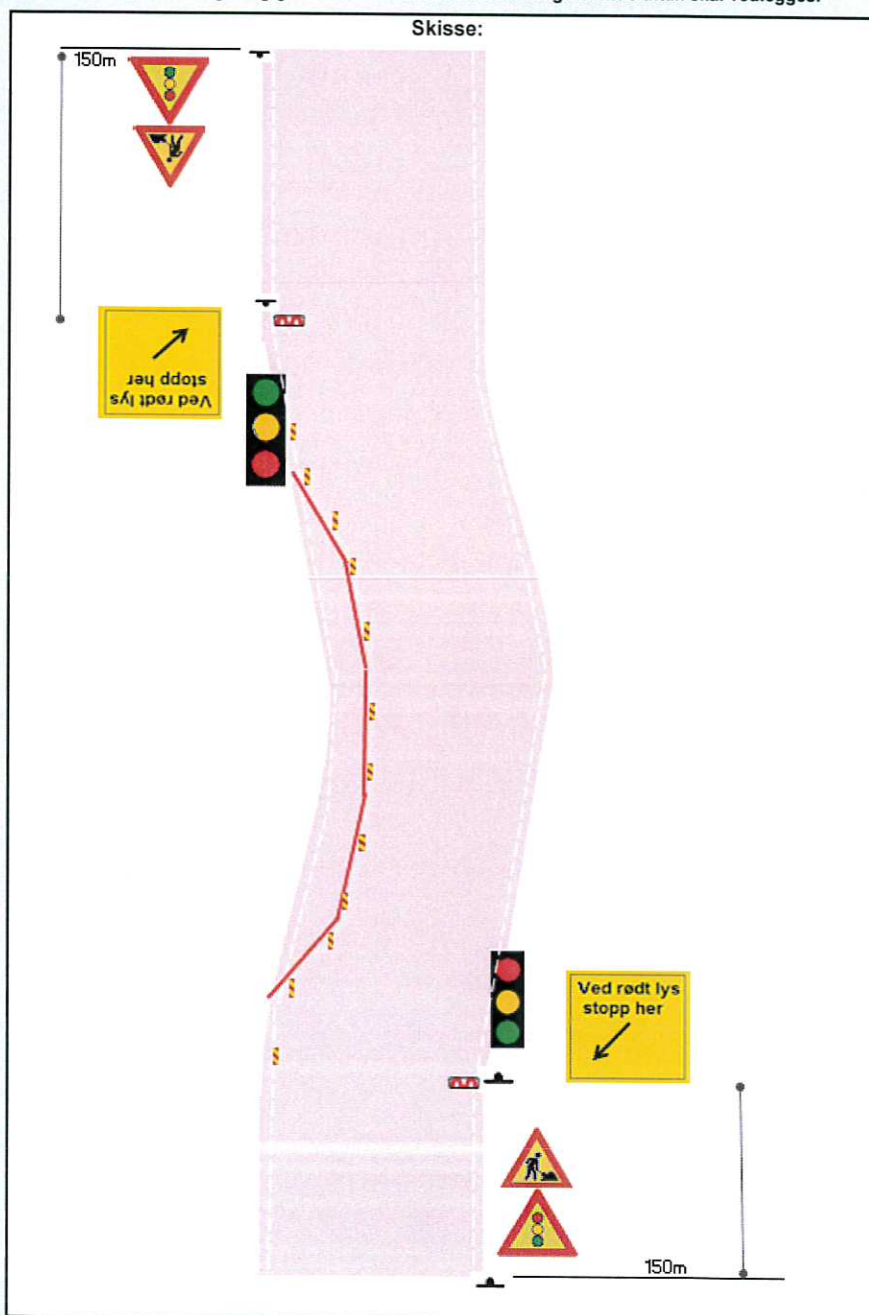

Fylles ut av skiltmyndigheten:		Statens vegvesen	
Bergen	27.02.2019	Arve Løvteit	
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*	

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr.:	19 / 37194	Vedtak nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid i veg samt kryssing av veg				

Ansvarshavende: **Tore Haaland** Tlf./e-post: **97192485**

Utførende arb.v.*: **Tore Haaland** Adresse: **Leikvoll, 5943 Austrheim**

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	27 februar 2019	Til dato:
	29 mai 2019	3 mnd i perioden

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Utplussing av midlertidige skilt	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Påkjørsel	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Fotgjengere ut i vegbane	Stor: 3	Stor: 3	
Møteulykke	Middels: 2	Middels: 2	
Naboer	Liten: 1	Liten: 1	
Innsnevring av veg	3	2	6
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Arbeidere blir påkjørt ved utplussing av midlertidige skilt	3	2	6
2: Biler inn i arbeidsområde.	3	2	6
3: Fotgjengere blir presset ut i vegbane grunnet innsnevring på veg.	3	2	6
4: Frontkollisjon grunnet innsnevring	2	1	2
5: Innkjøring / utkjøring til private sideveger i Myking vegen blir sperrert ved grøftarbeid	2	3	6
6: To biler klarer ikke å passere hverandre når grøft graves ved veg.	2	3	6
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Bruk av strobelys på bil ved utplussing av skilt. Sidemann sitter ut skilt
- 2: Varsling med skilt. Bruk av godkjent sikring.
- 3: Vaktmann leder fotgjengere trygt forbi arbeidssted.
- 4: Varsling med 110 samt 106.1 skilt. (Liten innsnevring)
- 5: Varsling av naboer før oppstart kryssing av privat veg med grøft
- 6: Bruk av lyssignal der tung sikring blir stående i veg.
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Tore Haaland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr.:	19 / 37194	Vedtak nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Ansvarshavende*:	Tore Haaland		Tlf./e-post:	97192485	
Utførende entreprenør:	Tore Haaland		Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim	
			(Ev.e-post)		
Utførende arb. varsling*:	Tore Haaland		Adresse:	Leikvoll, 5943 Austrheim	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	Org nr 960 684 648		(Ev. e-post:)	97192485	
Stedsansvarlig(e):	Tore Haaland		Tlf./e-post:	tore.haland@yahoo.no	
Arbeid som skal utføres*:	Graving av grøft for VA samt fiber. Arbeid i veg samt kryssing av veg				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	27 februar	2019	Til dato:	29 mai	2019
					3 mnd i perioden

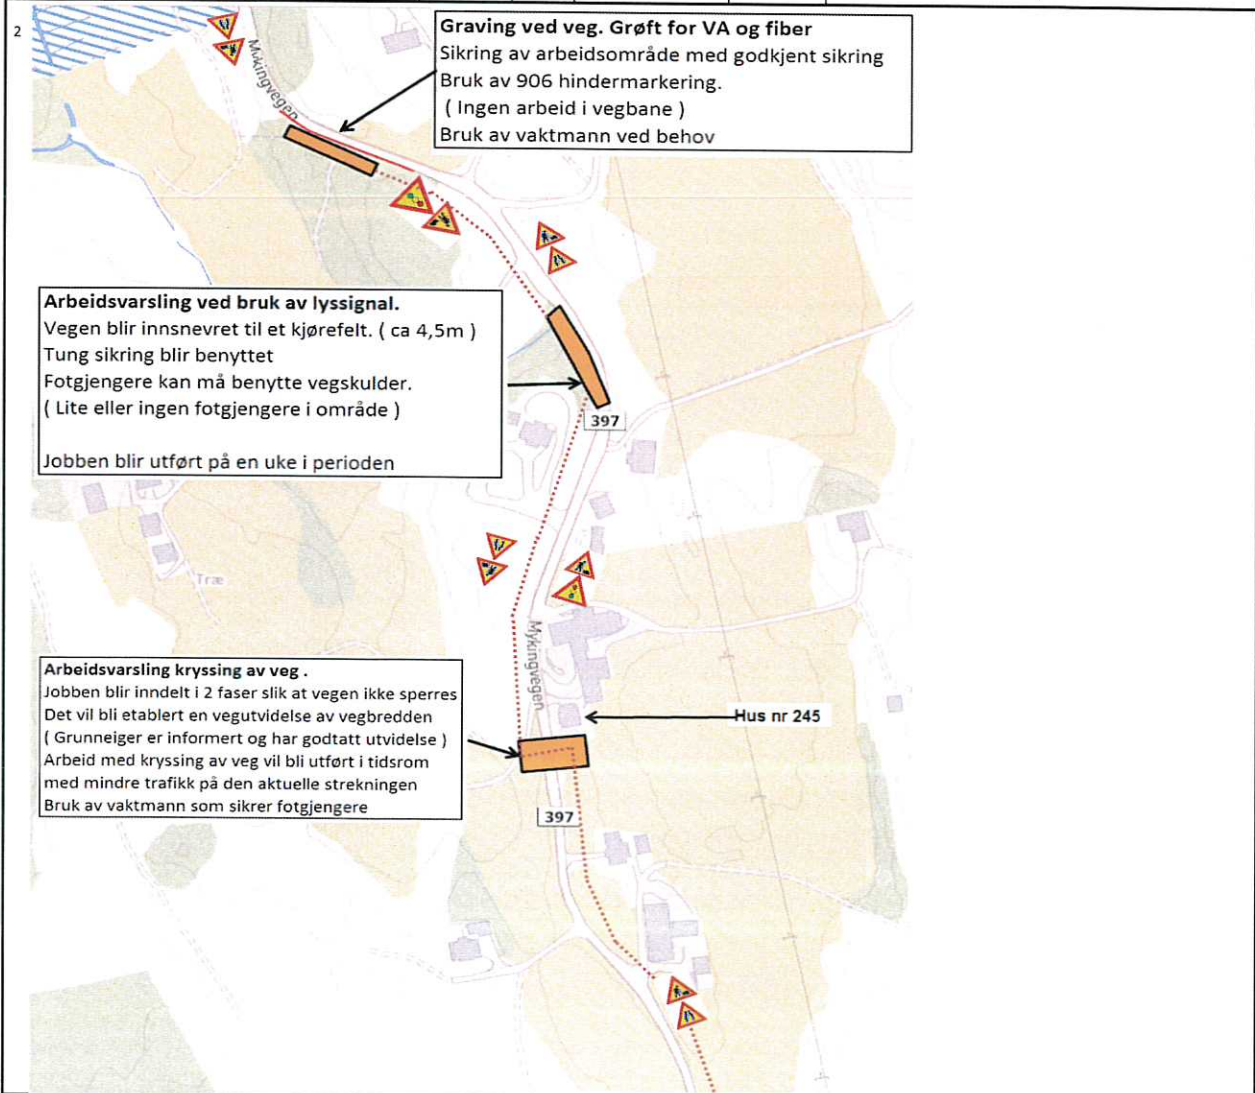



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9090-2019	Mime-nr:	19 / 37194	Vedtak nr.:	N9090-2019
Veg nr.:	FV 397	fra Hp/km:	01 / 2,701	til Hp/km:	01 / 3,215
Strekning:	Mykingvegen v/ Høyland - Lindås kommune			Sted:	Mykingvegen
Utførende:	Tore Haaland				
Ansvarshavende:	Tore Haaland				
Stedsansvarlig:	Tore Haaland				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

