

Saksbehandlar: Teknisk drift/Linda Folkestad

Vår referanse: 18/2412 - 19/31858 / Gbnr-137/573

Dato: 28.10.2019

Internt notat

Emne: Uttale vedkomande søknad om ferdigmelding

Teknisk drift viser til førespurnad om uttale ferdigattest snuareal med tilhøyrande skråning og murar – gbnr 137/573.


I vår uttale har teknisk drift satt krav til tiltak. Iht til våre krav er to av vilkår ikkje stetta.

Punkt 2 i vilkår:

Mellom skråning og fortau skal det opparbeidast eit grøfteareal med ei breidde på minimum 1,0 meter. I søknad vart det opplyst om at det ikkje skulle etablerast mur langs kommunalt fortau. Murkant mot fortau er ikkje ei del av godkjenninga. Kommunalt grøft skal opparbeidast iht til gjeldande regelverk. Fall frå fortau skal gå frå 0 ved kant fortau til ei dybde på ca 30 cm ei avstand 1 meter frå fortauet. Murkant kan komme i konflikt med drift og vedlikehald av fortau og veggrøft.

Punkt 3 i vilkår:

Ny mur (ved veglysk) skal være etablert slik at den hindrer utrasing av masser mot veglysk og fortau. Vi ønskjer dokumentasjon på korleis natursteinsmur er fundamentert for å hindre utrasing.

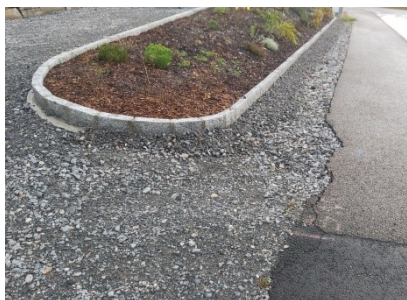

Linda Folkestad
