



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9079-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9079-2019
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,400	til Hp/km:	01 / 4,600
Strekning:	Helland - Sletta		Sted:	Hellandsvegen	
Arbeid som skal utføres: Fjerning av ferister					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	18 februar 2019	Til dato:	1 mars 2019	Fra kl.:	07:00 Til kl.: 17:00
Annet: Man - fre. Vegen kan bli stengt i inntil 2 timer når arbeidet utføres. (Nøyaktig dato kommer på Info-tavler før oppstart).					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124 Faks:	
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 12.02.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Straume Maskin AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Presis Vegdrift AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 906 60 320 / aha@pvdrift.no
 Stedsansvarlig(e): Robert Hjertås Tlf./e-post: 476 69 989
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Passering for buss i rute, taxi som frakter skoleelever, utrykningskjøretøy under utrykning.
Utrykningskjøretøy kan ringe stedsansvarlig - tlf. 476 69 989 for klargjøring for passering.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

12.02.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9079-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9079-2019
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,400	til Hp/km:	01 / 4,600
Strekning:	Helland - Sletta		Sted:	Hellandsvegen	
Arbeid som skal utføres:	Fjerning av ferister				
Utførende av arb. varsling*:	Presis Vegdrift AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Atle Hamre		Tlf./e-post:	906 60 320 / aha@pvdrift.no	
Stedsansvarlig(e):	Robert Hjertås		Tlf./e-post:	476 69 989	
Arbeidet utføres	fra dato:	18 februar	2019	Til dato:	1 mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:		
Skilt nr.:	Ant.:	
	110	4
1098 Bl lykt	4	
	362.50	etter behov
	802	etter behov
	364.50	etter behov
	930	4
	906	etter behov
	560	3

Merknader:


Se også arkfane "Tilleggsopplysninger".

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Blankettfordeling:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Radøy kommune

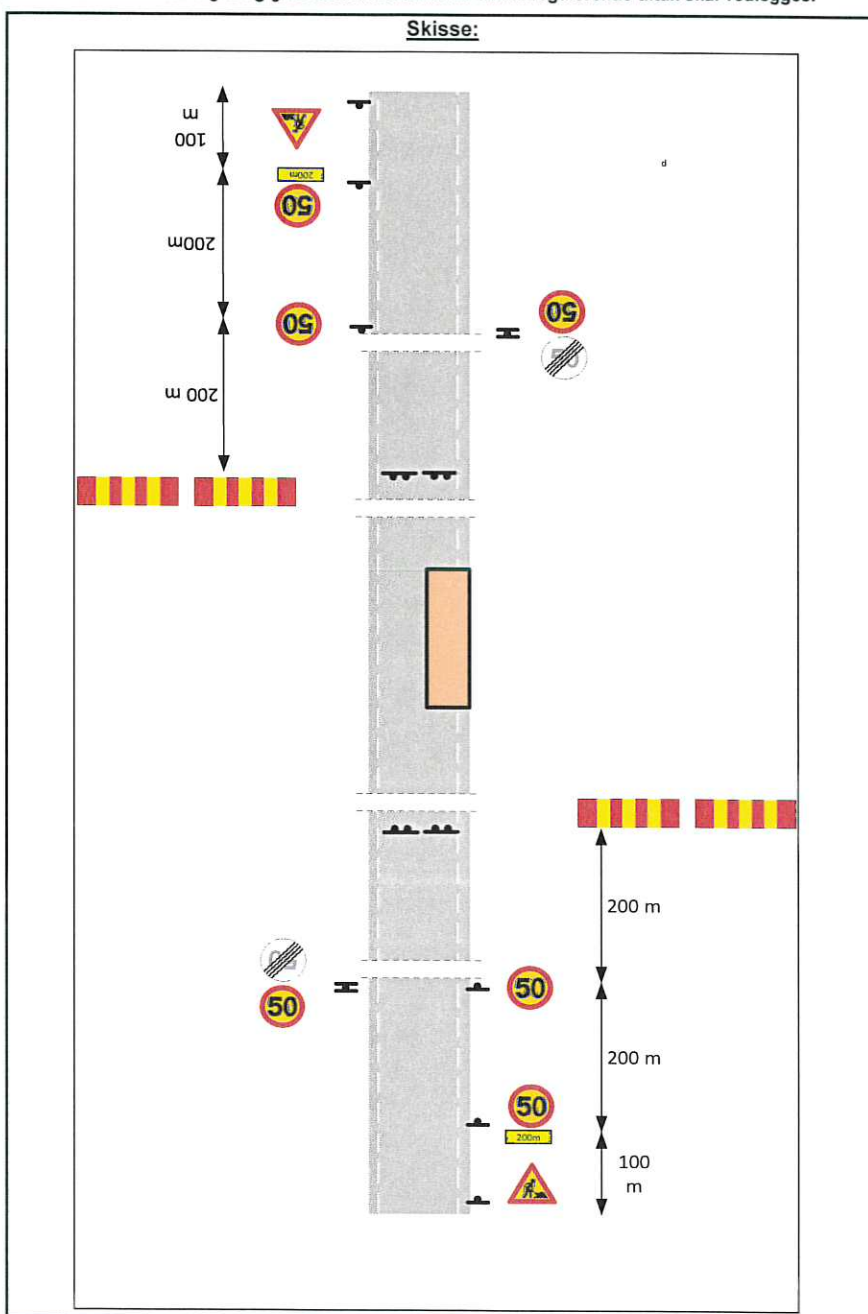

Fylles ut av skiltmyndigheten:		Statens vegvesen	
Bergen	12.02.2019	Arve Løvteit	
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*	

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9079-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9079-2019
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,400	til Hp/km:	01 / 4,600
Strekning:	Helland - Sletta			Sted:	Hellandsvegen

Arbeid som skal utføres: Fjerning av ferister

Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 906 60 320 / aha@pvdrift.no

Utførende arb.v.*: Presis Vegdrift AS Adresse: 0

Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	18 februar	2019	Til dato:	1 mars	2019
					07:00 - 17:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Påkørsel	Konsekvens:		Sannsynlighet:		Risiko = K x S
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:		Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?		
Vinter	Stor:	3	Stor:	3	
	Middels:	2	Middels:	2	
	Liten:	1	Liten:	1	
		3		2	6
1: Arbeid langs veg		3		3	9
2: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling		3		3	9
3: Fare for påkjørsel av personell/maskiner av passerende kjøretøy		2		1	2
4: Glatt vegbane		2		2	4
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Sette ut arbeidsvarsling iht. plan
- 2: Være forsiktig og oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy. Bruke bil med varssellys som buffer.
- 3: Stopp i arbeidet når trafikken slippes gjennom arbeidsområdet
- 4: Kommunikasjon med brøyte-/strøenhet
- 5: _____
- 6: _____
- 7: _____
- 8: _____
- 9: _____
- 10: _____
- 11: _____

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Ta hensyn til busstider. Utrykningskjøretøy kan passere på kort varsel.

Skilting tilpasses område

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Hilde Kristin Iden bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N9079-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9079-2019
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,400	til Hp/km:	01 / 4,600
Strekning:	Helland - Sletta			Sted:	Hellandsvegen
Ansvarshavende*:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	906 60 320 / aha@pvdrift.no
Utførende entreprenør:	Straume Maskin AS			Adresse:	
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	Presis Vegdrift AS			Adresse:	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	914888794			(Ev. e-post:)	
Stedsansvarlig(e):	Robert Hjertås			Tlf./e-post:	476 69 989
Arbeid som skal utføres*:	Fjerning av ferister				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	18 februar	2019	Til dato:	1 mars	2019
					07:00 - 17:00

Skal skiftes ut 2 stk ferister etter bestilling fra St.V.V

- Fv 411 hp 01 km 3,662
- Fv 411 hp 01 km 4,382

Ved overgraving kan vegen bli stengt i inntil 2 timer.

Ingen bussruter på strekke, men må ta hensyn til taxi som kjører skolebarn.

Ligger klart plater/lastebil med grus dersom det kommer utrykningskjøretøy.

Vegen har omkjøringsmulighet

ÅDT :

- Fv 411 : 600

Fartsgrense :

- Fv 411 hp 01 / 3,662 : 80 km/t

- Fv 411 hp 01 / 4,382 : 50 km/t


Settes opp 3 stk info skilt:

- X Fv 565 / Fv 411 Sletta

- X Fv 411 / Fv 412 Helland og ved X Fv 409 / 411 ved Ishuset

Tekst på skilt :

Veg kan bli stengt inntil 2 timer i perioden xx.xx - xx.xx, kl. 07:00 - 17:00

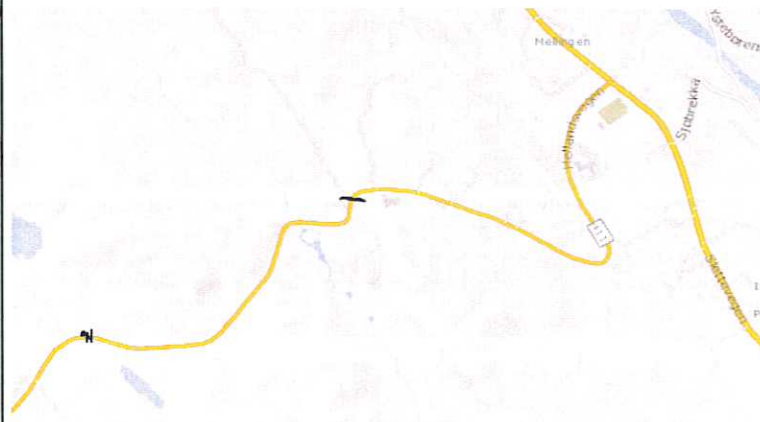



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9079-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9079-2019
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,400	til Hp/km:	01 / 4,600
Strekning:	Helland - Sletta			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fjerning av ferister				
Ansvarshavende:	Atle Hamre			Tlf./e-post:	906 60 320 / aha@pvdrift.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Presis Vegdrift AS			Adresse:	0
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	18 februar	2019	Til dato:	1 mars	2019

560 Infotavler : Når datoer for arbeidet er bestemt lages infotekst med dato for arbeidet.

Infotavler settes ut i rimelig tid før oppstart.

Bom settes opp der det er snumulighet.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9079-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9079-2019
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,400	til Hp/km:	01 / 4,600
Strekning:	Helland - Sletta		Sted: Hellandsvegen		
Utførende:	Presis Vegdrift AS				
Ansvarshavende:	Atle Hamre				
Stedsansvarlig:	Robert Hjertås				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

