



Ina Wergeland

Referanser:

Dykkar:

Vår: 17/84 - 17/11553

Saksbehandlar:

Line Merete Valle

line.merete.valle@lindas.kommune.no

Dato:

20.04.2017

Leiknes skule - referat frå tilbodssynfaring

Det vart halde tilbodssynfaring på Leiknes skule onsdag 19.april kl 0900

Frå Lindås kommune møtte Line Valle og Terje Fauske, prosjektleiarar frå Eining for Eigedom. Som byggherrens representant for tekniske fag stilte Helge Davidsen og Kjetil Lunde frå Multiconsult.

Det vart orientert om byggearbeida med tilbygg og tilhøyrande uteanlegg/parkering.

Følgande spørsmål vart notert undervegs:

- Arrondering av riggområde: Skal område brukt til rigg opparbeidast etter anleggstida?

Svar: Området for rigg (markert med gult i figur under) er ikkje spesielt nevnt i konkurransegrunnlaget og ikkje teikna inn som del av landskapsplan. Etter anleggstid må det påreknast at området må arronderast og jamnast til mot eksisterande murar og terreng. Det leggast duk og fyllast på med reine massar av grus, dim 0-16.

- Er det satt grenseverdi for rystelsar på bygget?

Svar: I forhold til vibrasjonar og støt viser vi til NS 8141 : 2001.

Utgåve 2012 er trukke tilbake for dette temaet.

Grenseverdier vil slik kunne setjast av geoteknisk prosjekterande.

Ansvar for denne prosjekteringa ligg hjå totalentreprenør.

- Adgangskontroll på innvendige dører: Skal det vere adgangskontroll på nokre av dei innvendige dørene?

Svar: Ja, det er behov for adgangskontroll på dørene i begge endar av korridor 111. Sjå elles bok 4 Elektrolog

- Bilete av eksisterande ventilasjonsrom på loft, sjå eige vedlegg. Sprinkleranlegg på loft i eksisterande bygg må byggast om og tilpassast nytt påbygg.

Post

postmottak@lindas.kommune.no

Dokumentsenteret

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no

Telefon +47 56 37 50 00

Telefaks +47 56 37 50 01


Konto 3201.05.89311

Org.nr. 935 084 733



- Teikningar av eksisterande VVS-anlegg, el og sprinkling, sjå egne vedlegg
- Nye varmerør for tilbygget må førast opp i eksisterande sjakt. Sjå vedlegg med bilete for ventilasjon på loft og sjakt
- Kor mykje skal det sprengast for å få tilkomst til 2.høgda via gangveg?

Svar: Viser her til konkurransegrunnlag bok 1, kap 26 og 40.

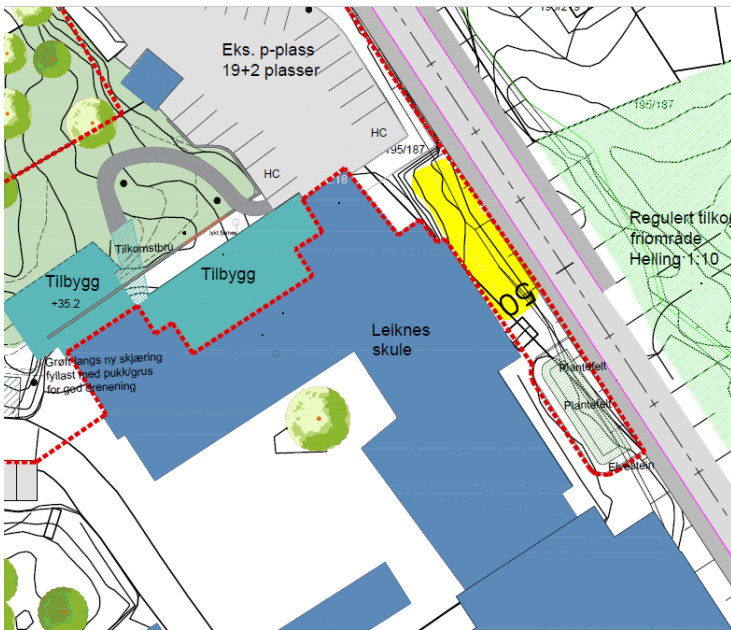

Figur 1: Område for rigg - markert med gult

Vedlegg:

- Tegninger –As built - Elektro
- Tegninger – Eksisterende – VVS
- Bilder av ventilasjonsrom og sjakt

Med helsing

Line Merete Valle
prosjektleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Ina Wergeland
