



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8067-2018	Sak/Sveis nr:	18/495	Vedtaks nr.:	N8067-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 4,730	til Hp/km:	01 / 4,930
Strekning:	Osterreidet-Nesbø - Askeland sør - Lindås kommune			Sted:	Stranda
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengje bøkkeløp				
Entreprenør:	Presis Vegdrift AS				
Adresse:	Kvassnesvegen 32	5914 Isdalstø	kenneth.hermansen@presisvegdrift.no		
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen		Tlf./e-post: 45204765		
Stedsansvarlig(e):	Atle Fjellby		Tlf./e-post: 90629475		
Arbeidet utføres	fra dato:	29 januar	2018	Til dato:	8 februar 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	110	2
	106.1	2
	906	Etter Behov
	362.50	6
	364.50	2
		2

Merknader:

Dag arbeid 07:00-15:00

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved skiltplassering.


Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Bruk trafikkvakt ved evt behov.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:

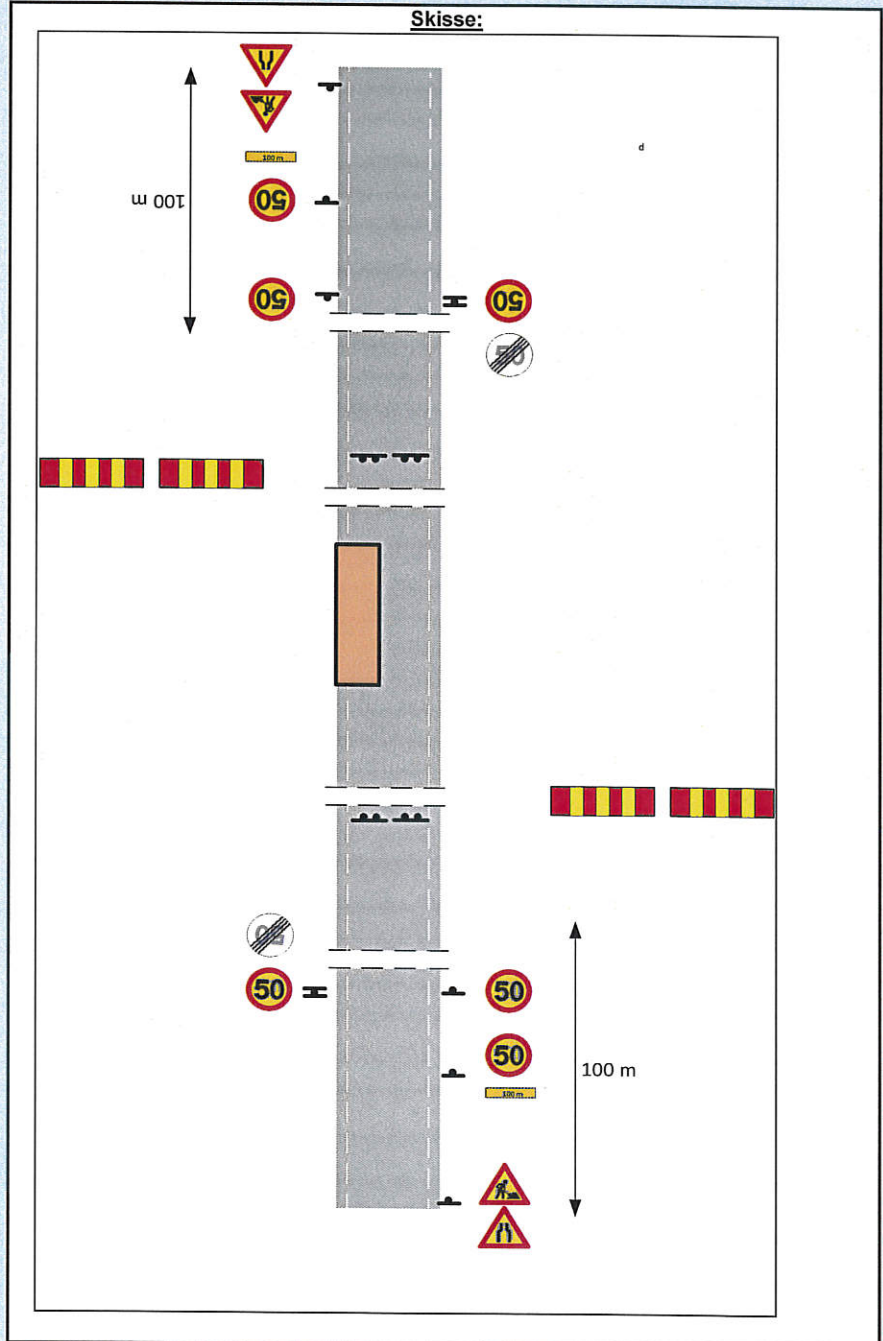

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

17.01.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvveit

Arve Løvveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N8067-2018	Sak/Sveis nr:	18/495	Vedtak nr.:	N8067-2018
Veg nr.:	Fv. 394	fra Hp/km:	01 / 4,730	til Hp/km:	01 / 4,930
Strekning:	Osterreidet-Nesbø ved Askeland sør- Lindås kommune		Sted:	Stranda	
Arbeid som skal utføres:	Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengning bekkeløp				
Ansvarshavende:	Kenneth Hermansen		Tlf./e-post:	45204765	
Entreprenør:	Presis Vegdrift AS		Adresse:	Kvassnesvegen 32	
Arbeidet utføres i perioden			5914 Isdalstø		
Fra dato:	29 januar	2018	Til dato:	8 februar	2018
					E-post: kenneth.hermansen@presisvegdrift.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling.	2	1	2
2: Fare for påkjørsel av myke trafikkkanter	2	1	2
3: Fare for fallende gjenstander	2	1	2
4: Klem fare	2	1	2
5: Sprenging	1	1	1
6: Oppbevaring av dynamitt	1	1	1
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Være oppmerksom på trafikken ved utsetting av arbeidsvarsling
- 2: Være oppmerksom på myke trafikkkanter i arbeidsområdet
- 3: Bruke vakt poster under sprenging og synlig rent arbeidstøy klasse 3
- 4: Bruke godkjent verneutstyr
- 5: Vakter plassert ut ved sprengings arbeid/stenging i kort periode inntil 15-20 min
- 6: Merking av godkjent tilhenger med "explosive-klistremerker" (tilhenger skal alltid være låst)
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Vi skal skifte ut 1stk stikkrenne på 800mm og må grave opp hele vegbredda

Rørene er 15 meter lange totalt ca. Må sprengning for bekke innløp

E.Nyheim står for sprengning tlf.95220312

Det blir stengt i korte perioder ved oppgraving og sprengning

Trafikk kan ledes forbi da vegen er bred her. (når dette lar seg gjera)Rutebil og utrykning får passere.

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 17.01.2018		
Plan nr.: N8067-2018 Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: N8067-2018		
Veg nr.: Fv. 394 fra Hp/km: 01 / 4,730	til Hp/km: 01 / 4,930		
Strekning: Osterreidet-Nesbø ved Askeland sør- Lindås kommune	Sted: Stranda		
Arbeid som skal utføres: Utskifting av 1 stk 800mm stikkrenne og sprengne bekkeløp			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 29 januar 2018	Til dato: 8 februar 2018	Fra kl.: 07.00	Til kl.: 15.00
Entrepr./off.etat: Presis Vegdrift AS	Adr.: Kvassnesvegen 32	5914 Isdalstø	
Ansvarshavende: Kenneth Hermansen	Tlf./e-post: 45204765		

Vegens tilstand under arbeidet


Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input checked="" type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>

Dette på grunn av:

Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>

Merknader:

Vegen kan bli stengt i noen korte perioder på inntil 15 min. Det meste av tida vil trafikken kunne passere.

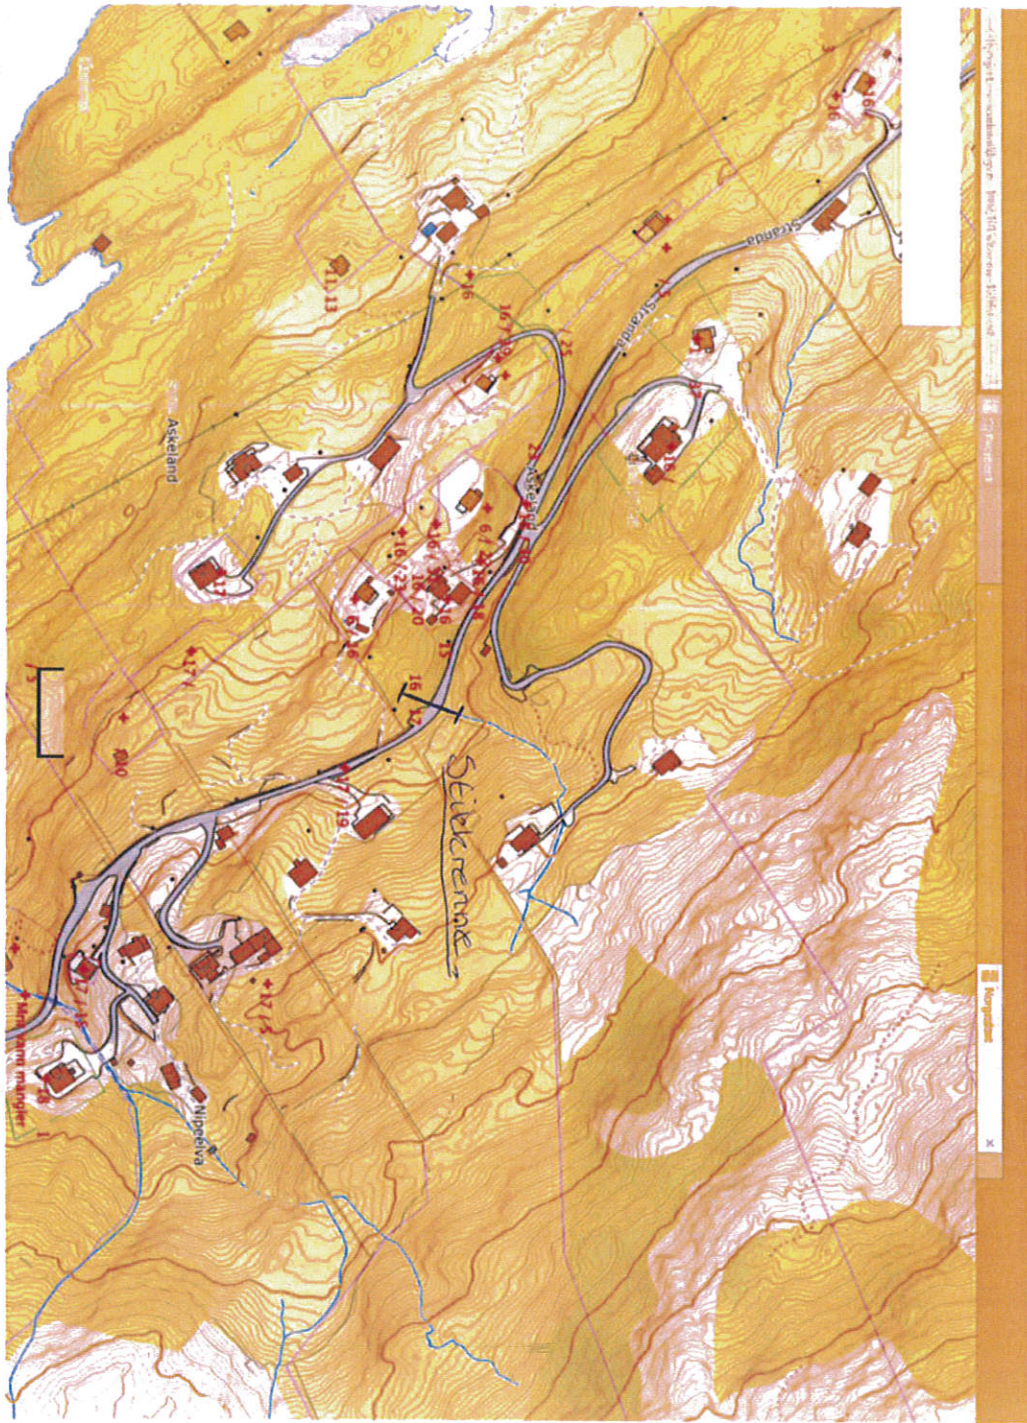

Statens vegvesen

