



Mur . Sørn.

Toska 8/3-14

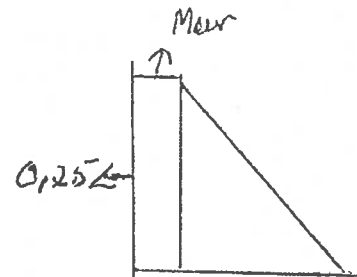

Forstötning mur
2 stk

Begge murer blir støpt med dobbel armering og fotbatter. Drenering i bunn 200mm rø. Bli fyllt opp med 50cm reine masser (drenerende). Resten med sprengstein og jord.

Ove Toska
