

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: KV1238 Hp.: 2 Km: 0,064 - 0,162 Arbeidsstad: Isdalstøbakken 1-3

Arbeida gjeld:

Vassleidning Telekabel Avløpsleidning Anna: _____
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande delte:

Asfalt Brostein Grus Anna: _____

Frå eigedom Gnr.: 137 bnr.: 779 slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring: Omlegging av eksisterende VA og el kabler

Arbeidet er ønska oppstarta: 16.11.16 og venta avslutta: 04.01.17

Talet på kryssingar: _____ stk. Boring: ja, ved km: _____ nei

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: _____ m frå km: _____ til km: _____

Som eigar av og oppdragsgjever/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghalder. Eg godtek dei villkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjever/byggherre: Byggmester Markus AS

Adresse: Kokstaddalen 6 5257 Kokstad

Kontaktperson hos oppdragsgjever/byggherre: Fredrik Kristoffersen Tlf.: 940 19 834

Dato: 10.11.2016 Underskrift: Fredrik Kristoffersen

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravesladden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på sladden:

El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avløpsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grøntanlegg Anna: _____

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrørte paratar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre for arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følgje retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør: Tillestad Anlegg AS

Adresse: Hardangerveien 68 5224 Nesttun

Kontaktperson hos entreprenør: Roger Bjørndal Tlf.: 970 51 902

Dato: 09.11.16 Underskrift: Roger Bjørndal

Spesielle villkår, evt sjå baksida: Arbeid skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg" NKF nettverksgruppe Veg og Trafikk Hordaland Oktober 2016
 Kabel påvisning frå BKK og Geomatikk skal ligge føre for oppstart av

Graveløyve gitt

Graveløyve avslått

LINDÅS KOMMUNE
 Teknisk drift VVA
 Kommune / Eining

den 18 / 11 2016

dinda folkestad

Underskrift



Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Spesielle vilkår, forts. :

arbeid.

Graveløyet gjeld berre for/i kommunalt fortau.

Arbeid skal elles utførast som avtalt med
Arne Helgesen (avdelingsleiar vatn og avløp)

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Disse gjeld for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einskilde kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «*Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg*» skal sendast til den einskilde kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantiid gjeld tre år frå dato for ferdigsynfaring. Entreprenør / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveløyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre). Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellombels. Leidnings- og kabeleigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt fjeme det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar

Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetningsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulempar på leidnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen

Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen





Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Veg nr.: KV1238	fra Hp/km: 2/0,064	til Hp/km: 2/0,162
Strekning: Isdalstøbakken 1-3	Sted: Isdalstø	
Arbeid som skal utføres: Omlegging av VA og høyspent		
Ansvarshavende: Roger Bjørndal	Tlf./e-post: 970 51 902	
Entreprenør: Titlestad Anlegg AS	Adresse: Hardangerveien 68 5224 Nesttun	

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato: 16 november 2016	Til dato: 4 januar 2017	E-post: roger@titlestad.no
----------------------------	-------------------------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ^ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet: (= produktet)
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	
	Stor: 1	Stor: 1	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Grøft langs kjørebane 1,5 m dyp	2	2	4
2: Sammenstøt med anleggsmaskiner	3	1	3
3: Fotgjengere langs vei	1	2	2
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:






↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Montere varioguard med hindermarkering langs grøftetrase
- 2: Bygge anleggsvei og utføre alt gravearbeid på innside av sperret område
- 3: Stenge fortau, myke trafikanter bruker alternativ gangtrase
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Veginformasjon viser hastighet på 50. Strekket er skiltet til 30 sone

Varslingsmaterieil:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	106.1a	3
	Varioguard	100m
	Info plate	2
	810.H90	1
	810.V90	1


Merknader:

Varioguard



- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:

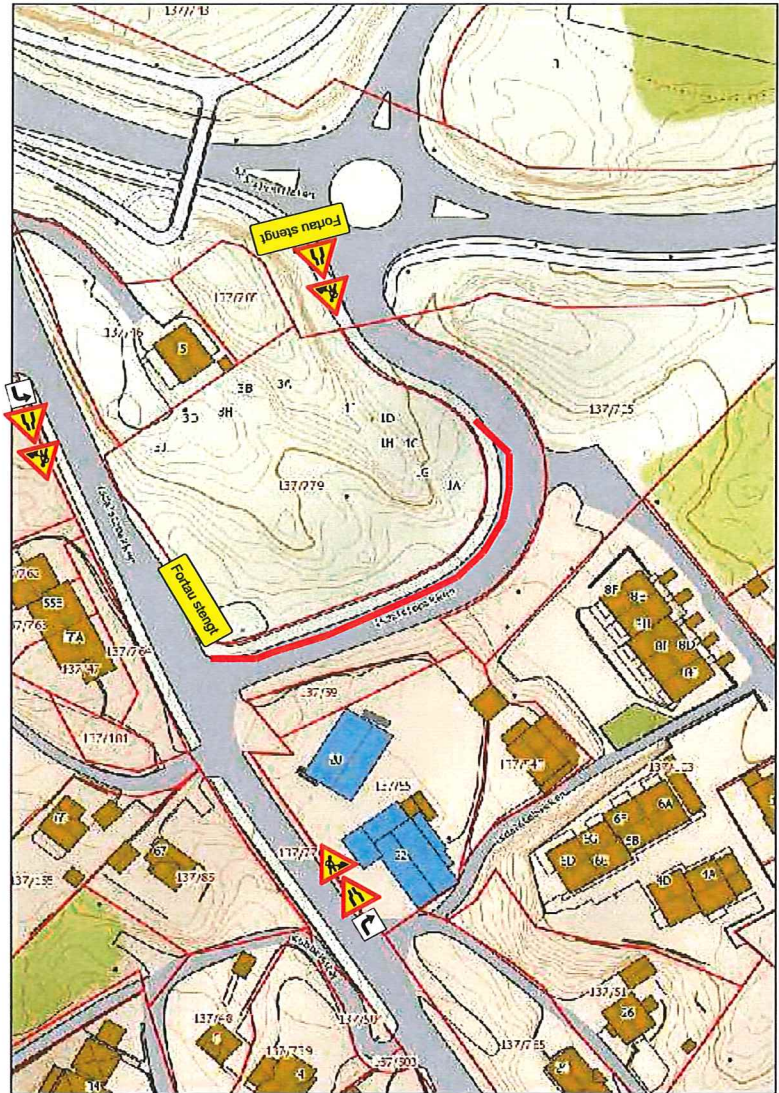

Fylles ut av skriftmyndigheten.
LINDÅS KOMMUNE
 Teknisk drift VVA

Knarvik 18.11.2016
 Sted Dato

for Atle Dingen
dinda Folkestad
 Sign. (etter fullmakt)

