

Vedlegg nr.

Q-1

Versjonsnr.



Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblankett 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdiggjøst. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	188 779				LINDÅS KOMMUNE		
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Kvernhusaugane				5914	ISDALSTØ	

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet (jf. TEK10 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK10 § 9-3).						
	PLAN		SLUTTRAPPORT			Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trervirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	30,000	25,700	Ragn-Sells			25,700
Papir, papp og kartong	1,500	0,460				0,460
Glass						
Jern og andre metaller	3,000	1,130				1,130
Gipsbaserte materialer	5,000	6,600				6,600
Plast	0,500	0,580				0,580
Betong, tegl, lett klinker og lignende	5,000					
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)	0,100					
Annet (fyll inn under)						
Sum sortert ordinært avfall	45,100	34,470				34,470
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)						
Annet (fyll inn under)						
Organisk avfall med haloge	0,500					
Maling, lim, fugemasse	0,200					

Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Ansl. mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall	0,700					
Blandet avfall / restavfall	30,000	13,200				13,200
Sum avfall i alt	75,800	47,670				47,670
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 10 § 9-8)	60,422					72,310
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)	31,715					19,946

Gjenstående avfall

Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Det gjenstår ca 1 tonn med trevirke og 1tonn med restavfall

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	–

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak		
Reiulf Ramstad Arkitekter AS		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Reiulf Ramstad / ANDERS TJØNNELAND	22808482	905 50 177 / 917 26 498
E-post		
reiulf@rra.no / anders@rra.no		
Dato	Underskrift	
5/9-2014	Anders Tjønneland	
Gjentas med blokkbokstaver		
ANDERS TJØNNELAND		

AVFALLSRAPPORT



6347439 7 Fjell Entreprenør AS

1 Knarvik Kirke

Vi bekrefter herved at Ragn-Sells AS har tatt imot følgende avfall og håndtert dette i tråd med de regler og konsesjoner som gjelder.

		15.01.2014 - 05.09.2014			
Fraksjon	Fraksjon Navn	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger Akk	Snitt pr. tømming	% av totalen
1149	Blandet bearbeidet trevirke	16,22	14	1,16	48,69%
1222	Ren papp	0,56	3	0,19	1,68%
1452	Blandede metaller	1,67	4	0,42	5,01%
1615	Gips	6,60	4	1,65	19,81%
1712	Folieplast, annen	0,26	1	0,26	0,78%
1731	Ekspandert og ekstrudert plast	0,18	1	0,18	0,54%
1799	Blandet plast, blandede fraksj	0,14	1	0,14	0,42%
9912	Blandet næringsavfall til sort	7,68	11	0,7	23,06%
Sum:		33,31	39	0,9	100%

Sorteringsgrad - 76,94%


AVFALLSRAPPORT

6347439 7 Fjell Entreprenør AS

1 Knarvik Kirke



Akkumulert periode

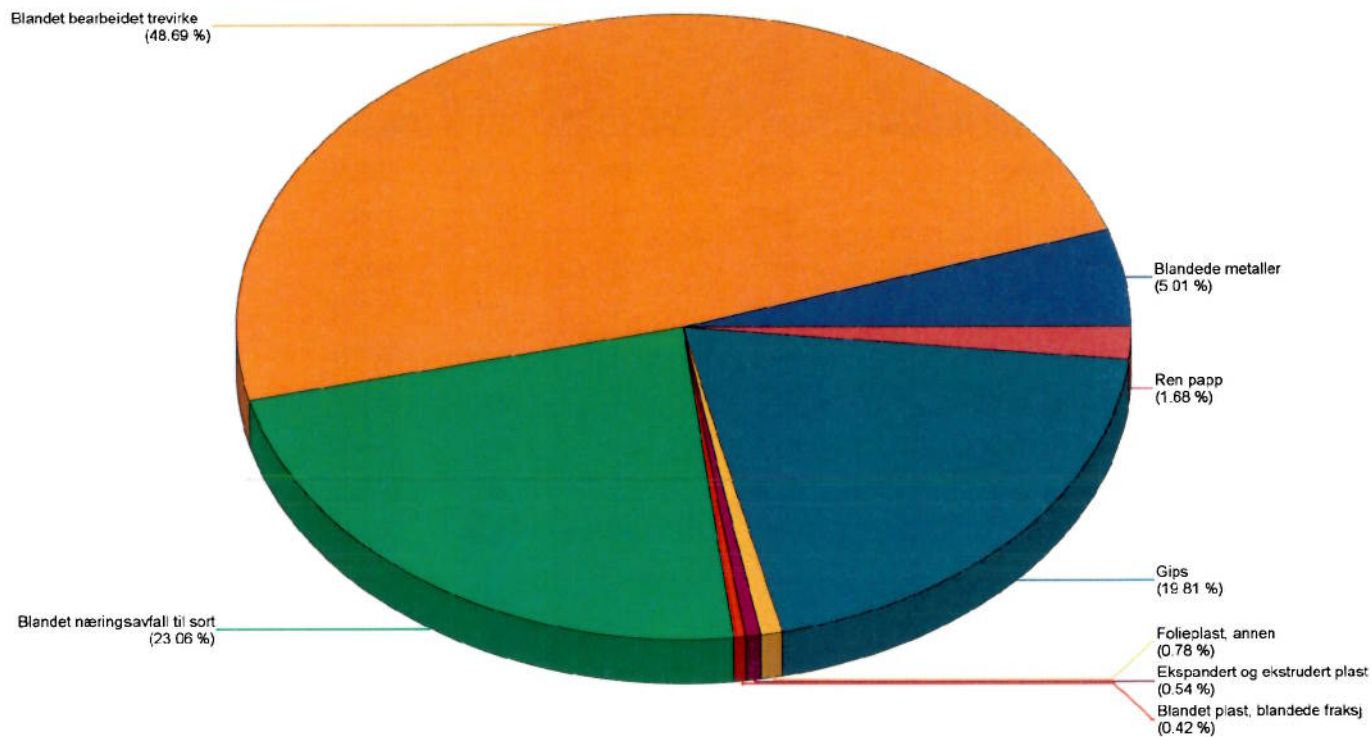

SLUTTRAPPORT



6330653 Walde Entreprenør AS

80 Knarvik Kirke P: 7032

Vi bekrefter herved at Ragn-Sells AS har tatt imot følgende avfall og håndtert dette i tråd med de regler og konsesjoner som gjelder.

		2013 05 - 2014 01			
Fraksjon	Fraksjon Navn	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger Akk	Snitt pr. tømming	% av totalen
1149	Blandet bearbeidet trevirke	9,480	6	1,580	63,20%
1222	Ren papp				
9912	Blandet næringsavfall til sort	5,520	6	0,920	36,80%
Sum:		15,000	12	1,250	100%

Sorteringsgrad - 63,20%


SLUTTRAPPORT

6330653 Walde Entreprenør AS
80 Knarvik Kirke P: 7032



Akkumulert periode

Blandet bearbeidet trevirke
(63.2 %)

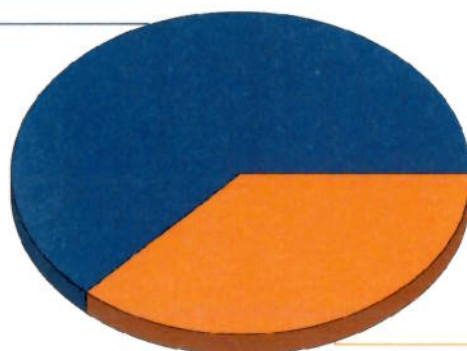

Blandet næringsavfall til sort
(36.8 %)
