

14/1480

02-April-2014

Lindås kommune v/ Teknisk drift  
Att: Linda Folkestad  
Kvernhusmyrane 20  
5914 Isdalstø

Deres ref.: 14/1480 – 14/3717

NG Meny Vest AS avd. Meny Knarvik  
V/Tommy Aalen  
Kvernhusmyraene 7a  
5914 Isdalstø

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
31.03.2014	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Saksnr.	Tilgangskode


Knarvik 20.03.14

## Innrapportering av fettutskiller

- Type fettutskiller/Produktsertifikat, se vedlegg nr. 1
- Størrelse på utskiller anlegg (kapasitet), se vedlegg nr. 1
- Beregningsgrunnlag – dimensjonering av spillvann/belastning. Grunnet samme størrelse på butikk og omsetning anser vi samme beregningsgrunnlag som i Safari, ca. 300 pors. pr. dg.
- Plassering av anlegg, se vedlegg nr. 2
- Tømmeavtale med godkjent tømmeoperatør, se vedlegg nr. 3
- Tømme- og vedlikeholdsrapport for de siste 2 år, se vedlegg nr. 4
- Dokumentasjon på hvem som har installert utskiller anlegg, se vedlegg nr. 5

Vedr. tømmeavtale har vi nå fornyet denne etter krav fra Lindås kommune. Antall tømminger i året øker fra 2 g. til 4 g. årlig. Ligger også ved ”gammel” avtale slik at man ser at vi har hatt dette også.

Hilsen



Tommy Aalen  
Kjøpmann  
Meny Knarvik  
Tlf. 988 41 873

E-post: [tommy.aalen@ngbutikk.net](mailto:tommy.aalen@ngbutikk.net)



## Produktsertifikat

Nr. 0555

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**Odin fettutskillere, type F-utv og F-innv,  
med og uten slamfang, kapasitet 1 – 15 l/s**

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1825-1  
SS 2333 og 2343

Innehaver av sertifikatet:

**Odin Maskin A/S**

Box 30  
1620 Gressvik

Produsent:  
Odin Maskin A/S  
1620 Gressvik

Utstedt : 28.02.2002  
Fornyet: 26.09.2011  
Gyldig frem til: 01.10.2016


Produsenten har kontrollavtale med Veritas



.....  
Knut Ivar Edvardsen  
Sertifiseringsleder

# Fettutskiller i rustfritt stål for utvendig nedgravd montering

Testet og godkjent iht. NS-EN 1825-1

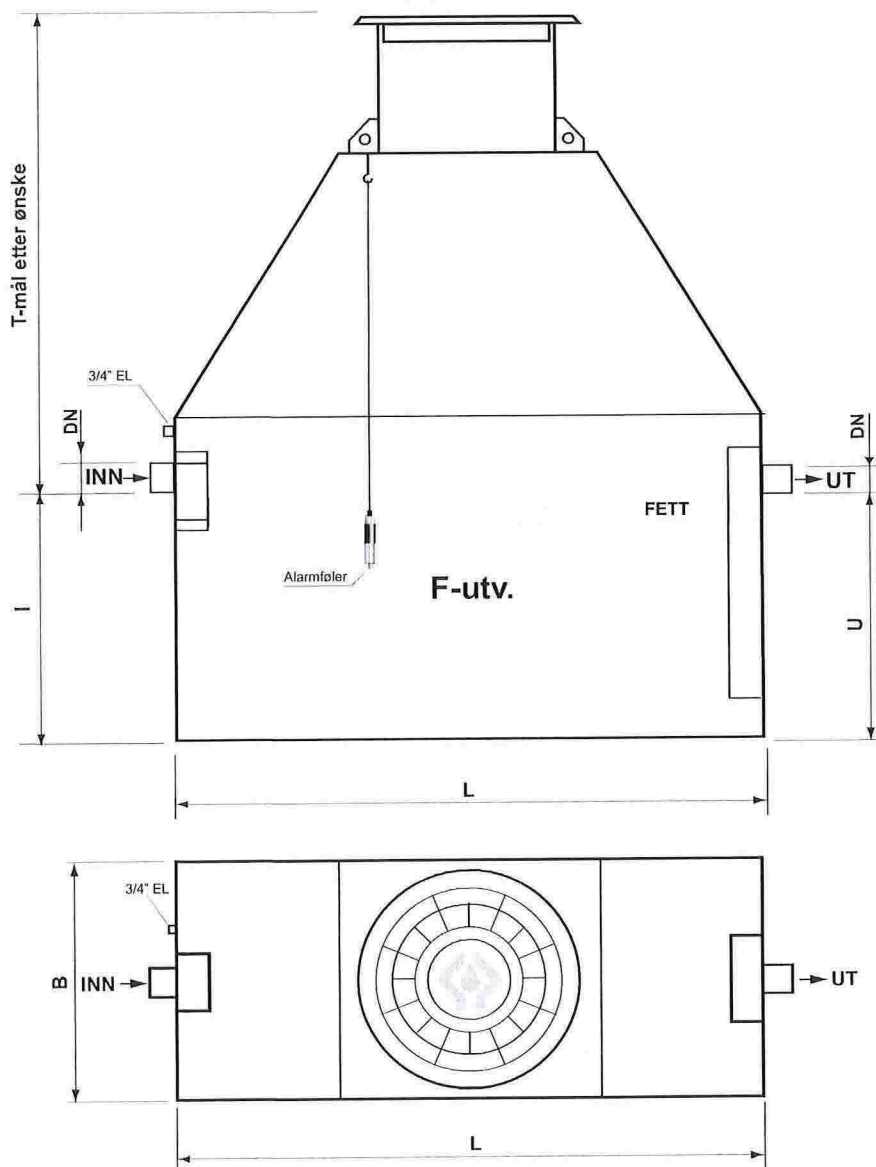

Fettutskiller for utvendig nedgravd montering i rustfritt stål, komplett med nedstigningssjakt i overflatebehandlet stål, samt gasstett kumlokk og flytende støpejernsramme. Utskilleren leveres med 3/4" mufte for trekkerør til alarmpøler. T-mål etter kundens ønske.

NRF-nummer	Maks. belastning NS l/s	Våt-volum liter	Lagringsvol. fett liter	L	B	I	U	T (etter ønske*)		Innløp og utløp	Ca. vekt kg
								Min.	Maks.		
838 46 53	2	600	80	1200	600	940	920	600	1600	DN100	160
838 46 55	3	860	120	1350	700	940	920	600	1600	DN100	190
838 46 57	4	1130	160	1800	700	940	920	600	1600	DN100	240
838 46 59	5	1450	200	1800	900	940	920	600	1600	DN125	270
838 46 62	6	1700	250	2100	900	940	920	600	1600	DN125	290
838 46 64	7	2000	280	2000	900	1190	1170	600	1600	DN150	310
838 46 65	8	2300	330	2100	1000	1190	1170	600	1600	DN150	340
838 46 66	9	2550	360	2250	1000	1190	1170	600	1600	DN150	360
838 46 69	10	2900	400	2550	1000	1190	1170	600	1600	DN150	400
838 46 71	12	3500	500	2550	1200	1190	1170	600	1600	DN200	480
838 46 73	15	4400	600	2550	1500	1190	1170	600	1600	DN200	550

#### Tilleggsutstyr:


- Prøvetakingskum i rustfritt stål Ø 400.
- Alarmsentral med lyd og lyssignal og med potensialfri kontakt for tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic NVD-111 med føler KVF-F.



**ODIN MASKIN AS**  
P.B. 30, SØRKILEN 8 - 1620 GRESSVIK  
Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 36 17 71  
E-post: epost@odin-maskin.no  
www.odin-maskin.no

## KOBLINGSSKJEMA

Skjemaet er tegnet i spenningsløs/alarmløst tilstand.  
NB! Kontroller innstilling av dip-switcher.

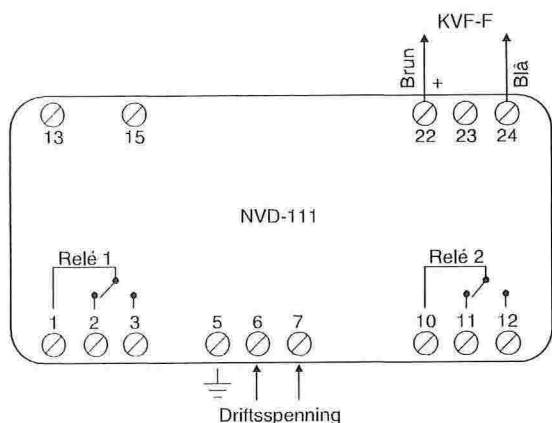

## INSTALLASJON

NVD-111 er beregnet til montering på DIN-skinne og kan derfor plasseres i fordelingskap eller i kapsling på et sentralt sted.

Produktet skal være spenningsløst når det installeres og når det utføres service.

## MONTERING AV FØLER

Før kabelgjennomføring til føler er det viktig at denne føretas over vannspeilet. Montøren borer selv hull i utskillervegg og monterer PG-nippel for gjennomføring.


## FØLERKABEL

Følerkabelen skal være minimum 2 x 1 mm<sup>2</sup>. Følerkabelen kan forlenges, men det må være maks en sløyfemotstand på 20 ohm for KVF føler.

Det anbefales en maksimal lengde på 500 m på KVF-føler.  
**NB! Følerkabel må ikke kuttes, men kveiles opp og stripses til festekrok i utskilleren før den skjøtes.**

Ved tekniske spørsmål kontakt Micro Matic Norge AS på tlf. 66 77 57 60.


## MONTERING FETTUTSKILLER INNENDIG

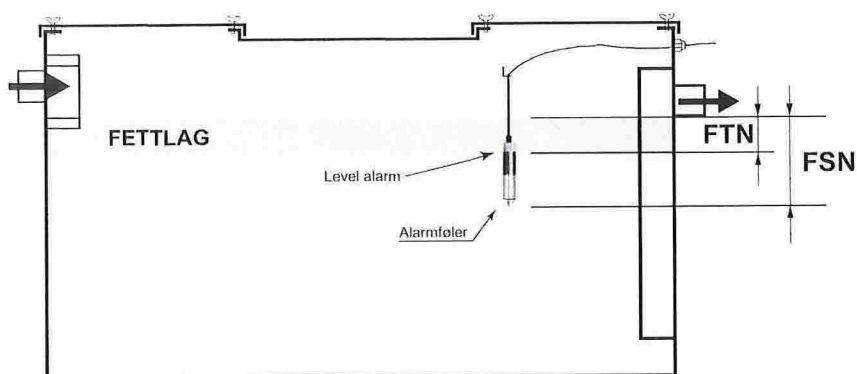

FTN = Fulltanknivå.  
Alarmer aktiveres når fettlaget dekker ned til «level alarm» på føleren.

FSN = Nivå mellom vannspeil og spissen på føleren.

## MONTERING FETTUTSKILLER UTVENDIG

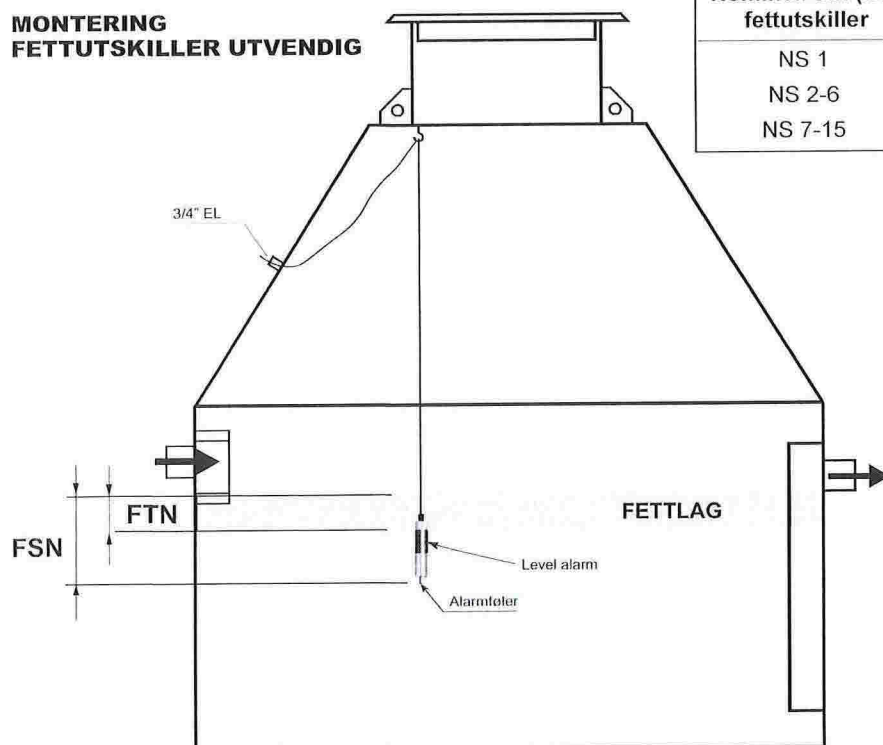

Tabell for monteringshøyde av føler:

Nominell str. (NS) fettutskiller	Fulltanknivå FTN (mm)	Følerspissnivå FSN (mm)
NS 1	80 mm	200 mm
NS 2-6	130 mm	250 mm
NS 7-15	160 mm	270 mm



**ODIN**  
**MASKIN** AS

*Alle varianter i*

- OLJEUTSKILLERE
- FETTUTSKILLERE
- MINIRENSEANLEGG
- GRÅVANNRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:

**ODIN MASKIN AS**

P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik

Telefon 69 36 17 70

Telefax 69 36 17 71

E-mail: [epost@odin-maskin.no](mailto:epost@odin-maskin.no)

[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

## **FETTUTSKILLERE TYPE ODIN**

### **ART. F-UTV. OG F-INNV. MED HETVANNSSPYLING**

ODIN MASKIN's fettutskillere er utstyrt med et system for spyling og tømning uten å måtte demontere lokket med den ubehagelige lukt det forårsaker.

Fettutskilleren er utstyrt med en 3/4" muffe. Herfra går et rør til et roterende spylehode som med stor kraft kaster det varme vannet rundt i utskilleren.

Fettutskilleren har også en 3" stuss for tømning. Herfra kan det trekkes rør ut gjennom f.eks. en vegg der det ved tømning tilkobles en slamsugebil.

NB! Romtemperatur bør ikke overskride 22°C.

#### **Følgende fremgangsmåte anbefales**

Varmtvannsslange tilkobles spylesystem. (Dette må ikke stå permanent tilkoblet.) Slange fra slamsugebil tilkobles.

- 1. Sug fettutskilleren tom.**
- 2. Åpne kranen for varmt vann og la det spyle i 3-4 minutter.**
- 3. Sug utskilleren tom.**
- 4. Kople fra det varme vannet. Steng innløpet (eventuelt kran/plugg).**
- 5. Frakoble sugeslangen fra bilen. Monter tetningskapsel.**

Utskilleren kan leveres med automatisk overvåkingssentral.

Skulle det være noen tvil om fremgangsmåten så KONTAKT OSS!

OLJEUTSKILLERE

FETTUTSKILLERE

MINIRENSEANLEGG

GRÅVANNRENSEANLEGG



# ODIN MASKIN AS

## Alle varianter i

- OLJEUTSKILLERE
- FETTUTSKILLERE
- MINIRENSEANLEGG
- GRÅVANNRENSEANLEGG

Hovedkontor, produksjon og service:

**ODIN MASKIN AS**

P.b. 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik

Telefon 69 36 17 70

Telefax 69 36 17 71

E-mail: [epost@odin-maskin.no](mailto:epost@odin-maskin.no)

[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

## DRIFTSINSTRUKS - FETTUTSKILLERE

### DRIFTSINSTRUKS/ montasjeanvisning for fettutskillere art. F-utv og F-innv.

Driftsinstruks for fettutskillere, levert av ODIN MASKIN AS. Utskillelne leveres i rustfritt stål.

Utskillelne er tilpasset skandinaviske forhold etter NS-EN 1825-1 og 2.

Vi leverer også utskillelne med påbygd slamfang. Alle modeller kan leveres for innvendig eller utvendig montasje.

Hvis ikke annet er angitt utføres nedenforstående anvisning hver annen måned.

I en innkjøringsperiode er hyppigere kontroll nødvendig da belastningen som utskillelren utsettes for varierer. Etter innkjøringsperioden kan en annen tømme- og driftsrutine en nevnt, vise seg nødvendig.

#### Nedstigning (for utendørs monterte utskillelne):

Sørg for sikring hvis utskillelren ligger i farbart område. Fjern mannlokket en tid før nedstigning, eller sørg for at det på annen måte er tilstrekkelig med oksygen tilstede for arbeid i utskillelren.

#### Slamfang (kan leveres sammenbygd eller separat til våre utskillelne):

Tømming skal foregå før slamfanget er halvfullt.

Tømming skal foregå før fettlaget utgjør ca. 15% av volumet i utskillelren, se egen tabell.

(Datablad for fettutskillel-alarml).

Alarmanlegg kan medleveres. Etter tømning og før videre igangsetting, bør slam og fettrester spyles bort.

Vedlikehold utføres så ofte som innkjøringserfaring og rutine tilsier. Inn- og utløpsanordning stakes før tilstopping.

#### Deponering av fett og slam:

Foretas etter anvisning fra Fylkesmannen eller Statens Forurensningstilsyn.

Tømming foretas fortrinnsvis med vakuumbvogn, manuell tømning kan ofte unngås ved opplegg som konstrueres spesielt for hvert enkelt tilfelle.

#### Montasjeanvisning for ODIN fettutskillelne:

**Utvendig montasje:** Utskillelgrøften gjøres i alle retninger minst 200 mm større enn konstruksjonens utvendige mål. Fettutskillelren skal stå støtt på et vatret sandlag før videre montasje. Rør monteres med fettresistente nitrilgummipakninger. Fyll utskillelren med vann før gjenfylling av grøften.

Ved vanskelige grunnforhold eller oppdriftsfare bør utskillelren forankres.

**Innendørs montasje:** Utskillelren skal stå i vater før den sammenkoples med rør, husk å benytte nitrilgummipakninger. Utskillelre utstyrt med spyle- og tømme anordning skal ha 3" separat tømmeledning ført frem til egen avtapningsstuss.

OLJEUTSKILLERE

FETTUTSKILLERE


MINIRENSEANLEGG

GRÅVANNRENSEANLEGG

# Fettutskiller i rustfritt stål

- det naturlige valget for restauranter og storkjøkken

Testet og godkjent  
etter NS-EN 1825-1

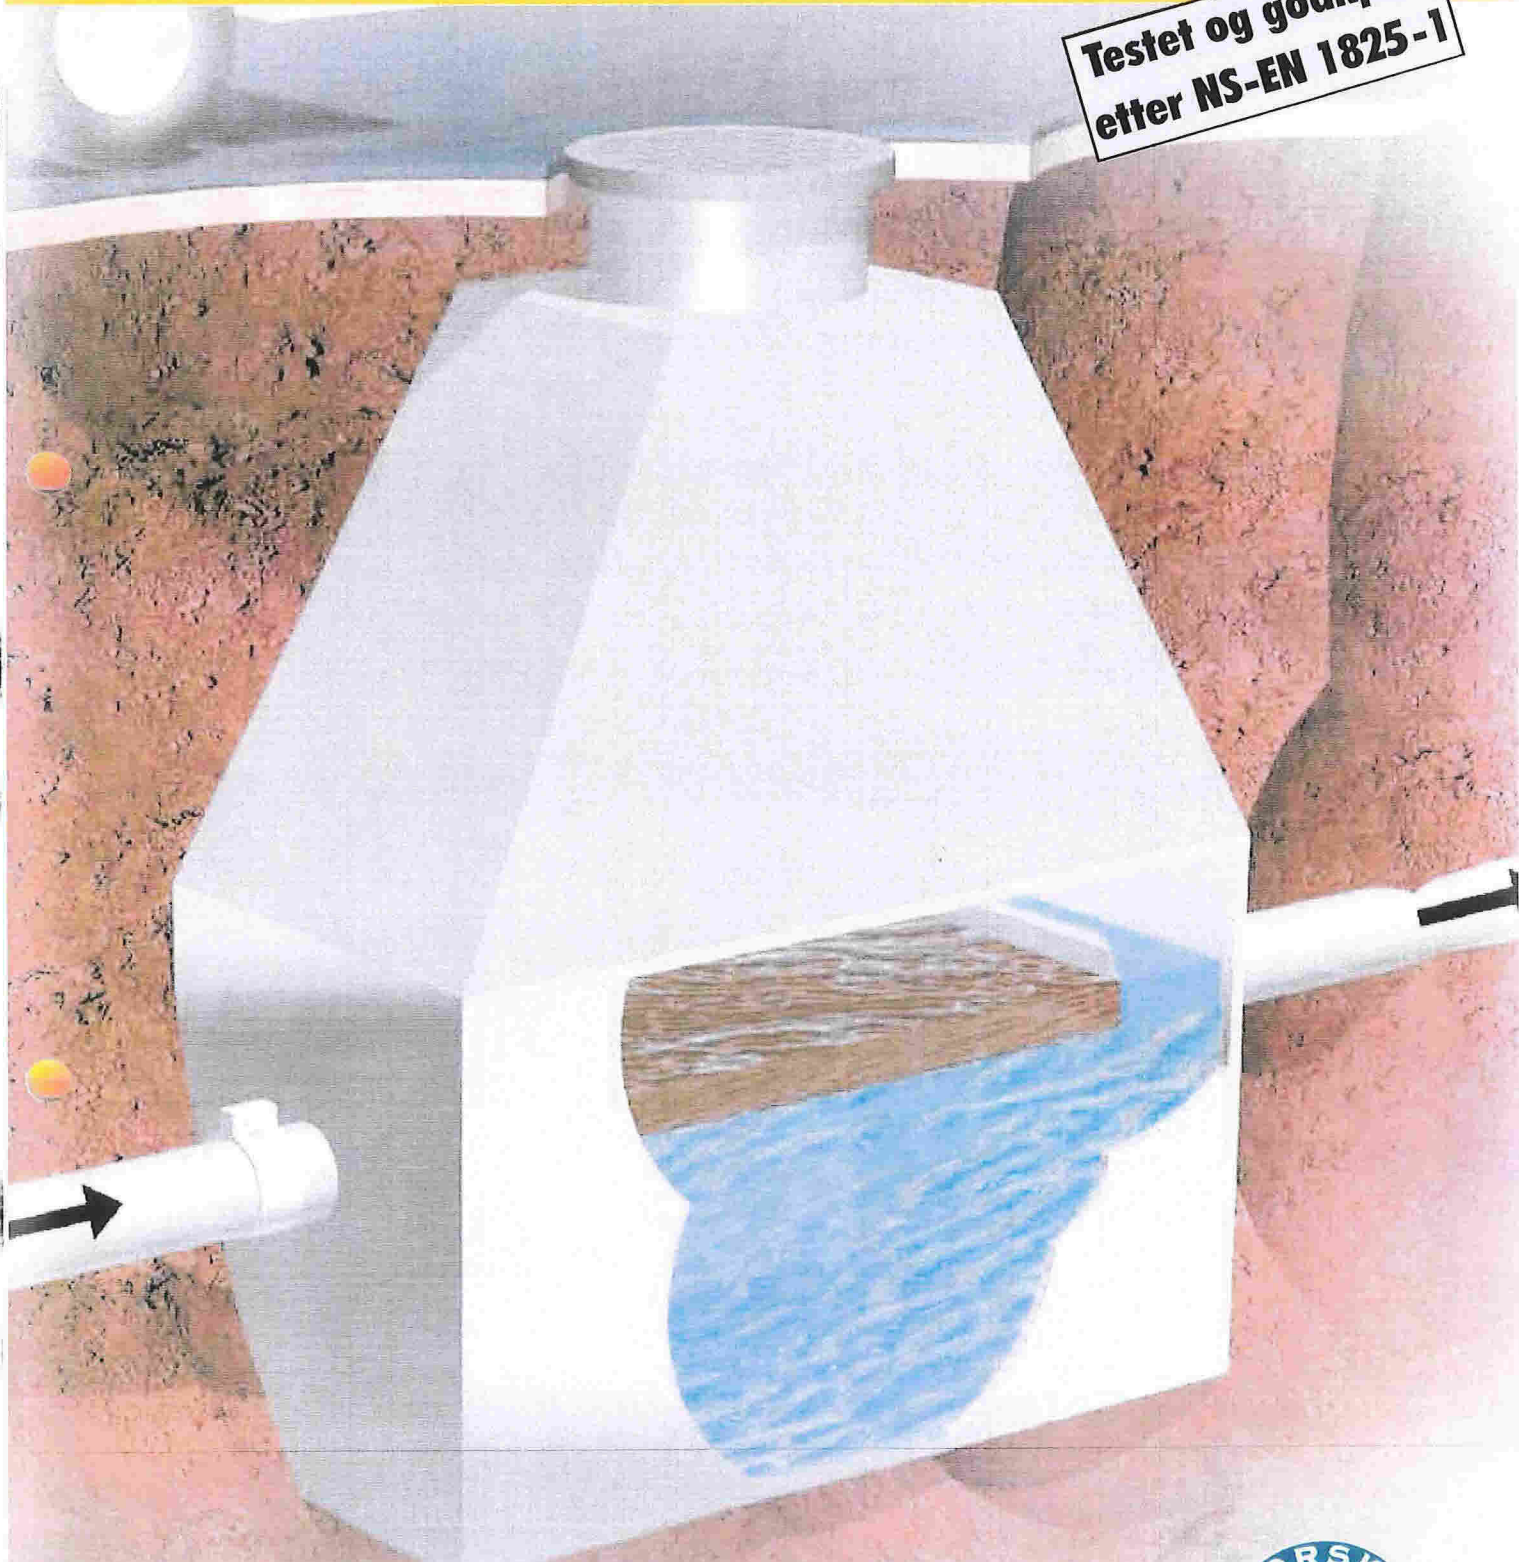

[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)

# Odin fettutskillersystem

## høy renseeffekt og 20 års garanti



### Fordeler med Odins fettutskillere:

- Norsk produsert.
- Godkjent av Byggforsk etter NS-EN 1825-1
- Testet av Dansk Teknologisk Institut.
- CE merket.
- Funksjons- og holdbarhetsgaranti.
- Leveres direkte fra produsent.
- Topp renseeffekt.
- Effektiv kjøling av væsken.
- Enkel montasje.
- Lav vekt.
- Konkurransedyktig pris.

#### KOMPETANSE:

Odin Maskin AS er sertifisert for prosjektering og dimensjonering av avløps-renselanlegg. Vi har produsert og levert utstyr for rensing av avløpsvann for fett, olje og kloakk i mer enn 30 år. Vi leverer hovedsakelig i Norge, men har også leveranser til Danmark og Sverige.

*Oljeutskillere - Fettutskillere - Minirensanlegg  
Gråvannsrensanlegg - Oljetanker - Samletanker*



**ODIN MASKIN AS**

Postboks 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik  
Telefon 69 36 17 70 - Telefax 69 36 17 71  
E-post: [epost@odin-maskin.no](mailto:epost@odin-maskin.no)  
[www.odin-maskin.no](http://www.odin-maskin.no)







# VEDLEGG NR.3

## Avtaledokument

1. PARTENE	
<b>Kunde:</b> NG Meny Knarvik	<b>Leverandør:</b> Norsk Gjenvinning Industri AS
<b>Organisasjonsnummer:</b> Org.nr.: 995 198 843 MVA	<b>Organisasjonsnummer:</b> 952070533
<b>Fakturaadresse:</b> NG Meny Vest AS avd. 10772 Meny Knarvik GLN: 7080003262981 Postboks 4782 Vika 8606 Mo i Rana	<b>Avtaleansvarlig:</b> Riccardo Malmgren
<b>Vareadresse:</b> Kvernhusmyrane 7A 5914 Isdalstø	<b>Telefon / Mobiltelefon:</b> +47 46 76 38 87 +47 56 31 64 52 Kundesenter: 09600
<b>Avtaleansvarlig:</b> Tommy Aalen	<b>E-Post:</b> <a href="mailto:Riccardo.Malmgren@norskgjenvinning.no">Riccardo.Malmgren@norskgjenvinning.no</a> Bestilling: <a href="mailto:Ngi.knarrevik@norskgjenvinning.no">Ngi.knarrevik@norskgjenvinning.no</a>
<b>Telefon / Mobiltelefon:</b> Mob. 988 41 873/Tlf. 56 35 74 03	
<b>E-Post:</b> <a href="mailto:Tommy.Aalen@ngbutikk.net">Tommy.Aalen@ngbutikk.net</a>	

2. AVTALENS FORMÅL
Avtalens formål er å dekke kundens behov for kostnadseffektive og miljøriktige løsninger og tjenester og regulere de forretningsmessige forhold mellom partene i forhold til dette.

3. AVTALENS OMFANG		
Tømming av Fettutskiller minimum 4 ganger pr år:	X	
Utførelse av driftskontroll og rengjøring:	X	
Innsendelse av årsrapport:	X	
Utførelse av driftskontroll og rengjøring:	x	

4. AVTALE PERIODE
Avtalen gjelder fra 09.01.2014 til- Deretter fornyes avtalen med 1 år av gangen, inntil en av partene sier den opp. Eventuell oppsigelse skal fremsettes skriftlig, med minimum 3 mnd. varsel

## 5. PRISER

Priser fremkommer av eget vedlegg som følger denne avtale

## 6. BETALINGSBETINGELSER / FAKTURERING

Betalingsbetingelse på faktura / kreditnota er netto pr. 30 dager fra fakturadato.  
Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd

## 7. BESKRIVELSE AV UTSTYR

Godkjent sugebil med tilhørende slanger og koblinger  
Temperaturmåler som ivaretar kommunens krav

## 8. BESKRIVELSE AV TJENESTE


Tømming av Fettutskiller minimum 4 ganger pr år  
Årlig driftskontroll og rengjøring av utskiller  
Innsendelse av årsrapport, logg fra temperaturmåling og kopi av Driftsjournal

## 9. ANDRE OPPLYSNINGER

Priser per time. Avtalen periode følger Norges Gruppen avtalen.

Avtalen er utstedt i 2 – to – likelydende eksemplarer, hvor partene beholder 1 – et – eksemplar hver.  
Dersom annet ikke er avtalt i denne avtalen gjelder våre generelle vilkår


Kunde: **MENY KNARVIK**



Signatur **TOMMY AALEN**

Sted / dato: **KNARVIK 28.03.14**

Leverandør: Norsk Gjenvinning Industri



Signatur Riccardo Malmgren

Sted / dato:



# VEDLEGG NR. 3

Gammel tømmeavtale

## Avtaledokument

1. PARTENE	
<u>Kunde:</u> NG Meny Knarvik	<u>Leverandør:</u> Norsk Gjenvinning Industri AS
<u>Organisasjonsnummer:</u> Org.nr.: 995 198 843 MVA	<u>Organisasjonsnummer:</u> 952070533
<u>Fakturaadresse:</u> NG Meny Vest AS avd. 10772 Meny Knarvik GLN: 7080003262981 Postboks 4782 Vika 8606 Mo i Rana	<u>Avtaleansvarlig:</u> Riccardo Malmgren
<u>Vareadresse:</u> Kvernhusmyrane 7A 5914 Isdalstø	<u>Telefon / Mobiltelefon:</u> +47 46 76 38 87 +47 56 31 64 52 Kundesenter: 09600
<u>Avtaleansvarlig:</u> Tommy Aalen	<u>E-Post:</u> <a href="mailto:Riccardo.Malmgren@norskgjenvinning.no">Riccardo.Malmgren@norskgjenvinning.no</a> Bestilling: <a href="mailto:Ngi.knarrevik@norskgjenvinning.no">Ngi.knarrevik@norskgjenvinning.no</a>
<u>Telefon / Mobiltelefon:</u> Mob. 988 41 873/Tlf. 56 35 74 03	
<u>E-Post:</u> <a href="mailto:Tommy.Aalen@ngbutikk.net">Tommy.Aalen@ngbutikk.net</a>	

2. AVTALENS FORMÅL
Avtalens formål er å dekke kundens behov for kostnadseffektive og miljøriktige løsninger og tjenester og regulere de forretningsmessige forhold mellom partene i forhold til dette.

3. AVTALENS OMFANG		
Tømming av Fettutskiller minimum 2 ganger pr år:	X	
Utførelse av driftskontroll og rengjøring:	X	

4. AVTALE PERIODE
Avtalen gjelder fra 09.01.2014 til- <u>09.01.2015</u> Deretter fornyes avtalen med 1 år av gangen, inntil en av partene sier den opp. Eventuell oppsigelse

**NG**Norsk  
Gjenvinning

skal fremsettes skriftlig, med minimum 3 mnd. varsel

**5. PRISER**

Priser fremkommer av eget vedlegg som følger denne avtale

**6. BETALINGSBETINGELSER / FAKTURERING**

Betalingsbetingelse på faktura / kreditnota er netto pr. 30 dager fra fakturadato.  
Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd

**7. BESKRIVELSE AV UTSTYR**

Godkjent sugebil med tilhørende slanger og koblinger  
Temperaturmåler som ivaretar kommunens krav



**8. BESKRIVELSE AV TJENESTE**

Tømming av Fettutskiller minimum 2 ganger pr år  
Årlig driftskontroll og rengjøring av utskiller  
Innsendelse av årsrapport, logg fra temperaturmåling og kopi av Driftsjournal

**9. ANDRE OPPLYSNINGER**

Priser per time. Avtalen periode følger Norges Gruppen avtalen.

Avtalen er utstedt i 2 – to – likelydende eksemplarer, hvor partene beholder 1 – et – eksemplar hver.  
Dersom annet ikke er avtalt i denne avtalen gjelder våre generelle vilkår

Kunde:	Leverandør: Norsk Gjenvinning Industri
	
Signatur <u>Tommy AALEN</u>	Signatur Riccardo Malmgren
Sted / dato: <u>09.01.14 KNAKVIK</u>	Sted / dato:



## Driftsjournal fettutskilleranlegg

		Fettutskiller (m3)	Slamavskiller (m3)	Kontroll	Temperatur/ prøvetaking	Dato	Tømmefirma	Signatur
Fettutskillernr.:		4	0			10/1-14	NGI	VSH
Virksomhetens navn:	Meny							
Virksomhetens adresse:	Kvernhusmyran							
Hjemmelshaver:								
Type virksomhet:	BUTIKK							
Type utskiller:								
Dimensjon utskiller:	4/L/Seke							
Montert:								
Plassering:	VEDNØR 2 VED PARKERINGEN HUS							
Merknader:								

Norsk Gjenvinning Industri AS  
Knarrevik Næringspark  
Telefon: 56 31 64 40 /42

VEDLEGG NR. 4



# Arbeidsseddel nr.: 884/1



Norsk Gjenvinning Industri AS - Region Vest  
 Knarrevik Næringspark, 5355 Knarrevik  
 Tlf.: 56 31 64 40 – Fax: 56 31 64 41

Dato: 10.01.2014

Sjåfør/Operatør: <i>M.H.</i>	Bil nr.: <i>2721</i>	Fra kl.: <i>0700</i>	Til kl.:
		Lossing / rengjøring av bil:	Dato:

Org. nr.: <i>995198843</i>	Kunde navn: <i>NG Meny Vest AS Fettutskiller</i>	Kundenr.: <i>255909</i>	Vareadresse: <i>Kvernhusmyrane 7A5914 ISDALSTØ</i>
Kontaktperson:	Telefon:	Deklarasjonsnummer:	

Arbeidsbeskrivelse:

*\*WMS industitjenester*

*Tømming av fettutskiller Husk og ta med stige. Kontakt: Tommy: 98841873*

*4 m<sup>3</sup> med fett*

*kont. og rengjort*

*OK ved norske*

<b>Tømming av oljeutskiller, sandfangrenner /-kummer mm</b>	<b>Type avfall</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Type avfall</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	oljeforurenset sand		ren sand	


Beskrivelse	Antall
Utfylling av deklarasjon	stk
Utlev./medgått brukt klemringfat/spunsefat	stk
Utlev./medgått nytt klemringfat/spunsefat	stk
Utlevert palletank brukt/rengjort	stk
Gassertifisering, antall tanker	stk
Sortering/omemb. av avfall	timer

Beskrivelse	Antall
<i>X</i> Ekstra mann/hjelpemann <i>Kay</i>	<i>1</i> stk*
Tanktillegg/smusstillegg	timer
<i>X</i> Medgått hansker	<i>2</i> par
Medgått engangsdresser	stk
Medgått filtergassmasker	stk
Annet:	

\* Dersom timer for hjelpemenn avviker fra timer på arbeidsseddel må dette spesifiseres



Sjåfør/Operatør underskrift: *Karoline M. Meyer* Kundens underskrift: *T. Haugen*



Oppdragsgiver		safari Knarvik AS		Dato 30/8-12 Operatør H. H. 44 Vår ref. 30 299 Deres ref.		
Adresse						
Oppdragsnavn						
Arbeidssted		Knarvik sentrum				
Arbeid utført		Minimum utfakturert 2 timer		Ant. timer		
		Fra kl.: 12:30 Til kl.:		Ord.	50%	100%
Staking Spillvannsledning / Overvannsledning						
Rensing Spillvannsledning / Overvannsledning						
TV- kontroll minimum 3 timer						
Tracesøk / Røyktest						
Lekkasjesøking						
Utleie div.						
Hansker / Verneutstyr				X		
Bompenger				X		
Arb. oljetanker						
Time arbeid						
Annet / Må fortsette		Tømmet av gi H		X		
Utrykningstillegg						
Operatør II						
Rehabilitering	Type	Metode				
Materiell						
Slamsuging	Septik - Fett - Sand	m <sup>3</sup>	2	2		
	Spesialavfall - Bil - Båt	m <sup>3</sup>				
Anmerkninger: Tømmet og rengjort fett utskuler and betaler 2 ganger i året. på Ha med stige.						
				Kvittering 		

# VEDLEGG NR. 5

## SØKNAD OM OM TILKOPLING OG UTFØRING AV SANITÆRANLEGG

Eg / vi søker med dette om løyve til tilkopling og utføring av sanitæranlegg i medhald av gjeldande avgiftsføresegner og reglement for sanitæranlegg.			
Til Teknisk etat   Lindås Kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalste		763	
Byggjelplass/eigedom, adresse   Knarvik Senter,		Matr. nr.   Gnr. 188	Bnr.   <del>318</del>   Parell nr.
Eigar/festar av eigedom og sanitæranlegg   Knarvik Senterutvikling AS		Adresse   Gjervik Ytre, Knarvik senter -Nybygg	
Ansvarshavande rørlegger   Chr.M. Vestrheim AS		Kokstadveien 52 5257 Kokstad	
Type bygg (søtt x)			
<input type="checkbox"/> Boligbygg	<input checked="" type="checkbox"/> Forretnings-/kontorbygg	<input type="checkbox"/> Industribygg	
<input type="checkbox"/> Skole/forsamlingshus	<input type="checkbox"/> Annan bygning		
Type arbeid (søtt x)			
<input checked="" type="checkbox"/> Nyanlegg	<input type="checkbox"/> Omlegging	<input checked="" type="checkbox"/> Anna arbeid   Fettutskiller tilhørende Safari butikk plasert utvendig. (Se utenomhusplan)	
<input checked="" type="checkbox"/> Vatninstallasjonar	<input type="checkbox"/> Utvendig installasjon -avløp		
<input checked="" type="checkbox"/> Vatninstallasjonar innvendig	<input checked="" type="checkbox"/> Innvendig installasjon -avløp		
<p>Installasjonsarbeida vil bli utført i medhald av gjeldande lover, føresegner og reglement, eventuelt med dei endringar som måtte bli gitt ved installasjon.</p> <p>Som eigar av anlegg/eigedom vil eg rette meg etter dei til ein kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner.</p>			
Stad   <i>Lindås</i>	Dato   <i>27/6 2010</i>	Stad   Kokstad	Dato   21.06.10
Underskrift av eigar   <i>[Signature]</i>		Underskrift av ansvarshavande rørlegger   <i>[Signature]</i>	
			
FOR KOMMUNEN SI HANDSAMING AV SØKNADEN - IKKJE SKRIV HERI			
Vedtatt:			
<input type="checkbox"/> Søknaden er godkjend på følgjande vilkår:		<input type="checkbox"/> Søknaden er ikkje godkjend fordi:	
			
Stad	Dato   <i>07.12.10</i>		
Underskrift   <i>Kari E. Jo</i>			
Anlegget er godkjend			
Stad	Dato		
Underskrift			

Vatnforsyning			
Stikkledning --	Dim. i mm 35 m/m	Materiale CU	Trykkklasse PN 16
Reduksjonsventill	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Trykkforsterking	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Sil/filteranlegg	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Vatnmålar	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Anna utstyr	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Avløp	<input type="checkbox"/> Fellessystem	<input type="checkbox"/> Dobbeltsystem	
Fellesledning	Dim. i mm 110 m/m	Materiale MA	Trykkklasse
Ledning for spillvatn	Dim. i mm 110 m/m	Materiale MA	Trykkklasse
Ledning for overvatn	Dim. i mm 150 m/m	Materiale MA	Trykkklasse
Slamavskiljar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Våtvolum i m <sup>3</sup>	Antall kummar
Anna rensetiltak/-utstyr	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Kva slag Fettutskiller type Odin 4 L/sek for SAFARI Butikk	
Areal m.m.			
Areal på bygget/tilbygget	Brutto golvflate i m <sup>2</sup> 11568 m <sup>2</sup>	Leigeareal (boligbygg) i m <sup>2</sup> 3000m <sup>2</sup>	Avgiftspliktig tilleggsareal i m <sup>2</sup>
Opparbeidd hageareal	Areal i m <sup>2</sup> 350 m <sup>2</sup>	Symjebaseng	Volum i m <sup>3</sup>
Vassklosett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Teikningar vedlagt			
<input type="checkbox"/> Situasjonsplan		<input type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning		<input type="checkbox"/> Etasjeplan	Oppgi antall
<input type="checkbox"/> Andre teikningar	Oppgi kva slag		
Tinglyste erklæringar vedlagt			
<input type="checkbox"/> Løyve til å leggje og vedlikehalde ledningar, kummar m.v. på andre sin eigedom			
<input type="checkbox"/> Solidarisk ansvar for eigarar av felles ledningar			
<input type="checkbox"/> Rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr m.m.			
<input type="checkbox"/> Rett for kommunen til å krevje provisorisk anlegg sett ut av funksjonen ved tilknytting til offentleg ledningsnett			
<input type="checkbox"/> Andre forhold	Kva slag		
Søknad om deispensasjon (oppgi grunn)			
Andre opplysningar (bruk om nødvendig baksida av blanketten)			
