



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr.:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	01 / 0,100	til Hp/km:	01 / 5.150
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland			Sted:	Eidsnesvegen
Arbeid som skal utføres: Innsnevring av veg ved montering av fiber i luftlinje					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	8 august 2018	Til dato:	15 oktober 2018	Fra kl.:	07:30
				Til kl.:	18:00
Annet: Arbeid man - fre.					

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐		Midlertidig nedsatt hastighet. Manuell		Manuell dirigering.....	☒
30 40 50 60 70 80 90		dirigering.		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 07.08.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ ⇒ Navnet på selskapet Telenor Norge AS v/ Allan Clarke - Tlf. 95 110 140
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ ⇒ Entreprenør/byggeleder ntreprenør: Eltel Networle e-post: allan.clarke@eltelnetworks.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ ⇒ Navn på ansvarlig ntreprenør: Eltel Networle e-post: allan.clarke@eltelnetworks.no
- Ansvarshavende: Roger Husebø Tlf./e-post: 992 12 538
Stedsansvarlig(e): Nerijus Jurgutis, Tlf./e-post: 477 40 921
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgelbil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikkentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): Nobina
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Arbeid kun på 1 lokasjon om gangen. Lage korte arbeidsområder. Husk evt gjentakelse av skilting midlertidig nedsatt hastighet. (MAX skiltavstand 250 m.).
Det kan bli korte stengninger ifm kryssing med kabel over vei. Stengninger må ikke overskride 15 min. Ta hensyn til buss i rute og utrykningskjøretøy.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Ved opphopning av trafikk som følge av arbeidet skal arbeidet midlertidig stanses.
DETTE VEDTAKET GJELDER FOR FRAMFØRING AV FIBER I LUFT I EKSISTERENDE STOLPER - LANGS Fv. 393.
Skap kan monteres i avstand av min. 3 meter fra vegkant.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

07.08.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr.:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	01 / 0,100	til Hp/km:	01 / 5,150
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland	Sted:	Eidsnesvegen		
Arbeid som skal utføres:	Innsnevring av veg ved montering av fiber i luftlinje				
Utførende av arb. varsling*:	Entreprenør: Eitel Networks				
Adresse:	Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo				
Ansvarshavende:	Roger Husebø		Tlf./e-post: 992 12 538		
Stedsansvarlig(e):	Nerijus Jurgutis,		Tlf./e-post: 477 40 921		
Arbeidet utføres	fra dato:	8 august	2018	Til dato:	15 oktober 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	808.727	2
	560	2
	362.50	4
	364.50	2
	906	15
	Dirigenter	2

Merknader:

Prinsippskisse

Gjelder for 80 km/t.
Km 1,690-3439 og 4,400 - 5,150.

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved skiltplassering.


Bergen 01.08.2018
Søknad : 301 / 18

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

Prinsippskisse manuell dirigering, stenging inntil 15 minutter

Manuell dirigering
Vegen kan bli stengt
Inntil 15 min

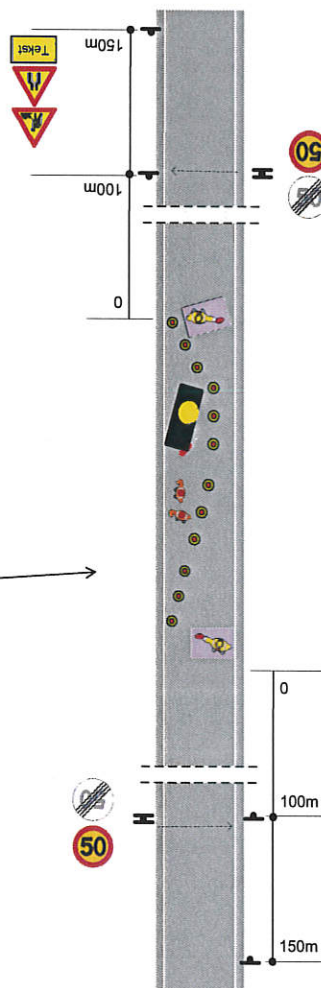

Manuell dirigering
Vegen kan bli stengt
Inntil 15 min

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

07.08.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	01 / 0,100	til Hp/km:	01 / 5.150
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland	Sted:	Eidsnesvegen		
Arbeid som skal utføres:	Innsnevring av veg ved montering av fiber i luftlinje				
Utførende av arb. varsling*:	Entreprenør: Eltel Networks				
Adresse:	Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo				
Ansvarshavende:	Roger Husebø	Tlf./e-post:	992 12 538		
Stedsansvarlig(e):	Nerijus Jurgutis,	Tlf./e-post:	477 40 921		
Arbeidet utføres	fra dato:	8 august	2018	Til dato:	15 oktober 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
	808.727	2
	906	15
	Dirigenter	2

Merknader:

Prinsipp skisse

Det er 50 km/t i hele arbeidsområdet


Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved skiltplassering.

Bergen 01.08.2018

Søknad : 301 / 18

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Lindås kommune

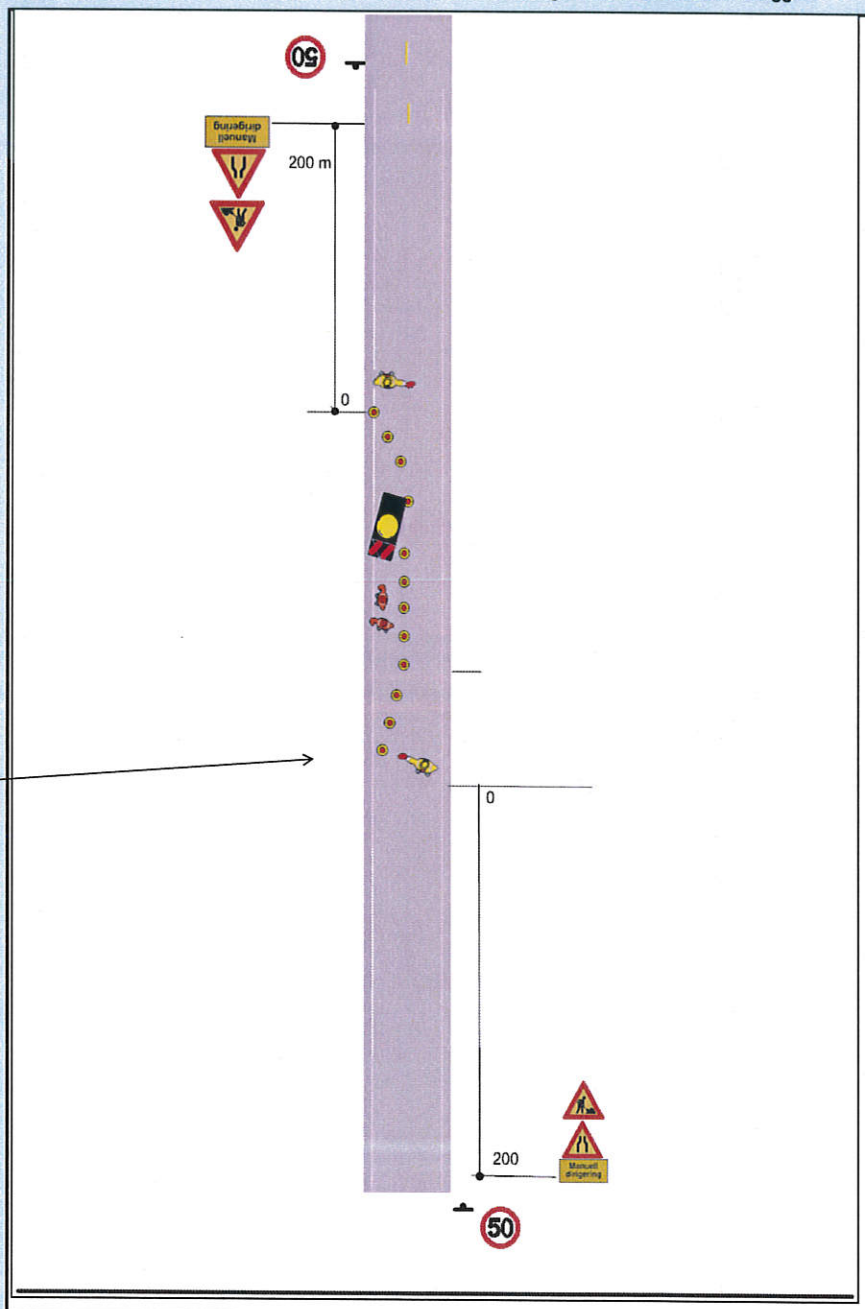

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

07.08.2018

Arve Løvteit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: N8205-2018	Mime-nr.: 18 / 169327	Vedtak nr.: N8205-2018
Veg nr.: Fv. 393	fra Hp/km: 01 / 0,100	til Hp/km: 01 / 5.150
Strekning: Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland	Sted: Eidsnesvegen	
Arbeid som skal utføres: Innsnevring av veg ved montering av fiber i luftlinje		

Ansvarshavende: Roger Husebø Tlf./e-post: 992 12 538

Utførende arb.v.*: Entreprenør: Eitel Networks Adresse: Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato: 8 august 2018	Til dato: 15 oktober 2018	68 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Uvedkomme inn i arbeidsområde

Arbeid i / ved veg

Stengt vei

Påkjørsel arbeidsmann.

Påkjørsel i arbeidsområde.

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Uoppmerksomme fotgjengere som går inn i arbeidsområde

2: Kødannelse ved arbeid i / ved veg

3: Biler kommer i stor fart inn i arbeidsområde

4: Arbeider blir påkjørt ved utsetting av midlertidige skilt

5: Bil kjører inn i arbeidsområde og skader / dreper arbeidere.

6: Stenging av vei i inntil 15 minutter

7: Arbeid i 80-sone

8: Sikkerhet for trafikkdirigenter

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	2	4
2	2	4
3	2	6
3	1	3
3	1	3
2	3	6
1	1	1
2	3	6
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Dirigenter sikrer arbeidsområde . Avsperring av arbeidsområde.
- 2: Bruk av manuell dirigering , avvikling av arbeid dersom stor kødannelse oppstår
- 3: Forvarsling med arbeidsvarslingsskilt ihht plan
- 4: Bruk av strobelys på arbeidsbil ved utsetting av midlertidige skilt i fartsretning. Sidemann utplasserer skilt
- 5: Bruk av manuell dirigering. Bruk av arbeidsbil med strobelys som buffer med skråstilte hjul. (se arbeidsvarslingsplan)
- 6: Pga smal veibredde kan veien bli stengt i inntil 15 minutter.
- 7: Fartsgrense senkes til 50 km/t
- 8: Bruke godkjent verneklær / trafikkdirigeringsvest. Arvåkenhet. Alltid ha rømningsvei.
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Roger Husebø bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varslings og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr.:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv 393	fra Hp/km:	HP 1 / 0,100km	til Hp/km:	HP 1 / 5.150km
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland			Sted:	Bergen
Ansvarshavende*:	Roger Husebø			Tlf./e-post:	992 12 538
Utførende entreprenør:	Entreprenør: Eitel Networks			Adresse:	Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo
				(Ev. e-post)	allan.clarke@eltnetworks.no
Utførende arb. varslings*:	Entreprenør: Eitel Networks			Adresse:	Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarslings:	912955915			(Ev. e-post:)	allan.clarke@eltnetworks.no
Stedsansvarlig(e):	Nerijus Jurgutis,			Tlf./e-post:	477 40 921
Arbeid som skal utføres*:	Montering av fiber i luftlinje i eksisterende stolper				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	8 august	2018	Til dato:	15 oktober	2018
					68 dager


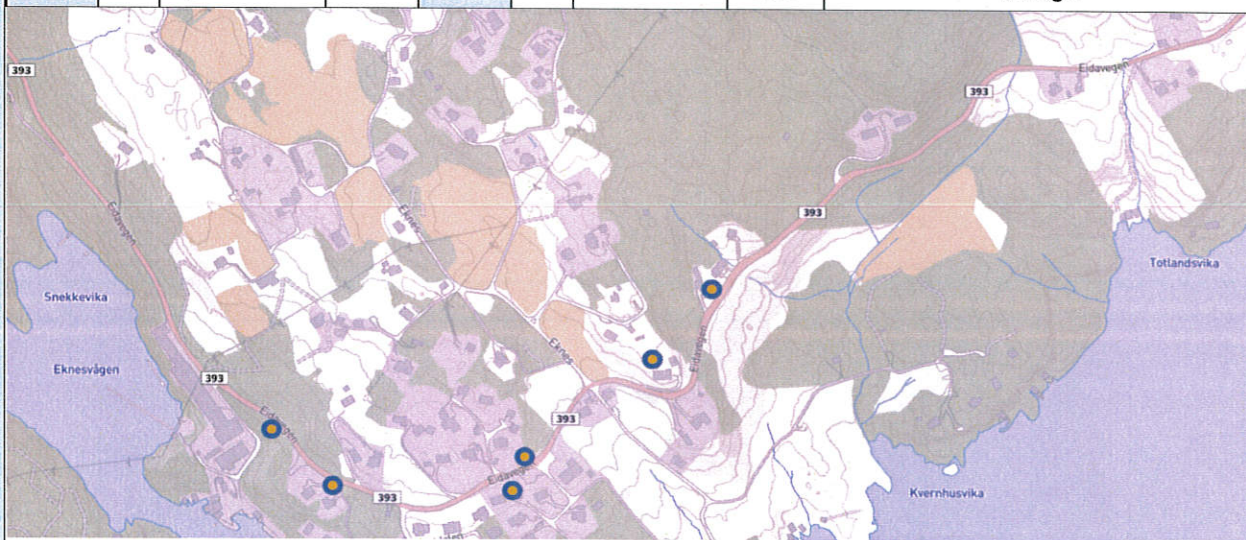




Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr.:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	01 / 0,100	til Hp/km:	01 / 5,150
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland			Sted:	Eidsnesvegen
Ansvarshavende*:	Roger Husebø			Tlf./e-post:	992 12 538
Utførende entreprenør:	Entreprenør: Eltel Networks			Adresse:	Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo
				(Ev. e-post):	allan.clarke@eltelnetworks.no
Utførende arb. varsling*:	Entreprenør: Eltel Networks			Adresse:	Postboks 343 Alnabru, 0614 Oslo
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	912955915			(Ev. e-post):	allan.clarke@eltelnetworks.no
Stedsansvarlig(e):	Nerijus Jurgutis,			Tlf./e-post:	477 40 921
Arbeid som skal utføres*:	Innsnevring av veg ved montering av fiber i luftlinje				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	8	august	2018	Til dato:	15 oktober 2018
					68 dager

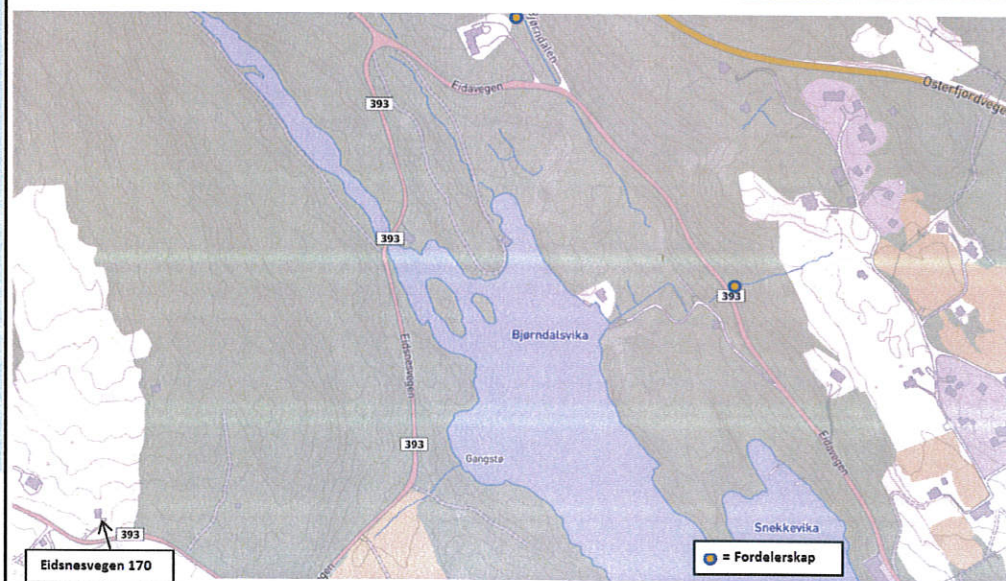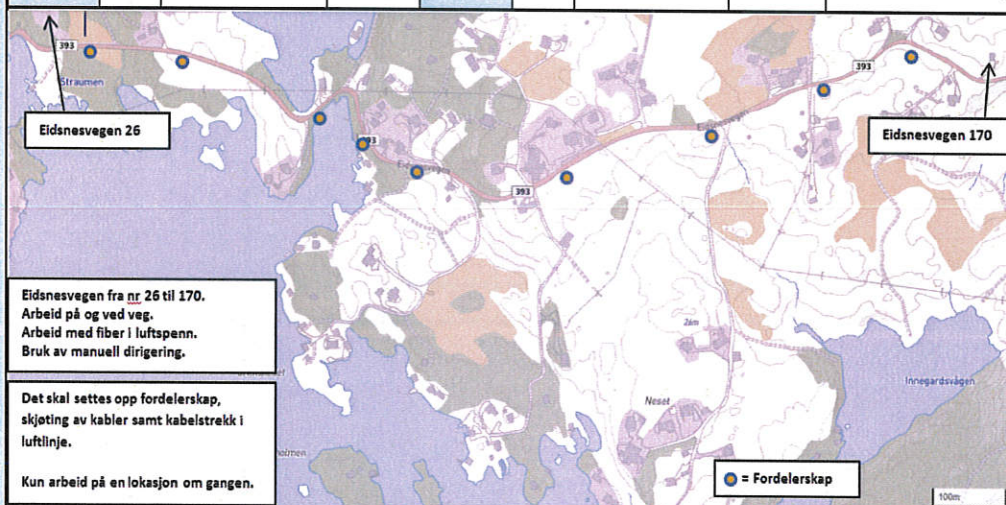



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	01 / 0,100	til Hp/km:	01 / 5.150
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland			Sted:	Eidsnesvegen
Utførende:	Entreprenør: Eltel Networks				
Ansvarshavende:	Roger Husebø				
Stedsansvarlig:	Nerijus Jurgutis,				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Plan nr.:	N8205-2018	Mime-nr:	18 / 169327	Vedtak nr.:	N8205-2018
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	01 / 0,100	til Hp/km:	01 / 5.150
Strekning:	Eidsnesvegen 26 - Eidavegen kryss Totland			Sted:	Eidsnesvegen
Arbeid som skal utføres:	Innsnevring av veg ved montering av fiber i luftlinje				
Ansvarshavende:	Roger Husebø			Tlf.:	992 12 538
Stedsansvarlig(e):	Nerijus Jurgutis,				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)

