



ID	Aktivitet/Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	% fullført	Opprinnelig slutt	Kommentarer
1	<b>S404 &amp; 8PT utvikling</b>	42 dager?	to 27.10.22	fr 23.12.22			0%	-	
2									
3	<b>S404 Gjenbruk 3KM</b>	42 dager?	to 27.10.22	fr 23.12.22			0%	-	
4									
5	<b>Design, prosjektering og dokumentasjon</b>	42 dager?	to 27.10.22	fr 23.12.22			0%	-	
6	Valg av styrestrømsløsning - Andeføtter fjernes	0 dager	to 27.10.22	to 27.10.22			0%	-	Utført
7	Valg av multiplugg kompaktstartere	15 dager	to 27.10.22	on 16.11.22			0%	-	
8	Valg av hovedstrømsløsning - Powerplugg	15 dager	to 27.10.22	on 16.11.22			0%	-	
9	Mekaniske tegninger alle modulstørrelser	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
10	Prototyp mekanisk ferdigstilt	12 dager	to 27.10.22	fr 11.11.22			0%	-	
11	Tilpasning	5 dager	ma 14.11.22	fr 18.11.22	10		0%	-	
12	Justering mekanisk tegninger	2 dager	ma 21.11.22	ti 22.11.22	11		0%	-	
13	Endelig løsning - Mekaniske tegninger	0 dager	ti 22.11.22	ti 22.11.22	12		0%	-	
14	Mekaniske tegninger bakplater med shutterløsning	3 dager	ma 07.11.22	on 09.11.22	9		0%	-	
15	Klart underlag "og to marked" for standard produksjon	1 dag?	fr 23.12.22	fr 23.12.22	40		0%	-	
16									
17	<b>Nummerering og tegning</b>	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
18	Etablere nummerering av mekaniske deler, inklusive plugg og kobber	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
19	Etablere nummerering av tegninge alle størrelser og varianter	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
20	Utarbeide bestillingsliste for innkjøp, elektriske deler	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
21									
22	<b>Innkjøp</b>	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%	-	
23	Innkjøp bergen mekaniske	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%	-	
24	Innkjøp elektrokomponenter og tilbehør	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%	-	
25									
26	<b>Produksjon</b>	23 dager?	ma 21.11.22	on 21.12.22			0%	-	
27	Elektrisk mblering	5 dager	to 24.11.22	on 30.11.22	24;13		0%	-	
28	Montasje av kobber, jording og plugg	10 dager	ma 21.11.22	fr 02.12.22	27AS-8 dager		0%	-	
29	Kobling	20 dager	ma 21.11.22	fr 16.12.22	27AS-8 dager		0%	-	
30	Montasje av bakplater i felt	2 dager	to 24.11.22	fr 25.11.22	23		0%	-	
31	Montasje av skuffer i felt inklusive kobling mot kabelfelt	11 dager	ma 05.12.22	ma 19.12.22	29AS-10 dager		0%	-	
32	Produksjon av dører til felt	5 dager	on 23.11.22	ti 29.11.22	13		0%	-	
33	Montasje av dører på felt	1 dag	on 30.11.22	on 30.11.22	32		0%	-	
34	Interntest produksjon	8 dager	to 08.12.22	ma 19.12.22	29AS-7 dager		0%	-	
35	Eventuell utbedring etter verifikasjon	1 dag?	on 21.12.22	on 21.12.22	38;39		0%	-	
36									
37	<b>Test og verifikasjon</b>	3 dager?	ti 20.12.22	to 22.12.22			0%	-	
38	Mekanisk test og verifikasjon	1 dag?	ti 20.12.22	ti 20.12.22	34		0%	-	
39	Elektrisk verifikasjon	1 dag?	ti 20.12.22	ti 20.12.22	34		0%	-	
40	Verifikasjon etter utbedring	1 dag?	to 22.12.22	to 22.12.22	35		0%	-	
41									
42									
43	<b>S404 3KF løsning</b>	42 dager?	to 27.10.22	fr 23.12.22			0%	-	
44									
45	<b>Design, prosjektering og dokumentasjon</b>	42 dager?	to 27.10.22	fr 23.12.22			0%	-	
46	Valg av styrestrømsløsning - Andeføtter fjernes	0 dager	to 27.10.22	to 27.10.22			0%	-	
47	Valg av multiplugg kompaktstartere	15 dager	to 27.10.22	on 16.11.22			0%	-	
48	Valg av hovedstrømsløsning - Powerplugg	15 dager	to 27.10.22	on 16.11.22			0%	-	
49	Mekaniske tegninger alle modulstørrelser	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
50	Prototyp mekanisk ferdigstilt	12 dager	to 27.10.22	fr 11.11.22			0%	-	
51	Tilpasning	5 dager	ma 14.11.22	fr 18.11.22			0%	-	
52	Justering mekanisk tegninger	2 dager	ma 21.11.22	ti 22.11.22			0%	-	
53	Endelig løsning - Mekaniske tegninger	0 dager	ti 22.11.22	ti 22.11.22			0%	-	
54	Mekaniske tegninger bakplater med shutterløsning	3 dager	ma 07.11.22	on 09.11.22			0%	-	
55	Klart underlag "og to marked" for standard produksjon	1 dag?	fr 23.12.22	fr 23.12.22			0%	-	
56									
57	<b>Nummerering og tegning</b>	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
58	Etablere nummerering av mekaniske deler, inklusive plugg og kobber	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
59	Etablere nummerering av tegninge alle størrelser og varianter	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	
60	Utarbeide bestillingsliste for innkjøp, elektriske deler	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%	-	

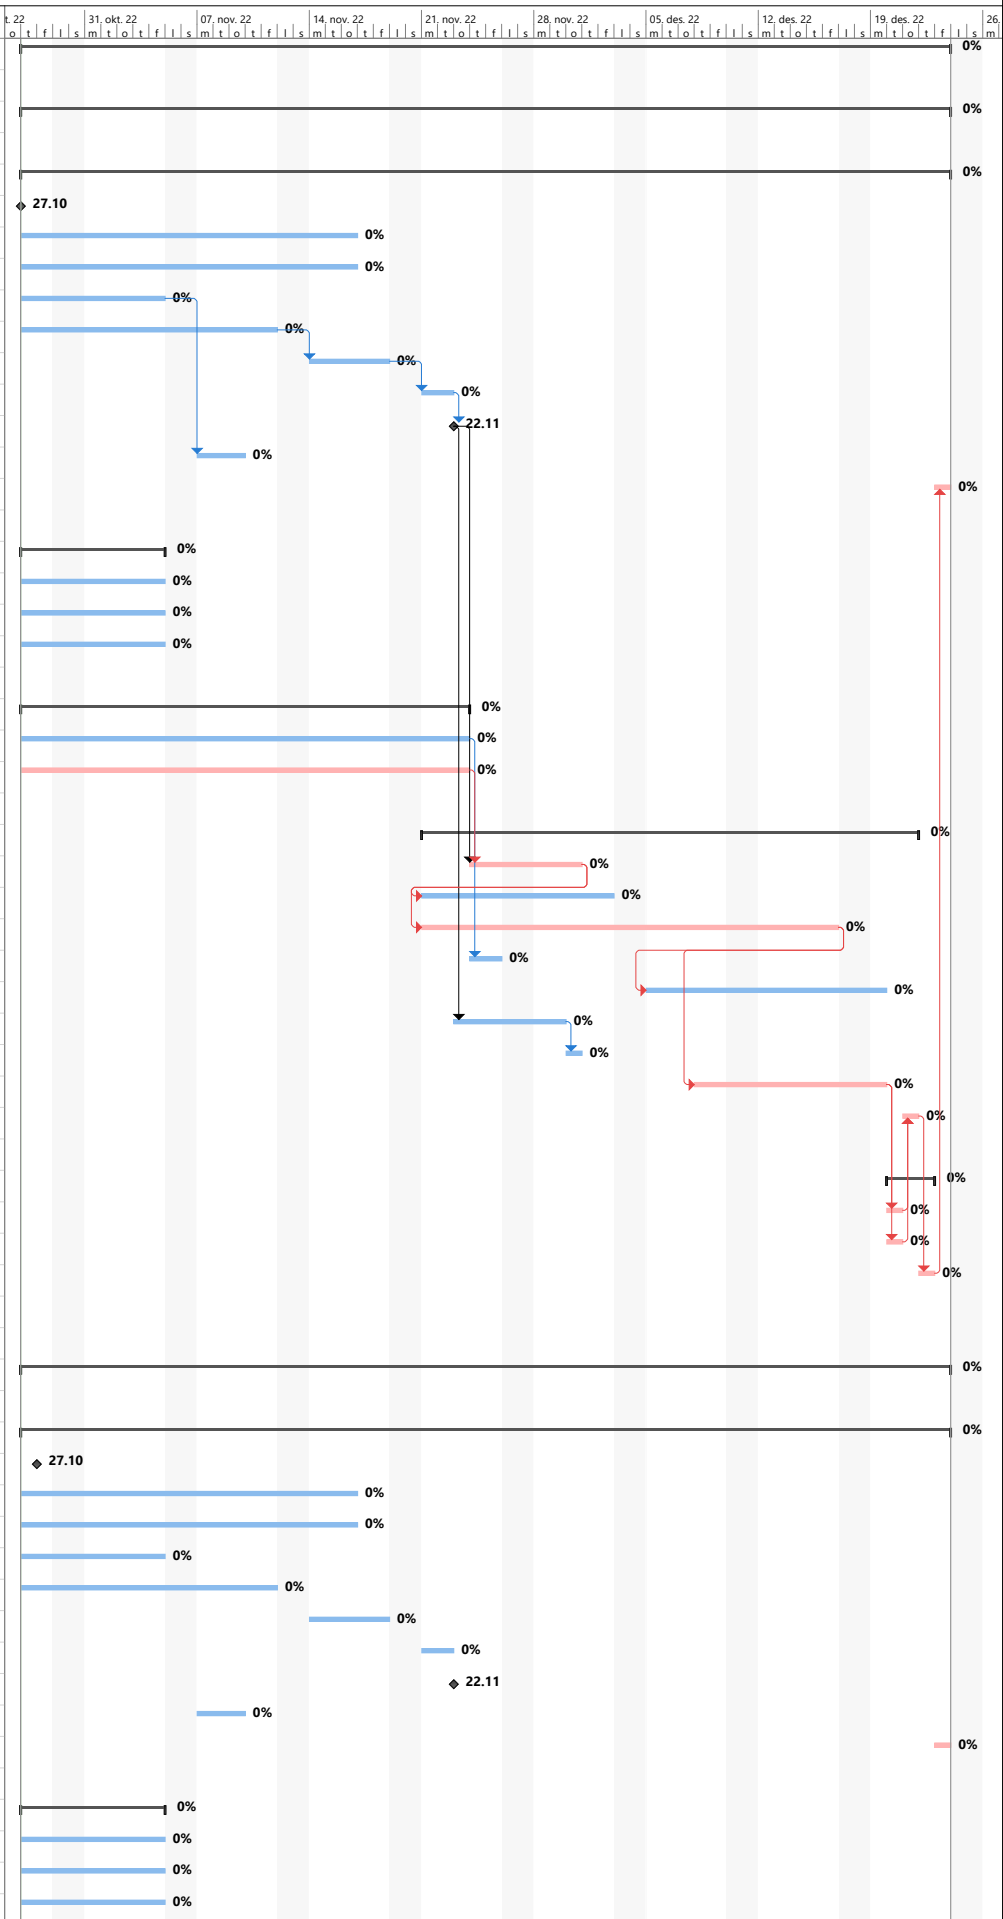

■ Kritisk ■ Aktivitet ■ Manuell aktivitet ■ Bare varighet ■ Milepæl i opprinnelig plan ■ Sammendrag ■ Eksterne aktiviteter ■ Inaktivt milepæl ■ Inaktivt sammendrag ■ Tidsfrist  
■ Kritisk deling ■ Deling ■ Bare start ■ Opprinnelig plan ■ Milepæl ■ Manuelt sammendrag ■ Ekstern milepæl ■ Inaktivt sammendrag  
■ Kritisk fremdrift ■ Fremdrift for aktivitet ■ Bare slutt ■ Deling i opprinnelig plan ■ Sammenendragsfremdrift ■ Prosjektsammendrag ■ Inaktivt aktivitet

ID	Aktivitet/Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	% fullført	Opprinnelig slutt	Kommentarer
61									
62	<b>Innkjøp</b>	<b>20 dager</b>	<b>to 27.10.22</b>	<b>on 23.11.22</b>			<b>0%</b>		
63	Innkjøp bergen mekaniske	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%		
64	Innkjøp elektrokomponenter og tilbehør	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%		
65									
66	<b>Produksjon</b>	<b>23 dager?</b>	<b>ma 21.11.22</b>	<b>on 21.12.22</b>			<b>0%</b>		
67	Elektrisk møblering	5 dager	to 24.11.22	on 30.11.22			0%		
68	Montasje av kobber, jording og plugg	10 dager	ma 21.11.22	fr 02.12.22			0%		
69	Kobling	20 dager	ma 21.11.22	fr 16.12.22			0%		
70	Montasje av bakplater i felt	2 dager	to 24.11.22	fr 25.11.22			0%		
71	Montasje av skuffer i felt inklusive kobling mot kabelfelt	11 dager	ma 05.12.22	ma 19.12.22			0%		
72	Produksjon av dører til felt	5 dager	on 23.11.22	ti 29.11.22			0%		
73	Montasje av dører på felt	1 dag	on 30.11.22	on 30.11.22			0%		
74	Interntest produksjon	8 dager	to 08.12.22	ma 19.12.22			0%		
75	Eventuell utbedring etter verifikasjon	1 dag?	on 21.12.22	on 21.12.22			0%		
76									
77	<b>Test og verifikasjon</b>	<b>3 dager?</b>	<b>ti 20.12.22</b>	<b>to 22.12.22</b>			<b>0%</b>		
78	Mekanisk test og verifikasjon	1 dag?	ti 20.12.22	ti 20.12.22			0%		
79	Elektrisk verifikasjon	1 dag?	ti 20.12.22	ti 20.12.22			0%		
80	Verifikasjon etter utbedring	1 dag?	to 22.12.22	to 22.12.22			0%		
81									
82									
83	<b>8PT</b>	<b>42 dager?</b>	<b>to 27.10.22</b>	<b>fr 23.12.22</b>			<b>0%</b>		
84									
85	<b>Design, prosjektering og dokumentasjon</b>	<b>42 dager?</b>	<b>to 27.10.22</b>	<b>fr 23.12.22</b>			<b>0%</b>		
86	Pluggløsninger?	0 dager	to 27.10.22	to 27.10.22			0%		
87	Valg av hovedstrømsløsning	15 dager	to 27.10.22	on 16.11.22			0%		
88	Mekaniske tegninger alle størrelser	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%		
89	Prototyp mekanisk ferdigstilt	12 dager	to 27.10.22	fr 11.11.22			0%		
90	Tilpasning	5 dager	ma 14.11.22	fr 18.11.22			0%		
91	Justering mekanisk tegninger	2 dager	ma 21.11.22	ti 22.11.22			0%		
92	Endelig løsning - Mekaniske tegninger	0 dager	ti 22.11.22	ti 22.11.22			0%		
93	Mekaniske tegninger bakplater med shutterløsning	3 dager	ma 07.11.22	on 09.11.22			0%		
94	Klart underlag"og to marked"for standard produksjon	1 dag?	fr 23.12.22	fr 23.12.22			0%		
95									
96	<b>Nummerering og tegning</b>	<b>7 dager</b>	<b>to 27.10.22</b>	<b>fr 04.11.22</b>			<b>0%</b>		
97	Etablere nummerering av mekaniske deler, inklusive plugg og kobber	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%		
98	Etablere nummerering av tegninge alle størrelser og varianter	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%		
99	Utarbeide bestillingsliste for innkjøp, elektriske deler	7 dager	to 27.10.22	fr 04.11.22			0%		
100									
101	<b>Innkjøp</b>	<b>20 dager</b>	<b>to 27.10.22</b>	<b>on 23.11.22</b>			<b>0%</b>		
102	Innkjøp bergen mekaniske	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%		
103	Innkjøp elektrokomponenter og tilbehør	20 dager	to 27.10.22	on 23.11.22			0%		
104									
105	<b>Produksjon</b>	<b>23 dager?</b>	<b>ma 21.11.22</b>	<b>on 21.12.22</b>			<b>0%</b>		
106	Elektrisk møblering	5 dager	to 24.11.22	on 30.11.22			0%		
107	Montasje av kobber, jording og plugg	10 dager	ma 21.11.22	fr 02.12.22			0%		
108	Kobling	20 dager	ma 21.11.22	fr 16.12.22			0%		
109	Montasje av bakplater i felt	2 dager	to 24.11.22	fr 25.11.22			0%		
110	Montasje av skuffer i felt inklusive kobling mot kabelfelt	11 dager	ma 05.12.22	ma 19.12.22			0%		
111	Produksjon av dører til felt	5 dager	on 23.11.22	ti 29.11.22			0%		
112	Montasje av dører på felt	1 dag	on 30.11.22	on 30.11.22			0%		
113	Interntest produksjon	8 dager	to 08.12.22	ma 19.12.22			0%		
114	Eventuell utbedring etter verifikasjon	1 dag?	on 21.12.22	on 21.12.22			0%		
115									
116	<b>Test og verifikasjon</b>	<b>3 dager?</b>	<b>ti 20.12.22</b>	<b>to 22.12.22</b>			<b>0%</b>		
117	Mekanisk test og verifikasjon	1 dag?	ti 20.12.22	ti 20.12.22			0%		
118	Elektrisk verifikasjon	1 dag?	ti 20.12.22	ti 20.12.22			0%		
119	Verifikasjon etter utbedring	1 dag?	to 22.12.22	to 22.12.22			0%		

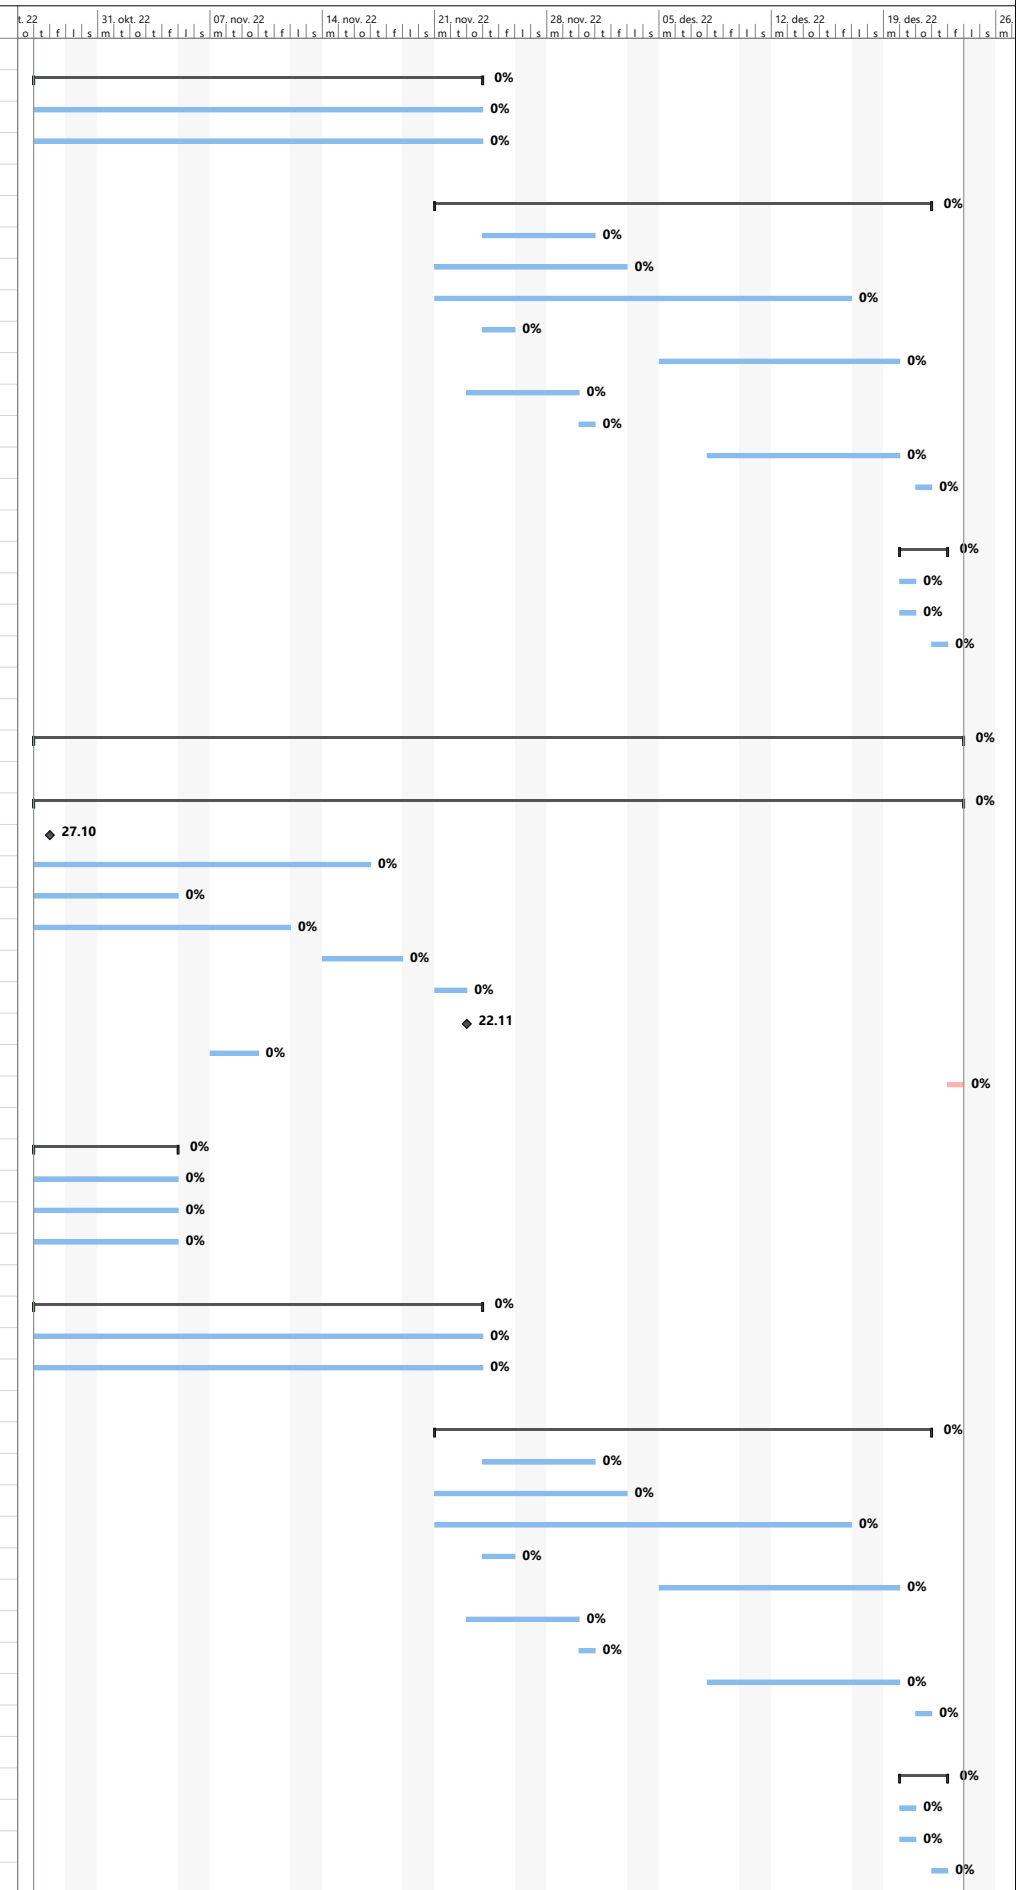

■ Kritisk  
■ Kritisk deling  
■ Kritisk fremdrift  
■ Aktivitet  
■ Deling  
■ Fremdrift for aktivitet  
■ Manuell aktivitet  
■ Bare start  
■ Bare slutt  
■ Bare varighet  
■ Opprinnelig plan  
■ Deling i opprinnelig plan  
■ Milepæl i opprinnelig plan  
■ Milepæl  
■ Sammenhangsfremdrift  
■ Sammendrag  
■ Manuelt sammendrag  
■ Prosjektsammendrag  
■ Eksterne aktiviteter  
■ Ekstern milepæl  
■ Inaktiv aktivitet  
■ Inaktiv milepæl  
■ Inaktivt sammendrag  
■ Tidsfrist  
■
