

Prosjekt 21033 Nordhordaland Næringspark VA	Underprosjekt 21033 Nordhordaland Næringspark VA
Saksbehandler Mari Røen	Status Lukket

Avdekket

23.03.2022 08.49

Tittel

Ombygging V2

Angår

Rådgivende ingeniør/konsulent

I forhold til

Modell/tegninger Utførelse

Årsak

Feilaktig arbeidsgrunnlag

Beskrivelse

I forbindelse med vanntilgang på V1 der me ikkje kunne få vatn på den eine tomte, så såg me at det samme problemet ville oppstå i V2. Altså at tomtene ikkje ville kunne få vatn før V3 var klar. Dette er eit stykke fram, så kum må bygges om slik at stikkene til tomtene er på rett ledningsstrekk.

Strakstiltak

Sendt skisse for ombygging til NOBI.

Alvorlighetsgrad

Lav

Årsaksanalyse

Rådgivene har mest sannsynlig ikkje tatt hensyn til at va-utbygginga skjer i fleire byggetrinn.

Estimert kostnad

0

Faktisk kostnad

0

Kostnadsfordeling

Ikke relevant

Korrigerende tiltak

Ettersom kummen ikkje var levert til anlegget, kunne dei utføre endringane inne på fabrikk.

Tidsfrist for lukking av avvik

25.03.2022 00.00

Konklusjon

Utbygger bør kvalitetssikre byggetrinnene, at alt kjem med i rett byggetrinn.

Posisjon

Ikke tilgjengelig

Bilder

Vedlegg (2)

Mari Røen


Fra: Mari Røen
Sendt: onsdag 23. mars 2022 20:19
Til: 'Odd Sivertsen'
Emne: Viktig! Ombygging V2 - Nordhordaland

Hei Odd.

Me må bygge om V2 før den kjem til Nordhordaland.

Me har oppdaga at slik kummen er bygd no, får me ikkje satt på vatn på alle stikkledningene, den ved 7, før neste vannkum er på plass.

Me må flytte 7 ned til 2 og borre nytt hull i kummen der til stikket.
Så må det hullet i kummen som ikkje er i bruk tettes.

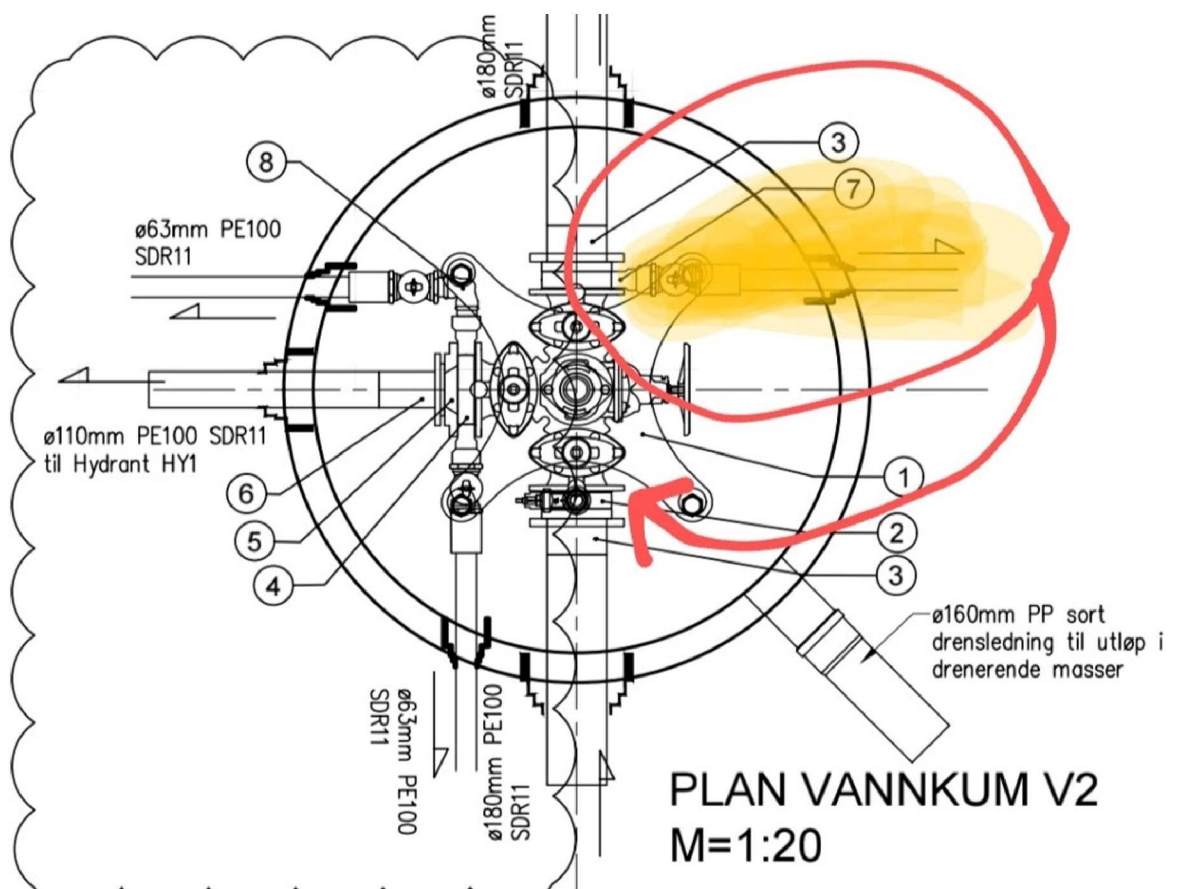

Du kan ringe meg eller formannen min, Hans Egil (952 12 957), i morgon tidlig

Mvh,
Mari Røen
Ingeniør / Anleggsleiar
Direkte: +47 995 56 950
E-post: mari@flagemaskin.no

FLAGE MASKIN A.S
Bjørkemoen 46
5700 VOSS
TLF.56 53 02 00 – FAX.56 53 02 10
MOB.46 40 70 70 – www.flagemaskin.no

Innsendt dato: 04.04.2022 08.26

Bildetekst:

Innsender: Hans Egil Gullbrå

Veireferanse:

Lat: 60,61527295

Lon: 5,40715973

