




GEOVEKST-PARTSAVTALE

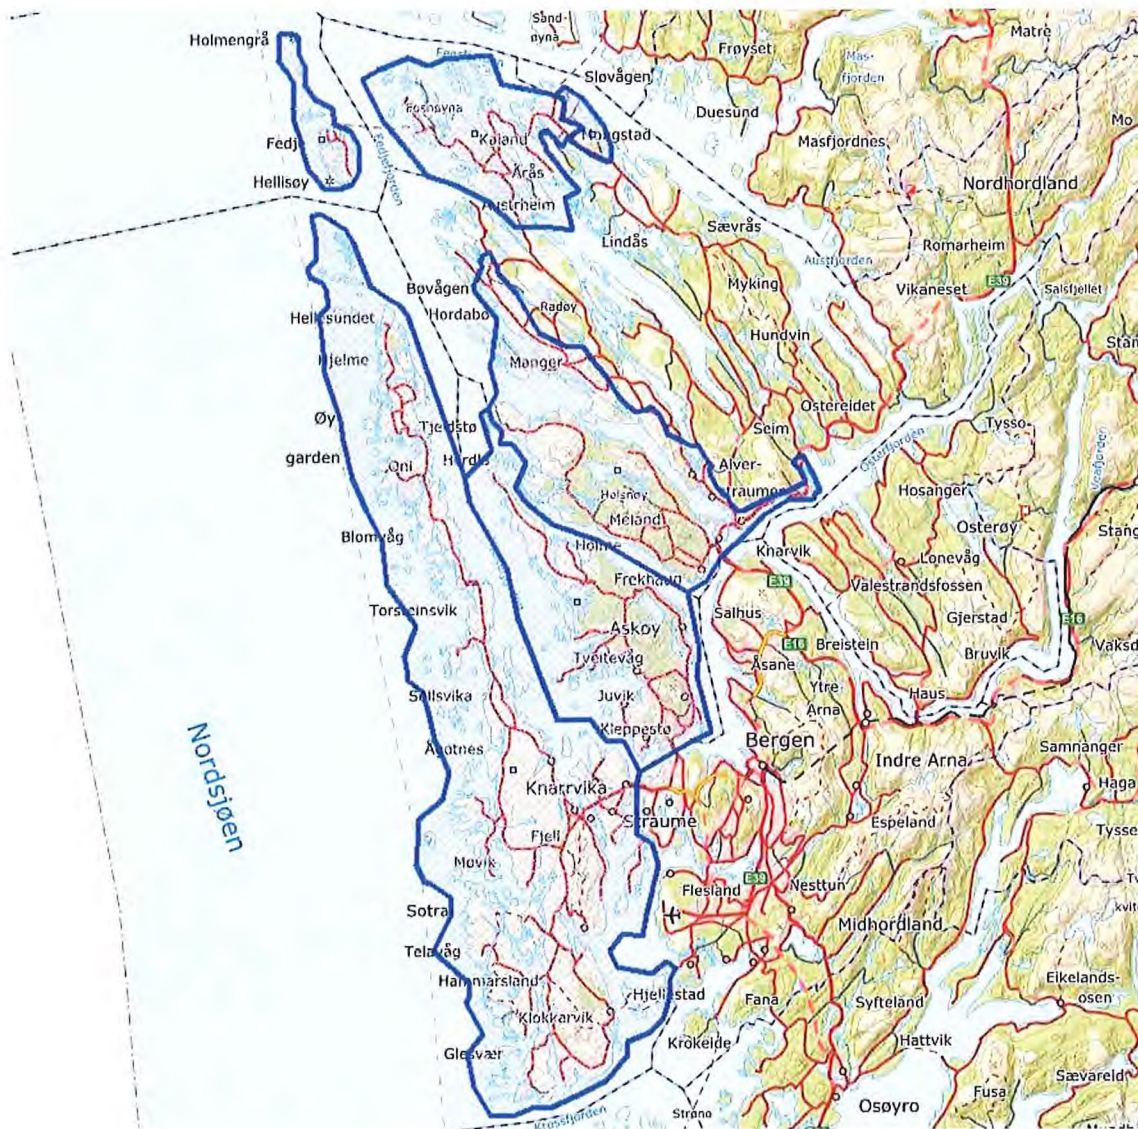

Ytre Hordaland 2023
LACHVL31

Innhald

1.	ALLMENNE FØRESEGNER	3
1.1.	Partar	3
1.2.	Sentral avtale om geodatasamarbeid.....	3
2.	KVA AVTALEN GJELD	3
2.1.	Etablering av primærdatasett.....	4
2.2.	Etablering av høgdegrunnlag.....	4
2.3.	Presentasjonsdata ØK (ØK-plater som blir rørde av prosjektet)	4
2.4.	Presentasjonsdata for tekniske kart i målestokk 1:1000.....	5
2.5.	ETABLERING AV ORTOFOTO	5
2.6.	Opsjonar (tillegg)	5
3.	ORGANISERING.....	5
4.	KOSTNADER OG KOSTNADSDELING.	5
4.1.	Kostnadskalkyle	6
4.2.	Kostnadsdeling og betalingsplan	7
4.3.	Prosjektregnskap	9
5.	PLAN FOR GJENNOMFØRING	10
6.	EIGENINNSATS.....	10
7.	LEVERANSAR.....	10
7.1.	FKB.....	10
7.2.	Ortofoto.....	10
7.3.	Høgdedata	11
8.	RETTAR	11
8.1.	Generelt.....	11
8.2.	Avvik og presiseringar.....	11
8.3.	Norge digitalt (ND).....	11
9.	SAL OG INNTEKTER.....	11
9.1.	Sal	12
10.	AVTALE OM FORVALTNING OG DRIFT	12
11.	VARIGHET PÅ AVTALEN	12
12.	DAGMULKT	12
13.	MISLIGHALD	12
14.	SAMARBEID.....	12
15.	ENDRINGAR.....	12
16.	RETTSVALG OG TVISTAR	13
17.	UNDERSKRIFTAR	13

1. ALLMENNE FØRESEGNER

1.1. PARTAR

Partar i denne samarbeidsavtalen er:

[Hent Innhold fra GEPOS, arkfane Parter, sett inn i tabellen under (Excel-tabell) Slett denne teksten.]

Parter (Plan/avtale)	Gruppe	Kode	Kontaktperson
Statens vegvesen	V	SVVL E00 K00	Sara Beate Aspen
Statens kartverk Vestland	S	SKVL	Anne Lien
Telenor Norge AS	T	T	Alf Ove Lindås
Statsforvaltaren i Vestland, landbruksavdelinga	L	FMLAVL	Enisa Saracevic
Vestland fylkeskommune	Y	FKVL	Jan Ove Stadheim
NVE - Skred og vassdragsavdelinga	NVE	NVE	Amund F. Borge
Eviny AS	E	BKK	Ole-Magnus Dybwad
Kommuner i Prosjektet (Plan)	Gruppe	Kode	Kontaktperson
Øygarden kommune	K	K4626	Janne Byrkjeland
Askøy kommune	K	K4627	Arne Klingsheim
Ålver kommune	K	K4631	Tommy Veland
Austrheim kommune	K	K4632	Alf Kvant
Fedje kommune	K	K4633	Berit Karin Rystad
Everk i Prosjektet (Plan)	Gruppe	Kode	Kontaktperson
Eviny AS	E	BKK	Ole-Magnus Dybwad
Norgesnett	E	E4627	Ashild Utvik

1.2. SENTRAL AVTALE OM GEODATASAMARBEID

Partane er samde om at ein for forhold som ikkje blir regulerte av denne avtalen, skal leggje til grunn dei generelle "Prinsipper for geodatasamarbeid" slik dei er formulerte i "[Sentral avtale om geodatasamarbeid](#)" av 1992-06-05.

2. KVA AVTALEN GJELD

Denne avtalen gjeld etablering av FKB-datasett, vertikalbilete, ortofoto, midlertidige ortofoto, CIR ortofoto, laserdata og vektoriserte ledningsdata for høgspent etter gjeldande standardar: <https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/fkb-produktspesifikasjoner>.

Periodisk ajourføring av AR5 for kommunane Øygarden og Askøy ligg også inne i avtalen.

Tabell som viser prosjektdata. Areal per kommune/e-part:

Arealer og verdier for kalkyle og kostnadsdeling			H	I	J	K
Kommuner - PLAN	Knr	E-verk (kode)	Kart areal AR5	FKB-B Ajourføring	Ortofoto	Laser 10 pkt
Øygarden	K4626	BKK	314,5	293,5	652,6	384,9
Askøy	K4627	E4627	101,1	94,5	198,7	142,6
Ålver	K4631	BKK		150,0	221,6	108,5
Austrheim	K4632	BKK		55,8	120,3	
Fedje	K4633	BKK		8,8	28,0	
		SUM	415,6	602,6	1 221,2	636,0

E-verk Plan	E-verk (kode)	Kart areal AR5	FKB-B Ajourføring	Ortofoto	Laser 10 pkt
Eviny AS	BKK	315	508	1 023	493
Norgesnett	E4627	101	95	199	143
	SUM	415,6	602,6	1 221,2	636,0

2.1. ETABLERING AV PRIMÆRDATASETT

Fotografering GSD 10 farge + IR, 1221,2 km². Lengdeoverlapp 80, sideoverlapp 20. Kartverket vil produsere ein overflatemodell av flybileta vha. biletmatching. Den vil bli publisert i hoydedata.no.

Konstruksjon av FKB-B 602,3 km².

Datsett som vert nykonstruert:

- FKB-Arealbruk
- FKB-Bygning
- FKB-BygningsmessigeAnlegg
- FKB-Naturinfo
- FKB-Veg
- FKB-Lufthavn (helikopterplass)

Datsett som vert ajourført/oppgradert:

- FKB-Ledning
- FKB-Vann (nykonstruksjon av kystkontur i Øygarden, Askøy og Meland grunna kvalitetskoding)
- ELVEG
- FKB-TraktorvegSti

2.2. ETABLERING AV HØGDEGRUNNLAG



Laserskanning med punktettleik 10 pkt/m² (Psky_1_ALS_B - Middels) etter spesifikasjonen Punktsky 1.02 i Øygarden, Askøy og Meland i Alver kommune, 636 km². Standard klassifisering (1, 2, 7, 17 og 21).

Opsjonar relatert til laserskanning:

- Klassifisering av høgspenatlegg:
 - 13 Ledning - Beskyttelse
 - 14 Ledning
 - 15 Mast
 - 19 Flymarkør
- Klasse 9 Vassoverflate (og 22 Temporalt utelukket)
- Tilordne fargeverdiar (RGB) til punktsky frå simultanopptak av vertikalfoto
- Leveranse av simultanfoto

2.3. PRESENTASJONSDATA ØK (ØK-PLATER SOM BLIR RØRDE AV PROSJEKTET)

Ikkje aktuelt.

2.4. PRESENTASJONSDATA FOR TEKNISKE KART I MÅLESTOKK 1:1000.

Ikkje aktuelt.

2.5. ETABLERING AV ORTOFOTO

Det skal lages ortofoto etter gjeldande standard av flybileta tatt for konstruksjon av FKB-B i dette prosjektet. Ber om full biletdekning som opsjon. Nye laserdata, og elles beste tilgjengelege, vil verte brukt som høgdegrunnlag til produksjon av ortofoto.

Ortofoto vert levert i to leveransar, først kjem mellombels ortofoto (forenkla produksjon med tidleg leveranse i september 2023) og deretter standard ortofoto (standard produksjon med leveranse). Distribusjon av ortofoto går gjennom norgebilder.no

2.6. OPSJONAR (TILLEGG)

Det går fram av kostnadskalkyla og kostnadsdelinga kva partar som har tinga opsjonar og kva kostnader dette fører med seg. Partane er samde om at følgjande opsjonar (tillegg) er med i prosjektet:

Grunnlag/foto	- Uavhengige kontrollpunkt (areotriangulering)
Konstruksjon	- Tillegg for bygg utover estimert antall - Registrering av lavspenstrasé etter manus (FKB-Ledning)
Laserskanning Vektorisering høgspenst	- RGB-farga punktsky - Klassifisering av Vann - Klassifisering av høgspenstanlegg - Vektorisering høgspenstanlegg (FKB-Ledning) - Høgspenstdata etter ny NRL-spesifikasjon
Ortofoto	- Full biletdekning - CIR-ortofoto (color infrared) - Leveranse av simultane vertikalfoto

3. ORGANISERING

Etableringa blir organisert som eit prosjekt der prosjektleiinga er lagt til Kartverket Vestland. Prosjektleiinga har fullmakt til å inngå avtalar innanfor dei rammene som er omtala i kapittel 4 nedanfor, og står for den økonomiske avrekninga mellom partane.

Prosjektleiinga rapporterer til partane om framdrifta og økonomien i prosjektet. Dette skal gjerast minst 2 gonger i året. Dersom ein av partane ønskjer det, er prosjektleiinga pålagt å kalle inn til prosjektmøte med alle partane.

4. KOSTNADER OG KOSTNADSDELING.

Kostnadskalkylen og kostnadsdelinga byggjer på prinsippa i «[Håndbok for Geovekstsamarbeidet](#)» [kapittel 3 - Kostnadsdelingsnorm](#) (gjeldande versjon på avtaletidspunktet). I dette dokumentet står det og omtale av dei kostnadselementa som er med, og som det er referert til her.

4.1. KOSTNADSKALKYLE

103870	LACHVL31 Ytre Hordaland 2023				PLAN				
Kostnads	Aktivitet	Utfør.	Enhet	Se	Kostnad		Timer	SUM	SUM pr
					Ant.	Pris	750	kr	Kost.gr
gruppe	Beskrivelse	etat							
Prosj.adm.	Prosjektledelse	S	Timer	x	1,0		425,0	318 750	326 750
	Div. utgifter	Firma	Antatt	x	1,0	8 000		8 000	
Grunnlag foto	Signaliseringsarbeid	Firma	Ant.pkt	x	10,0	2 888		28 875	329 563
	Etablering og innmåling nye punkt	Firma	Ant pkt	x	47,0	5 463		256 738	
	Opsjon uavhengige kontrollpunkter eksisterende	Firma	Ant pkt	x	8,0	2 875		23 000	
	Opsjon uavhengige kontrollpunkter nye	Firma	Ant pkt	x	2,0	5 475		10 950	
	Båttransport	Firma	pris	x	4,0	2 500		10 000	
Grunnlag laser	Kontrollflater	Firma	Ant	x	26,0	4 000		104 000	104 000
	Kontrollprofiler	Firma	Ant	x					
Foto GSD 10	Flyfotografering	Firma	stripekm	x	1008,0	563		567 000	567 000
	Ekstra tilflyvning	Firma	km ²	x					
Innlegging i DSA	Innlegging av flyfoto i DSA	S	Timer	x			4,0	3 000	3 000
AT 10	Aerotriangulering	Firma	km ²	x	1221,2	88		106 855	106 855
Kontroll AT	Kontroll Aerotriangulering	S	Timer	x			15,0	11 250	11 250
Konstr B	Nykonstruksjon FKB-B	Firma	pr bygg	x	602,6	3 075		1 852 995	1 896 995
	Tillegg for bygg utover estimert antall	Firma	pr bygg	x	200,0	150		30 000	
	Opsjoner ERF-veg	Firma	km	x	350,0	40		14 000	
Kystkontur	Nykonstruksjon Kystkontur og -TekniskeAnlegg	Firma	km	x	2454,0	21		51 534	51 534
Luftspenn EL	Opsjon FKB-Ledning Trase EL-lavspent	Firma	km	x	500,0	81		40 625	40 625
Konstr vegnett	ELVEG nykonstr senterlinjer ERF	Firma	km	x	371,3	49		18 194	18 194
Høydekurver H1	FKB-Høydekurver generert	Firma	km ²	x	636,0	275		174 900	174 900
Ortofoto GSD 8-12	Ortofotoproduksjon	Firma	pr km ²	x	1221,2	119		145 018	157 518
	Full bildedekning	Firma	pris	x	1,0	12 500		12 500	
Ortofoto midlertidig	Midlertidige ortofoto	Firma	pris	x	1,0	40 000		40 000	40 000
CIR ortofoto	Opsjon CIR ortofoto	Firma	pr km ²	x	1221,2	63		76 325	76 325
Laser 10 pkt	Laserskanning, min 10 pkt/m2	Firma	pr km ²	x	636,0	3 256		2 070 975	2 193 975
	Opsjon RGB til punktsky	Firma	Fast pris	x	1,0	68 000		68 000	
	Opsjon klassifisering vann	Firma	Fast pris	x	1,0	30 000		30 000	
	Opsjon leveranse simultane vertikalbilder	Firma	Fast pris	x	1,0	25 000		25 000	
Høgspent laser	Opsjon klassifisering høyspentanlegg (klasse 13-16,	Firma	pr km	x	1,0	100 000		100 000	180 000
	Opsjon vektorisering høyspentanlegg Ledning	Firma	pr km	x	1,0	50 000		50 000	
	Opsjon NRL-tilpassa leveranse høgspent	Firma	pr km	x	1,0	30 000		30 000	
Periodisk AR5	Periodisk ajourhold av AR5 Øygarden	Firma-L	km ²	x	314,5	1 040		327 091	456 529
	Periodisk ajourhold av AR5 Askøy	Firma-L	km ²	x	101,1	1 280		129 438	
Redigering	Redigering, tilrettelegging, bearbeiding	S	timer	x			60,0	45 000	60 000
	Klargjøring av grunnlagsdata	S	timer	x			20,0	15 000	
Kontrollarbeid	Kvalitetskontroll	S	timer	x			140,0	105 000	120 000
	Kontroll prøveleveranse	S	timer	x			20,0	15 000	
Bildematching	Lisenskostnader og lagring	S-Fast	Fast pris	x	1,0	5 000		5 000	8 750
	Utføre bildematching	S	timer	x			5,0	3 750	
Kontroll arbeid ortofoto	Kontroll ortofoto	S	timer	x			60,0	45 000	45 000
Kontrollarbeid laser	Kontroll og leveranse laserdata	S	time	x			30,0	22 500	22 500
Kontroll høyspent vektor	Opsjon kontrollarbeid Punktsky FKB-Ledning	S	timer	x			12,0	9 000	9 000
Kvalitetshaving ElvBekk	Kvalitetshaving FKB-Vann ElvBekk (opsjon)	S	pris	x			80,0	60 000	60 000
Rasterpyramide	Rasterpyramide GIS Line	Firma-S	pris	x	5,0	10 625		53 125	53 125
Prosjektets totalkostnader (rad 601)					SUM			7 113 386	7 113 386

4.2. KOSTNADSDELING OG BETALINGSPLAN

103 870		LACHVL31 Ytre Hordaland 2023																						
PLAN - KOSTNADSDELING		SWL	EO	KOO	SKVL	T	FMLAVL	FKVL	NVE	BKK														
Kostnadsgruppe	Kostnad	PLAN - PARTSKOSTNAD																						
		SWL	EO	KOO	SKVL	T	FMLAVL	FKVL	NVE	BKK														
K-ADM	Prosj.adm.	7,4	14,9	19,8	19,8	14,9	14,9	8,4	3,0	0,7	103,7	326 750	23 416	46 800	62 432	62 432	117 083	44 603	44 603	27 877	50 122	20	3 830	
FKB-BL	Grunnlag foto	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	329 563	25 925	136 172	68 053	25 925	16 203	29 133	10 330	10 330	5 578	22 033	702	2 226	
L-DTM10	Grunnlag laser	5,7	7,0	34,0	9,7	7,0	5,4	21,3	10,0	0,7	100,7	104 000	5 857	35 121	10 020	7 179	10 020	11 083	44 603	27 877	50 122	20	3 830	
FKB-BL	Foto GSD 10	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	567 000	44 603	234 279	117 083	44 603	27 877	50 122	117 083	44 603	27 877	50 122	20	3 830	
K-DSA	Innlegging i DSA	6,9	7,9	31,7	29,7	7,9	7,9	7,9	0,7	100,7	3 000	236	945	885	236	236	236	236	236	236	236	20	3 830	
FKB-BL	AT 10	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	106 855	8 406	44 151	22 065	8 406	5 254	9 446	22 065	8 406	5 254	9 446	722	2 226	
K-KTRLAT	Kontroll AT	6,9	7,9	31,7	29,7	7,9	7,9	7,9	0,7	100,7	11 250	774	885	3 320	885	885	885	885	885	885	885	76	2 226	
FKB-BL	Konstr B	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	1 896 995	149 227	783 820	391 722	149 227	93 267	167 692	391 722	149 227	93 267	167 692	12 812	12 812	
FKB-BL	Kyiskontur	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	51 534	4 033	21 184	10 587	4 033	2 521	4 532	10 587	4 033	2 521	4 532	611	611	
FKB-BL	Luftspenn EL	97,0	97,0	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,0	40 625	39 406										1 219	1 219	
FKB-BL	Konstr vegnett	21,0	21,0				79,0		3,0	100,0	18 194	3 821				14 373						1 181	1 181	
FKB-BL	Høydekurver H1	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	174 900	13 759	72 267	36 116	13 759	8 599	15 461	36 116	13 759	8 599	15 461	1 181	1 181	
O-ORTO-8-12	Ortofoto GSD 8-12	6,9	11,9	49,5	5,9	11,9	5,9	7,9	0,7	100,7	157 518	10 842	77 491	9 293	18 587	9 293	12 360	9 293	18 587	9 293	12 360	1 064	1 064	
K-OFO	Ortofoto midlertidig	6,9	10,9	27,7	27,7	10,9	7,9	7,9	0,7	100,7	40 000	2 749	11 021	11 021	4 327	3 147	3 147	11 021	4 327	3 147	3 147	270	270	
O-ORTO-ANNEN	CIR ortofoto	68,0	2,0	8,0	2,0	2,0	8,0	8,0	2,0	0,7	100,7	76 325	51 550	6 065	1 516	1 516	6 065	1 516	1 516	6 065	1 516	516	516	
FKB-BL	Laser 10 pkt	5,7	7,0	34,0	9,7	7,0	5,4	21,3	10,0	0,7	100,7	2 193 975	123 558	740 913	211 378	151 451	117 674	211 378	151 451	117 674	151 451	14 818	14 818	
FKB-BL	Hogspenn laser	100,0	100,0							100,0	180 000	180 000										3 083	3 083	
K-ARS	Periodisk AR5	1,5	3,0	19,8	10,9	3,0	59,5	2,4	0,7	100,7	456 529	6 756	89 873	49 426	13 467	289 573	10 883	49 426	13 467	289 573	10 883	3 083	3 083	
K-RED	Redigering	4,0	11,9	31,7	27,7	11,9	7,9	4,9	0,7	100,7	60 000	2 360	18 990	16 530	7 085	4 725	2 920	16 530	7 085	4 725	2 920	405	405	
K-KTRL	Kontrollarbeid	6,9	10,9	27,7	27,7	10,9	7,9	7,9	0,7	100,7	120 000	8 248	33 063	33 063	12 980	9 440	9 440	33 063	12 980	9 440	9 440	810	810	
FKB-BL	Bildedatching	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	0,7	100,7	8 750	688	3 815	1 807	688	773	773	1 807	688	773	59	59		
K-KTRL	Kontroll arbeid ortofoto	6,9	10,9	27,7	27,7	10,9	7,9	7,9	0,7	100,7	45 000	3 093	4 867	12 399	4 867	3 540	3 540	12 399	4 867	3 540	3 540	304	304	
FKB-BL	Kontrollarbeid laser	5,7	25,0	34,0	9,7	7,0	5,4	21,3	10,0	0,7	22 500	1 075	6 446	1 839	1 318	1 024	4 044	1 839	1 318	1 024	4 044	129	129	
FKB-BL	Kontroll høyspent vektor	100,0	100,0							100,0	9 000	9 000										369	369	
FKB-BL	Kvalitetsheving EMBekk	7,9	7,9	41,6	20,8	7,9	5,0	8,9	10,0	0,7	60 000	4 293	22 551	11 270	4 293	2 683	4 825	11 270	4 293	2 683	4 825	369	369	
FKB-BL	Rasteryramme	100,0	100,0							100,0	53 125	53 125										47 370	47 370	
Sum											7 113 386	495 241	2 469 366	1 081 825	521 633	649 188	848 780	246 533	47 370					
BETALINGSOVERSIKT											BETALINGSPLAN													
Ar	Kode	Tekst	Kostnad		Egeninnsats		A betale																	
2 022	LACF	Partskonto	7 113 386	495 241	753 452	2 469 366	1 081 825	521 633	649 188	848 780	246 533	47 370												
2 023	F	Faktura	658 250				658 250																	
2 024	LACF	Partskonto	6 031 561	495 241	753 452	2 469 366		521 633	649 188	848 780	246 533	47 370												
2 024	F	Faktura	42 765																					
2 024	F	Faktura	1 487 643	248 000				365 143	306 000	421 200	123 300	24 000												
2 024	LACF	Partskonto	1 278 337	247 241				156 490	306 789	421 214	123 233	23 370												
2 025	F	Faktura																						
2 025	O	Overføres prosjekt																						
Alle	Fra E/K-fordeling	REST	3 222 816	0	753 451	2 469 365		0			0	0												

103870		LACHVL31 Ytre Hordaland 2023							
Kostnads gruppe		NØKKEL		PLAN - FORDELING EVERK		PLAN - KOSTNAD PR EVERK			
		(Tas fra K tabel)	Produkt	BKK	E4627	Sum	Sum	BKK	E4627
Prosj.adm.				76,7	23,3	100,0	46 800	35 910	10 890
Grunnlag foto				87,3	12,7	100,0	25 925	22 633	3 292
Grunnlag laser		K	Laser 10 pkt	77,6	22,4	100,0	7 179	5 570	1 610
Foto GSD 10				86,3	13,7	100,0	44 603	38 470	6 133
Innlegging i DSA				86,3	13,7	100,0	236	204	32
AT 10				86,3	13,7	100,0	8 406	7 250	1 156
Kontroll AT				86,3	13,7	100,0	885	763	122
Konstr B				74,5	25,5	100,0	149 227	111 166	38 062
Kystkontur				75,0	25,0	100,0	4 033	3 025	1 008
Luftspenn EL		I	FKB-B Ajourføring	84,3	15,7	100,0	39 406	33 227	6 180
Konstr vegnett									
Høydekurver H1		K	Laser 10 pkt	77,6	22,4	100,0	13 759	10 674	3 085
Ortofoto GSD 8-12		J	Ortofoto	83,7	16,3	100,0	18 587	15 562	3 024
Ortofoto midlertidig		J	Ortofoto	83,7	16,3	100,0	4 327	3 623	704
CIR ortofoto		J	Ortofoto	83,7	16,3	100,0	1 516	1 269	247
Laser 10 pkt		K	Laser 10 pkt	77,6	22,4	100,0	151 451	117 494	33 957
Høgspenn laser				70,0	30,0	100,0	180 000	126 000	54 000
Periodisk AR5		H	Kart areal AR5	75,7	24,3	100,0	13 467	10 191	3 277
Redigering				74,5	25,5	100,0	7 085	5 278	1 807
Kontrollarbeid				74,5	25,5	100,0	12 980	9 669	3 311
Bildematching		J	Ortofoto	83,7	16,3	100,0	688	576	112
Kontroll arbeid ortofoto		J	Ortofoto	83,7	16,3	100,0	4 867	4 075	792
Kontrollarbeid laser		K	Laser 10 pkt	77,6	22,4	100,0	4 730	3 670	1 061
Kontroll høyspent vektor				75,0	25,0	100,0	9 000	6 750	2 250
Kvalitetshøving ElvBekk		I	FKB-B Ajourføring	84,3	15,7	100,0	4 293	3 620	673
Rasterpyramide									
							753 452	576 668	176 783
BETALINGSOVERSIKT							PLAN - BETALINGSOVERSIKT		
							753 452	576 668	176 783
							Kostnad Egeninnsats		
År		Kode	Tekst	Å betale			753 452	576 668	176 783
	2 022	LACF	Partskonto						
	2 023	F	Faktura				378 000	289 000	89 000
	2 023	LACF	Partskonto						
	2 024	F	Faktura				375 451	287 668	87 783
	2 024	LACF	Partskonto						
	2 025	F	Faktura						
		O	Overføres prosjekt						
							1	0	0

Beløpa kvar enkelt part skal betale, i samsvar med oversikta, vil bli fakturerte frå prosjektleiinga. Partane har høve til å avvike betalingsplanen i tid. Dette må i så fall avtalast med prosjektleiinga.

4.3. PROSJEKTREGNSKAP

Ved prosjektslutt skal det leggjast fram endeleg prosjektrekneskap og gjennomførast endeleg oppgjør. (Større avvik som kjem til i prosjektperioden, skal rapporterst til partane snarast råd er).

5. PLAN FOR GJENNOMFØRING

Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet 20.03.2023 til 01.12.2024.

Aktivitet	Dato
Oppstartsmøte	November 2023
Partsavtale signering	Februar 2023
Anbudsutlysning	Februar 2023
Signalering/landmåling	Mars - april 2023
Flyfotografering	April - mai 2023
Laserskanning	April - medio mai 2023
Leveranse midlertidige ortofoto	15.09.2023
Leveranse laserpunktsky frå firma	30.09.2023
Distribusjon laser til partane	November/desember 2023
Leveranse opsjon høgspent vektor	31.10.2023
Leveranse høgdekurver	31.10.2023
Leveranse FKB-data frå firma	17.01.2024
Leveranse ortofoto frå firma	31.01.2024
Datadistribusjon FKB-data til partane	Februar/mars 2024

6. EIGENINNSATS

Eigeninnsatsen skal gjennomføres og dokumenteres som ved kjøp av tenester hos eksterne firma.

Timebasert eigeninnsats skal være dokumentert skriftleg.

Kvar enkelt part pliktar å stille personell og andre ressursar som avtalt i prosjektet, og å utføre eigeninnsatsen til rett tid i samsvar med gjennomføringsplanen.

Sjå kapittel 5 «Plan for gjennomføring» og kapittel **Feil! Fant ikke referansekilden.** «Dagmulkt».

7. LEVERANSAR

7.1. FKB

FKB-data etablert i dette prosjektet skal leverast iht. siste gjeldande versjon av [SOSI Del 3 Produktspesifikasjon](#). Data som er levert i prosjektet skal vera kvalitetskontrollert med SOSI-kontroll eller tilsvarende, og det skal følgje med rapportar frå kontrollane.

Viss ikkje anna er avtalt, blir leveransen gjennomført ved at partane blir informert når FKB-data og FKB-produkt er lagt ut på produktserveren for nedlasting. Partar som er kopla på sentral FKB vil ha tilgang til oppdaterte data så snart kartverket har sydd desse inn i eksisterande data. I tillegg vil data, når dei er ferdig, vere tilgjengeleg på produktserveren til Statens kartverk for distribusjon av data innan Norge digitalt-samarbeidet.

7.2. ORTOFOTO

Ortofoto etablert i dette prosjektet skal leverast iht. siste gjeldande versjon av produktspesifikasjon for ortofoto. Ortofoto vert publisert og tilgjengeleg for nedlasting på [norgebilder.no](#) etter kontroll hos Kartverket.

7.3. HØGDEDATA

Høgdedata i dette prosjektet skal leverast iht. siste gjeldande versjon av produktspesifikasjon for punktsky. Distribusjon av laserdata går igjennom Hoydedata.no. Laserprosjektet *Øygarden Askøy Meland 10pkt 2023* er inntil vidare eit lukka datasett – tilgjengeleg for Geovekst- og Norge Digitalt-medlem eller mot betaling.

Det er bestilt 1-meters høgdekurver generert frå laserdata etter siste produktspesifikasjon for FKB-Høydekurve. Kurvene vert ikkje manuelt tilpassa FKB-situasjon.

8. RETTAR

8.1. GENERELT

Partane er samde om at [Håndbok for Geovekstsamarbeidet](#), [kapittel 1 «Rettigheter»](#) skal gjerast gjeldande for dette prosjektet. Eventuelle avvik og presiseringar er omtala under pkt. 8.2

Partane er samde om at [Håndbok for Geovekstsamarbeidet](#), [kapittel 6 «Salg av digitale Geovekst-produkter til eksterne kunder»](#) gjerast gjeldande for dette prosjektet (jf. kapittel 9 i denne avtalen).

8.2. AVVIK OG PRESISERINGAR

8.3. NORGE DIGITALT (ND)

Det faglege og praktiske ansvaret for basis geodata blir tatt i vare (ifølge [Plan- og Bygningsloven § 2-1](#) og [kart og planforskriftens § 5](#)) dels av kommunar i eigen regi, dels gjennom Geovekst-samarbeidet og dels av Statens kartverk.

Produkta frå Geovekst er tilgjengeleg for alle partar i Norge digitalt ifølge prisar og finansieringsmodell som går fram av [Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet](#).

Partane i Norge digitalt får ein bruksrett til data. Kva bruksretten omfattar er beskrive i kapittel 5, «Rettigheter til data og tjenester» i *Generelle vilkår*.

Statens kartverk har ansvaret for å etablere og vedlikehalda landsdekkande produkt ifølge det årlege tildelingsbrev frå departementet.

Rettar til basis geodata blir ikkje endra når dataa blir gjort tilgjengeleg for partane i Norge digitalt.

Partane i Norge digitalt betaler ei årleg avgift for tilgang til basis geodata og hovudprinsippet er at andelsfinansieringa i sin heilskap blir ført tilbake til rettshavarane. Partane er einige om at målsetjinga er at andelsfinansieringa skal gå til vidare etablering, drift og vedlikehald av datagrunnlaget i regi av rettshavarane (Geovekst-partane).

9. SAL OG INNTEKTER

Det vises til dokumenta om rettar nemnd under pkt. 9.1, som beskriv kven som har rett til å selje data, og korleis inntektene ved sal skal tilbakeførast til prosjekt/rettshavarar.

9.1. SAL

Retningslinene om kven som skal selje FKB-data, FKB-produkt og ortofotoprisregulativ og avtaleformular er fastsett av Geovekst-forum i [Håndbok for Geovekstsamarbeidet, kapittel 6 «Salg av digitale FKB – produkter og ortofoto»](#). Her er og formidling til den kommersielle marknaden omtala.

Den som sel data, pliktar å føre rekneskap over dette og leggje dette fram for partane minst ein gong pr. år. Disponering av inntekter ved sal skal avgjerast av partane i fellesskap.

10. AVTALE OM FORVALTNING OG DRIFT

Ved inngåing av denne etableringsavtalen er partane samde om at:

Data etablert ifølge denne avtale skal underleggast eksisterande avtale for drift og vedlikehald i Øygarde kommunar på avtaledato og med framtidige justeringar.

11. VARIGHET PÅ AVTALEN

Avtalen gjeld frå han er underskriven av alle partane, og til etableringsarbeidet er slutført og godkjent skriftleg av avtalepartane.

12. DAGMULKT

Ein part som ikkje utfører eigeninnsats i høve til avtalt plan for gjennomføring, sjå kapittel 5 Plan for gjennomføring, skal ein krevje dagmulkt. Dagmulkta skal utgjere 0,15% av verdien av parten sin eigeninnsats i prosjektet per kalenderdag, men avgrensa til maksimalt 100 dagar. Samla dagsmulkt skal ikkje overstige 15% av verdien av parten sin eigeninnsats.

Dagmulkta skal leggast inn i prosjektregnskapet som ein reduksjon av eigeninnsatsen til aktuell part, og dermed bidra til justert betalingsbehov for partane.

13. MISLIGHALD

Ein part kan bli ekskludert frå samarbeidet dersom vedkommande i vesentleg grad mislegheld pliktene sine etter avtalen, og forholdet ikkje er retta etter at prosjektleiinga på vegne av dei andre partane i prosjektet skriftleg har gitt vedkommande frist på 30 dagar til å rette forholdet, og samtidig varslar om at dette er konsekvensen dersom forholdet ikkje er retta innan fristen.

Ein part som går ut av samarbeidet på denne måten, skal levere tilbake til prosjektet alt materiell som vedkommande disponerer og ikkje har rettane til, jf. kapittel 8 Rettar.

14. SAMARBEID

Kvar part skal utpeike ein person som skal vere vedkommande part sin kontaktperson under gjennomføringa av avtalen. Kvar part kan med 10 dagars varsel krevje møte for å drøfte spørsmål i samband med avtalen.

Alle meldingar, pålegg, krav m. v. i samsvar med avtalen skal gjevast skriftleg til partane ved kontaktpersonane deira.

15. ENDRINGAR

Endringar eller tillegg til avtalen er berre gyldige når dei er skriftlege og underskrivne av partane, eventuelt ved kontaktpersonane. Det skal førast eigen endrings- og tilleggsprotokoll.

16. RETTSVALG OG TVISTAR

Partane sine rettar og plikter etter avtalen blir fullt ut regulerte av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partane om tolking eller rettsverknad av avtalen, skal tvisten først søkast løyst ved forhandlingar. Fører ikkje slike forhandlingar fram innan to månader, kan kvar av partane krevje tvisten avgjort med endeleg verknad ved norske domstolar.

Det skal gjerast dei tillempingane som trengst når fleire statsetatar er partar i same avtale.

17. UNDERSKRIFTAR

Alle partane mottar likelydande eksemplar av denne avtalen. Partane samtykkjer i avtalen ved å signere og returnere avtalen, eller svare stadfestande i eit dokument gjennom eige sakssystem og sender dette til prosjektleiar hos Kartverket Vestland. Stadfestinga blir arkivert i Kartverket sitt arkiv saman med den endelege avtalen.

Partane har stadfesta avtalen:

Part	Dato	Kartverkets referanse	Partsreferanse
Statens vegvesen			
Statens kartverk Vestland			
Telenor Norge AS			
Statsforvaltaren i Vestland, landbruksavdelinga			
Vestland fylkeskommune			
NVE - Skred og vassdragsavdelinga			
Øygarden kommune			
Askøy kommune			
Alver kommune			
Austrheim kommune			
Fedje kommune	3/4-2023		Bent K. Rystad
Eviny AS			
Norgesnett			
